



2020

RELATÓRIO DE GESTÃO

Secretaria de
Desenvolvimento Urbano
e Obras Públicas



Belém - Pará
Dezembro 2020

**SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
BENEDITO RUY SANTOS CABRAL**

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
Valdir Parry Acatauassu

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO E OBRAS
Arnaldo Dopazo Antônio José

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
Cinthia dos Santos Figueiredo

NÚCLEO DE CONTROLE JURÍDICO
José Augusto Freire Figueiredo

NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO
Matheus da Rocha Freitas

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
Maria Samara Lima Ramos

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Ângelo do Nascimento Gonçalves

DIRETORIA FINANCEIRA
Viktória Germano Silva

DIRETORIA TÉCNICA
Alinne Nassar Palmeira Oliveira

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
Cristina de Farias Guedes Vieira

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS E CONFORMIDADE
José Henrique Tavares da Silva

DIRETORIA DE POLÍTICA SETORIAL
Alexandre José Almeida de Alencar

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E GESTÃO TERRITORIAL
João Vitor Alves de Castro

DIRETORIA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS
Vanessa Catete Blois

ELABORAÇÃO

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

MARIA SAMARA LIMA RAMOS

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

ELLEN NÉ DA SILVA

DESIREE COSTA GIUSTI

ELIAMARA SOUSA SILVA

COORDENADORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

LECY ÁDILA GOMES DE CARVALHO – COORDENADORA

PERPÉTUA SOCORRO BORGES DE OLIVEIRA

OSVALDINO JORGE ALVES MACHADO

LULCILÉIA BORGES CLAUDIO

FILIFE MARQUES

ALEX RODRIGO FARIAS SOARES

GIOVANNA NAZARETH PIMENTEL RODRIGUES

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	6
1. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DA SEDOP	8
1.1. PROGRAMA 1489: DESENVOLVIMENTO URBANO – HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MOBILIDADE.....	9
1.1.1. AÇÃO 7567. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.....	10
1.1.2. AÇÃO 7645. PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS	11
1.1.3. AÇÃO 8692. APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO	19
1.1.4. AÇÃO 8694. APOIO TÉCNICO-INSTITUCIONAL NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO	20
1.2. PROGRAMA 1508: GOVERNANÇA PÚBLICA.....	22
1.2.1 AÇÃO 7552. CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS ESTADUAIS	23
1.2.2 AÇÃO 7556. APOIO ACONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS DE UTILIZAÇÃO PÚBLICA.....	24
1.2.3 AÇÃO 8890. FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL	26
2. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES COM METAS DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEIS (ODS)	27
2.1 PROGRAMA 1489. DESENVOLVIMENTO URBANO – HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MOBILIDADE.....	28
2.2 PROGRAMA 1508. GOVERNANÇA PÚBLICA	29
3. AVALIAÇÃO DOS COMPROMISSOS REGIONAIS	33
3.1. AÇÃO 7480. MACRODRENAGEM DA BACIA DO TUCUNDUBA	34
3.2. AÇÃO 7642. OFERTA DE UNIDADE HABITACIONAL.....	45
3.3. AÇÃO 7567. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.....	52
4. DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SEDOP	53
4.1 PROGRAMA 1489 DESENVOLVIMENTO URBANO – HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MOBILIDADE.....	54
4.1.1. AÇÃO 7567. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.....	55
4.1.2. AÇÃO 7568. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.....	71
4.1.3. AÇÃO 7608. CONSTRUÇÃO DE PARQUES URBANOS.....	80
4.1.4. AÇÃO 7644. IMPLANTAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS.....	84
4.1.5. AÇÃO 7645. PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS	92
4.1.6. AÇÃO 7646. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GOVERNANÇA METROPOLITANA	110
4.1.7. AÇÃO 8463. APOIO AS AÇÕES DO CONCIDADES.....	115

4.1.8.AÇÃO 8692. APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO.....	117
4.1.9.AÇÃO 8694. APOIO TÉCNICO-INSTITUCIONAL NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO	140
4.2. PROGRAMA 1508 GOVERNANÇAPÚBLICA.....	165
4.2.1.AÇÃO 7552. CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS ESTADUAIS	166
4.2.2.AÇÃO 7556. APOIO A CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS DE UTILIZAÇÃO PÚBLICA.....	168
4.2.3. AÇÃO 8233. EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ..	183
4.2.4. AÇÃO 8238. GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO....	184
4.2.5.AÇÃO 8887. CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS	185
4.2.6.AÇÃO 8890. FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL.....	188
4.3. PROGRAMA 1498 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO.....	192
4.3.1. 7658. IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS.....	193
4.4. PROGRAMA 1297 MANUTENÇÃO DA GESTÃO.....	196
4.4.1.AÇÃO 4668. ABASTECIMENTO DE UNIDADES MÓVEIS	197
4.4.2.AÇÃO 8311. CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO	197
4.4.3.AÇÃO 8312. CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE.....	197
4.4.4.AÇÃO 8338. OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	197
4.4.5.AÇÃO 8339. OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE RECURSOS HUMANOS	197

APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop) apresenta neste Relatório de Gestão as principais ações e produtos realizados no ano de 2020 nas regiões de integração do Estado do Pará. O documento tem por objetivo detalhar os desempenhos financeiros, físicos e qualitativos das ações governamentais sob a responsabilidade da Sedop, com ênfase aos impactos de suas contribuições para o desenvolvimento social da população paraense.

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia da Covid-19, causada pelo novo coronavírus, gerando a maior crise sanitária da história recente da humanidade com consequentes impactos de ordem social, econômica, cultural e política em escala global. No Pará, uma série de medidas foram adotadas para conter o avanço da doença e proteger a população, como fechamento de estabelecimentos comerciais e escolas, a criação do Hospital do Hangar, entre outras.

Além disso, o Governo do Estado e a Sedop estiveram empenhados em trabalhar para "ampliar nossos indicadores de desenvolvimento e garantir qualidade de vida a todos que escolhem nossa terra como lugar para prosperar e ser feliz", como descrito no planejamento de administração pública do governo Helder Barbalho, assim como assegurar, dentro do possível e respeitando as medidas de segurança estabelecidas para controle de contágio da Covid-19, a continuidade das ações sob responsabilidade desta Secretaria.

O Relatório de Gestão é estruturado de acordo com as orientações estabelecidas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) e atende às diretrizes estabelecidas no PPA 2020/2023, como detalhado abaixo:

1. Destaque para as Principais Realizações de 2020;
2. Principais Realizações com as Metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS);
3. Avaliação dos Compromissos Regionais;
4. Desempenho Físico e Financeiro das Ações Governamentais da Sedop.

Em termos formais, o Relatório de Gestão 2020 representa o cumprimento, por parte da SEDOP, do Art.135 - inciso IX da Constituição do Estado do Pará¹, subsidiando desta forma a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração na consolidação da Mensagem de Governo a ser encaminhada à Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), como instrumento de prestação de contas de suas atividades à sociedade.

¹ Art. 135 – Compete privativamente ao Governador: IX remeter mensagem e plano de governo à Assembleia Legislativa, por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do Estado e solicitando as providências que julgar necessárias.

1. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DA SEDOP

- ANO 2020 -

**1.1. PROGRAMA 1489: DESENVOLVIMENTO URBANO –
HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MOBILIDADE**

AÇÕES GOVERNAMENTAIS:

7567. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.

7568. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.

7645. PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.

8692. APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO.

8694. APOIO TÉCNICO-INSTITUCIONAL NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

1.1.1. AÇÃO 7567. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES - 2020

Nº DE OBRAS CONCLUÍDAS	03
Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	03
Nº DE PESSOAS ATENDIDAS	31.701
Nº DE LIGAÇÕES DOMICILIARES REALIZADAS	3.436
Nº DE REGIÕES DE INTEGRAÇÃO COM OBRAS CONCLUÍDAS	02
INVESTIMENTO REALIZADO NA AÇÃO ¹	R\$ 17.168.832,09

REGIÃO GUAMÁ					
MUNICÍPIO	ENTREGA EFETUADA	CAPACIDADE ATENDIMENTO	Nº LIGAÇÕES	VALOR OBRA (R\$)	CONCLUSÃO
1. SÃO CAETANO DE ODIVELAS	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	9.358 PESSOAS	1.300	3.312.982,47	NOVEMBRO 2020
TOTAL REGIÃO GUAMÁ (01 MUNICÍPIO / 01 OBRA)		9.358 PESSOAS	1.300 LIGAÇÕES	3.312.982,47	

REGIÃO RIO CAETÉ					
MUNICÍPIO	ENTREGA EFETUADA	CAPACIDADE ATENDIMENTO	Nº LIGAÇÕES	VALOR OBRA (R\$)	CONCLUSÃO
1. TRACUATEUA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	11.340 PESSOAS	1.136	915.973,33	NOVEMBRO 2020
2. PRIMAVERA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	11.003 PESSOAS	1.000	2.260.221,26	NOVEMBRO 2020
TOTAL REGIÃO RIO CAETÉ (02 MUNICÍPIOS/02 OBRAS)		22.343 PESSOAS	2.136 LIGAÇÕES	3.176.194,59	

¹ FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO - INVESTIMENTOS REALIZADOS E EM REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO – 04/12/2020

1.1.2. AÇÃO 7645. PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES - 2020

Nº DE OBRAS EXECUTADAS	108
Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	93
Nº DE KM EXECUTADOS	505,89
Nº DE REGIÕES DE INTEGRAÇÃO ATENDIDAS	12
INVESTIMENTO REALIZADO NA AÇÃO ¹	R\$ 478.160.877,19

REGIÃO ARAGUAIA			
MUNICÍPIO	ENTREGA EFETUADA	KM EXECUTADOS	VALOR OBRA (R\$)
1. CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	5,00	5.106.760,33
2. CUMARÚ DO NORTE	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	3,00	3.251.273,28
3. REDENÇÃO	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	5,00	5.979.824,84
4. SANTA MARIA DAS BARREIRAS	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	3,00	3.064.818,72
5. SANTANA DO ARAGUAIA	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	2,39	3.064.818,72
6. TUCUMÃ	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	1,29	3.064.818,72
7. RIO MARIA	REPASSE PREFEITURA – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DE RUAS E AVENIDAS NOS SETORES PLANALTO, VILA NOVA E REMOR	1,00	1.100.838,08
	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	3,00	3.064.818,72
TOTAL REGIÃO ARAGUAIA (07 MUNICÍPIOS/08 OBRAS)		23,68 KM	27.697.971,41

¹ FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO - INVESTIMENTOS REALIZADOS E EM REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO – 04/12/2020

REGIÃO BAIXO AMAZONAS			
MUNICÍPIO	ENTREGA EFETUADA	KM EXECUTADOS	VALOR OBRA (R\$)
1. ALMEIRIM	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	1,21	4.335.429,76
2. ALENQUER	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	2,96	4.335.429,76
3. FARO	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	1,00	4.335.429,76
4. ORIXIMINÁ	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	2,52	4.335.429,76
5. MONTE ALEGRE	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	5,49	10.255.797,02
6. PRAINHA	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	1,19	4.320.987,61
TOTAL REGIÃO BAIXO AMAZONAS (06 MUNICÍPIOS/06 OBRAS)		14,37 KM	31.918.503,67

REGIÃO CARAJÁS			
MUNICÍPIO	ENTREGA EFETUADA	KM EXECUTADOS	VALOR OBRA (R\$)
1. BOM JESUS DO TOCANTINS	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	3,00	2.881.897,99
2. MARABÁ	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	8,55	9.602.218,46
3. PARAUPEBAS	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	10,00	11.715.517,05
4. PIÇARRA	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	3,00	2.881.897,99
5. SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	3,00	2.881.897,99
6. CURIONÓPOLIS	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	5,00	4.800.228,92
TOTAL REGIÃO CARAJÁS (06 MUNICÍPIOS / 06 OBRAS)		32,55 KM	34.763.658,4

REGIÃO GUAJARÁ			
MUNICÍPIO	ENTREGA EFETUADA	KM EXECUTADOS	VALOR OBRA (R\$)
1. ANANINDEUA	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	7,00	11.808.046,96
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DE VIAS COMPREENDIDAS NOS BAIRROS DE ANANINDEUA	6,02	11.371.819,81
	RECAPEAMENTO DE VIAS NO BAIRRO GUANABARA / ÁGUAS LINDAS.	11,22	4.514.310,70
	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS	2,83	2.317.301,02
	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO DE VIAS, COMPREENDIDAS NOS BAIRROS DO 40 HORAS E MAGUARI	7,33	1.726.788,00
2. BELÉM	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS – BAIRRO GUAMÁ (ORDEM DE SERVIÇO 97)	1,00	1.401.897,40
	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS – DISTRITO ICOARACI (ORDEM DE SERVIÇO 98)	2,27	3.116.451,89
	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS – BAIRRO TERRA FIRME (ORDEM DE SERVIÇO 99)	1,00	1.164.273,20
	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS – DISTRITO ICOARACI (ORDEM DE SERVIÇO 117)	1,00	1.634.732,82
	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS – BAIRRO TERRA FIRME (ORDEM DE SERVIÇO 130)	1,00	1.111.221,84
	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS – DISTRITO ICOARACI (ORDEM DE SERVIÇO 143)	1,00	3.833.712,20
3. MARITUBA	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	2,73	11.762.512,48
4. SANTA BÁRBARA	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	2,00	3.530.536,56
5. BENEVIDES	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	4,55	5.882.529,69
TOTAL REGIÃO GUAJARÁ (05 MUNICÍPIOS / 14 OBRAS)		50,95 KM	65.176.134,57

REGIÃO GUAMÁ			
MUNICÍPIO	ENTREGA EFETUADA	KM EXECUTADOS	VALOR OBRA (R\$)
1. CASTANHAL	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA BRASIL.	3,00	12.891.476,86
	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	3,54	14.811.427,70
2. CURUÇÁ	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	4,13	7.409.342,44
3. MAGALHÃES BARATA	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	3,00	4.445.161,83
4. MARAPANIM	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	2,42	4.445.161,83
5. SANTA MARIA DO PARÁ	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	3,00	4.492.687,41
6. SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	2,92	7.406.822,94
7. SÃO DOMINGOS DO CAPIM	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	2,09	4.445.161,83
8. SÃO FRANCISCO DO PARÁ	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	3,00	4.445.161,83
9. TERRA ALTA	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	3,00	4.445.161,83
10. VIGIA	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	1,00	4.445.161,83
TOTAL REGIÃO GUAMÁ (10 MUNICÍPIOS / 11 OBRAS)		31,10 KM	73.682.728,33

REGIÃO LAGO TUCURUÍ			
MUNICÍPIO	ENTREGA EFETUADA	KM EXECUTADOS	VALOR OBRA (R\$)
1. BREU BRANCO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO E QUENTE-CBUQ NA AVENIDA GALETTI.	1,50	800.000,00
2. GOIANÉSIA DO PARÁ	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	3,00	5.914.215,62
3. ITUPIRANGA	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	5,00	9.891.222,31
4. JACUNDÁ	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	1,79	3.381.426,52
5. NOVA IPIXUNA	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	3,00	4.928.151,76
6. NOVO REPARTIMENTO	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	3,00	5.912.562,57
7. TUCURUÍ	DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS, EM TST, NOS BAIROS POPULAR E SERRA AZUL	1,95	2.300.000,00
	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	4,61	7.920.208,24
TOTAL REGIÃO LAGO TUCURUÍ (07 MUNICÍPIOS / 08 OBRAS)		23,85 KM	41.047.787,02

REGIÃO MARAJÓ			
MUNICÍPIO	ENTREGA EFETUADA	KM EXECUTADOS	VALOR OBRA (R\$)
1. BAGRE	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	1,39	4.515.242,94
2. CACHOEIRA DO ARARI	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	2,00	4.515.242,94
3. CURRALINHO	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	2,63	4.515.242,94
4. MUANÁ	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	1,87	4.515.242,94
5. PONTA DE PEDRAS	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	2,72	4.515.242,94
6. PORTEL	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	2,90	4.515.242,94
7. SALVATERRA	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	2,11	3.011.126,93
8. SOURE	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	2,42	4.604.064,53
TOTAL REGIÃO MARAJÓ (08 MUNICÍPIOS / 08 OBRAS)		18,04 KM	34.706.649,10

REGIÃO RIO CAETÉ			
MUNICÍPIO	ENTREGA EFETUADA	KM EXECUTADOS	VALOR OBRA (R\$)
1. BONITO	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	2,22	3.975.248,25
2. BRAGANÇA	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	3,52	13.244.560,54
3. CACHEIRA DO PIRIÁ	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	2,15	3.975.248,25
4. CAPANEMA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DE 7,67KM DE VIAS E RUAS NO MUNICÍPIO.	7,64	2.000.000,00
5. NOVA TIMBOTEUA	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	2,03	3.975.248,25
6. PRIMAVERA	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	2,06	4.066.896,25
7. SANTA LUZIA	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	2,44	3.975.248,25
8. VISEU	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	1,26	6.623.664,88
TOTAL REGIÃO RIO CAETÉ (08 MUNICÍPIOS / 08 OBRAS)		23,32 KM	41.836.114,67

REGIÃO RIO CAPIM			
MUNICÍPIO	ENTREGA EFETUADA	KM EXECUTADOS	VALOR OBRA (R\$)
1. AURORA	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	2,87	4.350.427,47
2. BUJARU	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	2,53	5.116.699,08
3. CAPITÃO - POÇO	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	7,40	5.116.699,08
4. CONCÓRDIA DO PARÁ	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	2,61	5.182.133,95
5. DOM ELISEU	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	2,44	5.182.133,95
	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, NOS TRECHOS DAS RUAS MARECHAL DEODORO DA FONSECA, ANTÔNIO BATISTA E EMANUEL AUGUSTO MIGUEL, COM TOTAL DE 1.052,58M ² .	1,00	805.000,00
6. IPIXUNA DO PARÁ	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	2,90	5.143.001,47
7. IRITUIA	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	2,96	4.350.427,47
8. MÃE DO RIO	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	5,33	9.585.996,65
9. NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	2,67	5.119.784,00
10. TOMÉ AÇU	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	2,71	5.154.151,29
	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS (QUATRO BOCAS)	2,74	4.350.427,47
11. ULIANÓPOLIS	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	3,00	4.350.427,47
12. IPIXUNA DO PARÁ	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO RESIDENCIAL CUNHA	1,92	1.290.349,05
13. PARAGOMINAS	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 5.909,95m DE RUAS	4,18	7.000.000,00
14. GARRAFÃO DO NORTE	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VILAS MARAPANIM E LIVRAMENTO	2,50	1.000.000,00
	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VILAS LOURO E MAMORANA.	1,00	600.000,00
15. RONDON DO PARÁ	EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ. (FRD II)	5,33	3.102.290,48
TOTAL REGIÃO RIO CAPIM (15 MUNICÍPIOS / 18 OBRAS)		56,09 KM	76.799.948,88

REGIÃO TAPAJÓS			
MUNICÍPIO	ENTREGA EFETUADA	KM EXECUTADOS	VALOR OBRA (R\$)
1. ITAITUBA (NDB)	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL.	27,00	37.447.417,00
2. NOVO PROGRESSO (NDB)	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL.	12,84	19.476.967,45
3. RURÓPOLIS (NDB)	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL.	15,00	18.064.866,67
4. TRAIRÃO (NDB)	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL.	12,00	17.124.268,25
5. ITAITUBA	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ.	3,53	4.695.707,95
TOTAL REGIÃO TAPAJÓS (05 MUNICÍPIOS / 05 OBRAS)		70,37 KM	96.809.227,32

REGIÃO TOCANTINS			
MUNICÍPIO	ENTREGA EFETUADA	KM EXECUTADOS	VALOR OBRA (R\$)
1. ABAETETUBA	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	12,50	21.766.742,46
2. ACARÁ	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	1,62	4.355.145,34
3. BAIÃO	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	2,56	4.355.145,34
4. IGARAPÉ - MIRI	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	6,72	13.061.073,97
5. MOJU	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	6,60	14.605.158,45
6. OEIRAS DO PARÁ	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	1,00	1.556.810,52
7. TAILÂNDIA	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	4,82	14.511.888,66
TOTAL REGIÃO TOCANTINS (07 MUNICÍPIOS / 07 OBRAS)		35,82 KM	74.211.964,74

REGIÃO XINGU			
MUNICÍPIO	ENTREGA EFETUADA	KM EXECUTADOS	VALOR OBRA (R\$)
1. ANAPU (CAF)	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL.	12,58	24.808.739,31
2. ALTAMIRA	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.	8,38	12.942.496,18
3. BRASIL NOVO (NDB)	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL.	14,13	26.474.210,82
4. MEDICILÂNDIA (NDB)	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL.	15,17	24.257.700,72
5. PACAJÁ (NDB)	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL.	18,00	33.872.290,68
6. PLACAS (NDB)	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL.	10,00	18.223.411,78
7. PORTO DE MOZ (CAF)	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL.	16,49	23.826.568,01
8. SENADOR JOSÉ PORFÍRIO (NDB)	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL.	11,00	24.506.546,02
9. URUARÁ (NDB)	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL.	20,00	16.135.196,02
TOTAL REGIÃO XINGU (09 MUNICÍPIOS / 09 OBRAS)		125,75 KM	205.047.159,54

1.1.3. AÇÃO 8692. APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES - 2020

Nº DE INSTRUMENTOS ELABORADOS	02
Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	02
Nº DE REGIÕES DE INTEGRAÇÃO ATENDIDAS	02
INVESTIMENTO REALIZADO NA AÇÃO ¹	R\$ 114.240,08

REGIÃO RIO CAPIM		
MUNICÍPIO	ENTREGA EFETUADA	STATUS
1. BUJARU	- ENTREGA DO PRODUTO FINAL REFERENTE AO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO.	100% DO INSTRUMENTO ELABORADO
TOTAL REGIÃO RIO CAPIM : 01 INSTRUMENTO ELABORADO		

REGIÃO TOCANTINS		
MUNICÍPIO	ENTREGA EFETUADA	STATUS
1. LIMOEIRO DO AJURU	- ENTREGA DO PRODUTO FINAL REFERENTE AO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	100% DO INSTRUMENTO ELABORADO
TOTAL REGIÃO TOCANTINS: 01 INSTRUMENTO ELABORADO		

¹ FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO - INVESTIMENTOS REALIZADOS E EM REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO – 04/12/2020

1.1.4. AÇÃO 8694. APOIO TÉCNICO-INSTITUCIONAL NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES - 2020

Nº DE INSTRUMENTOS ELABORADOS	06
Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	06
Nº DE REGIÕES DE INTEGRAÇÃO ATENDIDAS	06
INVESTIMENTO REALIZADO NA AÇÃO ¹	R\$ 20.382,71

REGIÃO ARAGUAIA		
MUNICÍPIO	ENTREGA EFETUADA	STATUS
1. XINGUARA	- ENTREGA DO PRODUTO FINAL REFERENTE AO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA.	100% DO INSTRUMENTO ELABORADO
TOTAL REGIÃO ARAGUAIA : 01 INSTRUMENTO ELABORADO		

REGIÃO BAIXO AMAZONAS		
MUNICÍPIO	ENTREGA EFETUADA	STATUS
1. ORIXIMINÁ	- ENTREGA DO PRODUTO FINAL REFERENTE AO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA.	100% DO INSTRUMENTO ELABORADO
TOTAL REGIÃO BAIXO AMAZONAS : 01 INSTRUMENTO ELABORADO		

REGIÃO MARAJÓ		
MUNICÍPIO	ENTREGA EFETUADA	STATUS
1. PORTEL	- ENTREGA DO PRODUTO FINAL REFERENTE AO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA.	100% DO INSTRUMENTO ELABORADO
TOTAL REGIÃO MARAJÓ : 01 INSTRUMENTO ELABORADO		

REGIÃO RIO CAETÉ		
MUNICÍPIO	ENTREGA EFETUADA	STATUS
1. AUGUSTO CORRÊA	- ENTREGA DO PRODUTO FINAL REFERENTE AO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA.	100% DO INSTRUMENTO ELABORADO
TOTAL REGIÃO RIO CAETÉ : 01 INSTRUMENTO ELABORADO		

¹ FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO - INVESTIMENTOS REALIZADOS E EM REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO – 04/12/2020

REGIÃO RIO CAPIM		
MUNICÍPIO	ENTREGA EFETUADA	STATUS
1. CONCÓRDIA DO PARÁ	- ENTREGA DO PRODUTO FINAL REFERENTE AO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA.	100% DO INSTRUMENTO ELABORADO
TOTAL REGIÃO RIO CAPIM : 01 INSTRUMENTO ELABORADO		

REGIÃO TOCANTINS		
MUNICÍPIO	ENTREGA EFETUADA	STATUS
1. ABAETETUBA	- ENTREGA DO PRODUTO FINAL REFERENTE AO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA.	100% DO INSTRUMENTO ELABORADO
TOTAL REGIÃO TOCANTINS : 01 INSTRUMENTO ELABORADO		

1.2. PROGRAMA 1508: GOVERNANÇA PÚBLICA

AÇÕES GOVERNAMENTAIS:

7552. CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS ESTADUAIS.

7556. APOIO A CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS DE UTILIZAÇÃO PÚBLICA.

8890. FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL.

1.2.1 AÇÃO 7552. CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS ESTADUAIS

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES - 2020

Nº DE OBRAS CONCLUÍDAS	04
Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	02
Nº DE REGIÕES DE INTEGRAÇÃO ATENDIDAS	02
INVESTIMENTO REALIZADO NA AÇÃO ¹	R\$3.070.118,46

REGIÃO GUAJARÁ			
MUNICÍPIO	ENTREGA EFETUADA	VALOR OBRA (R\$)	CONCLUSÃO
1. BELÉM	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO 1º COMANDO AÉREO REGIONAL – CASSAZUM	228.470,15	30/03/2020
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.785.855,85	05/05/2020
	IMPLANTACAO DE ELEVADORES NO PALACIO DOS DESPACHOS	200.554,87	15/06/2020
TOTAL REGIÃO GUAJARÁ (01 MUNICÍPIO/03 OBRAS)		2.214.880,87	

REGIÃO TOCANTINS			
MUNICÍPIO	ENTREGA EFETUADA	VALOR OBRA (R\$)	CONCLUSÃO
1. BARCARENA	REFORMA DO PRÉDIO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER	327.048,53	12/02/2020
TOTAL REGIÃO TOCANTINS (01 MUNICÍPIO/01 OBRA)		327.048,53	

¹ FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO – INVESTIMENTOS REALIZADOS E EM REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO EM 04/12/2020.

1.2.2 AÇÃO 7556. APOIO A CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS DE UTILIZAÇÃO PÚBLICA

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES - 2020

Nº DE OBRAS CONCLUÍDAS	08
Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	08
Nº DE REGIÕES DE INTEGRAÇÃO ATENDIDAS	05
INVESTIMENTO REALIZADO NA AÇÃO ¹	R\$27.059.714,30

REGIÃO BAIXO AMAZONAS			
MUNICÍPIO	ENTREGA EFETUADA	VALOR OBRA (R\$)	CONCLUSÃO
1. SANTARÉM	CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO PARA 5 MIL PESSOAS	23.222.036,00	01/12/2020
2. MOJÚ DOS CAMPOS	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	876.315,06	23/11/2020
TOTAL REGIÃO BAIXO AMAZONAS (02 MUNICÍPIOS/ 02 OBRAS)		24.098.351,06	

REGIÃO RIO CAETÉ			
MUNICÍPIO	ENTREGA EFETUADA	VALOR OBRA (R\$)	CONCLUSÃO
1. CAPANEMA	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA	1.406.762,19	02/07/2020
TOTAL REGIÃO RIO CAETÉ (01 MUNICÍPIO/ 01 OBRA)		1.406.762,19	

¹ FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO – INVESTIMENTOS REALIZADOS E EM REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO EM 04/12/2020.

REGIÃO RIO CAPIM			
MUNICÍPIO	ENTREGA EFETUADA	VALOR OBRA (R\$)	CONCLUSÃO
1. AURORA DO PARÁ	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHK.	421.985,67	13/08/2020
TOTAL REGIÃO RIO CAPIM (01 MUNICÍPIO/01 OBRA)		421.985,67	

REGIÃO TAPAJÓS			
MUNICÍPIO	ENTREGA EFETUADA	VALOR OBRA (R\$)	CONCLUSÃO
1. ITAITUBA	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE MIRITITUBA.	293.325,59	20/07/2020
2. RURÓPOLIS	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM RURÓPOLIS.	295.105,64	15/10/2020
3. TRAIRÃO	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA.	293.193,61	21/10/2020
TOTAL REGIÃO TAPAJÓS (03 MUNICÍPIOS / 03 OBRAS)		881.624,84	

REGIÃO XINGU			
MUNICÍPIO	ENTREGA EFETUADA	VALOR OBRA (R\$)	CONCLUSÃO
1. SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DO AGRICULTOR NA SEDE DO MUNICÍPIO	331.655,23	27/10/2020
TOTAL REGIÃO XINGU (01 MUNICÍPIO/01 OBRA)		331.655,23	

1.2.3 AÇÃO 8890. FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES - 2020

Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	02
Nº DE REGIÕES DE INTEGRAÇÃO ATENDIDAS	02
INVESTIMENTO REALIZADO NA AÇÃO ¹	R\$ 25.690.131,42

REGIÃO CARAJÁS		
MUNICÍPIO	ENTREGA EFETUADA	INVESTIMENTO (R\$)
MARABÁ	AQUISIÇÃO DE 6 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA.	1.768.495,00
TOTAL REGIÃO GUAMÁ		1.768.495,00

REGIÃO GUAJARÁ		
MUNICÍPIO	ENTREGA EFETUADA	INVESTIMENTO (R\$)
BELÉM	LIMPEZA DE CANAIS NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.	23.914.395,02
TOTAL REGIÃO GUAJARÁ		23.914.395,02

¹ FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO – INVESTIMENTOS REALIZADOS E EM REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO EM 04/12/2020.

**2. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES COM METAS DOS
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEIS (ODS)**

ALINHAMENTO REALIZAÇÕES SEDOP X METAS DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEIS (ODS)

2.1 PROGRAMA 1489. DESENVOLVIMENTO URBANO – HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MOBILIDADE

OBJETIVO 2: PROMOVER E DISPONIBILIZAR AOS USUÁRIOS O ACESSO AO SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO.

AÇÃO	PRINCIPAIS REALIZAÇÕES	OBJETIVO ODS	META ODS CORRESPONDENTE
7567. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	3.436 LIGAÇÕES DOMICILIARES REALIZADAS.	1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA; 3. SAÚDE E BEM-ESTAR; 6. ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO; 9. INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA.	1.4, 1.5, 3.3, 3.9, 6.1, 6.2 e 6.3
8692. APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO.	02 INSTRUMENTOS ELABORADOS.	6. ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO; 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS.	6.b, 11.3 e 11.a

OBJETIVO 3: DISPONIBILIZAR O ACESSO AOS SERVIÇOS URBANOS DE MOBILIDADE E ORDENAMENTO TERRITORIAL

AÇÃO	PRINCIPAIS REALIZAÇÕES	OBJETIVO ODS	META ODS CORRESPONDENTE
7645. PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS	505,89 KM DE VIAS PAVIMENTADAS	1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA; 3. SAÚDE E BEM-ESTAR; 10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES; 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS.	1.4, 3.6 e 11.2
8694. APOIO TÉCNICO-INSTITUCIONAL NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO.	06 INSTRUMENTOS ELABORADOS.	6. ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO; 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS.	6.b, 11.3 e 11.a

2.2 PROGRAMA 1508. GOVERNANÇA PÚBLICA

OBJETIVO 3: PROMOVER A GESTÃO REGIONALIZADA

AÇÃO	PRINCIPAIS REALIZAÇÕES	OBJETIVO ODS	META ODS CORRESPONDENTE
7556. APOIO A CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS DE UTILIZAÇÃO PÚBLICA.	08 OBRAS REALIZADAS.	8. TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO; 9. INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA; 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS.	11.7
8890. FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL.	02 MUNICÍPIOS ATENDIDOS	8. TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO; 9. INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA; 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS.	8.3, 11.7 e 11.a

OBJETIVO 4: PROVER A GOVERNABILIDADE DO PODER EXECUTIVO

AÇÃO	PRINCIPAIS REALIZAÇÕES	OBJETIVO ODS	META ODS CORRESPONDENTE
7552. CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS ESTADUAIS.	04 OBRAS REALIZADAS.	16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES.	16.6

GLOSSÁRIO

Meta 1.4 (Brasil): Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade, tenham acesso a serviços sociais, infraestrutura básica, novas tecnologias e meios para produção, tecnologias de informação e comunicação, serviços financeiros e segurança no acesso equitativo à terra e aos recursos naturais.

Meta 1.5 (Nações Unidas): Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais.

Meta 3.3 (Brasil): Até 2030 acabar, como problema de saúde pública, com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária, hepatites virais, doenças negligenciadas, doenças transmitidas pela água, arboviroses transmitidas pelo *aedes aegypti* e outras doenças transmissíveis.

Meta 3.6 (Brasil): Até 2030, reduzir pela metade as mortes e lesões por acidentes no trânsito.

Meta 3.9 (Nações Unidas): Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos, contaminação e poluição do ar e água e do solo.

Meta 5.a (Brasil): Garantir igualdade de direitos, de acesso e de controle dos recursos econômicos, da terra e de outras formas de propriedade, de serviços financeiros, de herança e de recursos naturais de forma sustentável, por meio de políticas de crédito, capacitação, assistência técnica, reforma agrária e habitação, entre outras, em especial para as mulheres do campo, da floresta, das águas e das periferias urbanas.

Meta 6.1 (Brasil): Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água para consumo humano, segura e acessível para todas e todos.

Meta 6.2 (Nações Unidas): Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade.

Meta 6.3 (Brasil): Até 2030, melhorar a qualidade da água nos corpos hídricos, reduzindo a poluição, eliminando despejos e minimizando o lançamento de materiais e substâncias perigosas, reduzindo pela metade a proporção do lançamento de efluentes não tratados e aumentando substancialmente o reciclo e reuso seguro localmente.

Meta 6.b (Brasil): Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, priorizando o controle social para melhorar a gestão da água e do saneamento.

Meta 8.3 (Brasil): Promover o desenvolvimento com a geração de trabalho digno; a formalização; o crescimento das micro, pequenas e médias empresas; o empreendedorismo e a inovação.

Meta 9.1 (Brasil): Aprimorar o sistema viário do País, com foco em sustentabilidade e segurança no trânsito e transporte, equalizando as desigualdades regionais, promovendo a integração regional e transfronteiriça, na busca de menor custo, para o transporte de passageiros e de cargas, evitando perdas, com maior participação dos modos de alta capacidade como ferroviário, aquaviário e dutoviário, tornando-o acessível e proporcionando bem-estar a todos.

Meta 9.3 (Brasil): Aumentar e desburocratizar o acesso das micro e pequenas empresas a todos os serviços financeiros, garantindo crédito em condições adequadas à realidade dessas empresas, inclusive por meio de soluções tecnológicas inovadoras, para propiciar sua integração em cadeias de valor e mercados.

Meta 10.2 (Brasil): Incentivar cooperação internacional para o desenvolvimento, incluindo o investimento externo direto, para os Estados onde a necessidade é maior, em particular os países de menor desenvolvimento relativo, os países africanos, os pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países em desenvolvimento sem litoral, de acordo com seus planos e programas nacionais.

Meta 10.3 (Nações Unidas): Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultado, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e promover legislação, políticas e ações adequadas a este respeito.

Meta 11.1 (Brasil): Até 2030, garantir o acesso de todos a moradia digna, adequada e a preço acessível; aos serviços básicos e urbanizar os assentamentos precários de acordo com as metas assumidas no Plano Nacional de Habitação, com especial atenção para grupos em situação de vulnerabilidade.

Meta 11.2 (Brasil): Até 2030, melhorar a segurança viária e o acesso à cidade por meio de sistemas de mobilidade urbana mais sustentáveis, inclusivos, eficientes e justos, priorizando o transporte público de massa e o transporte ativo, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, como aquelas com deficiência e com mobilidade reduzida, mulheres, crianças e pessoas idosas.

Meta 11.3 (Brasil): Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, aprimorar as capacidades para o planejamento, para o controle social e para a gestão participativa, integrada e sustentável dos assentamentos humanos, em todas as unidades da federação.

Meta 11.7 (Brasil): Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em particular para as mulheres, crianças e

adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência, e demais grupos em situação de vulnerabilidade.

Meta 11.a (Brasil): Apoiar a integração econômica, social e ambiental em áreas metropolitanas e entre áreas urbanas, periurbanas, rurais e cidades gêmeas, considerando territórios de povos e comunidades tradicionais, por meio da cooperação interfederativa, reforçando o planejamento nacional, regional e local de desenvolvimento.

Meta 16.6 (Brasil): Ampliar a transparência, a *accountability* e a efetividade das instituições, em todos os níveis.

3. AVALIAÇÃO DOS COMPROMISSOS REGIONAIS

COMPROMISSOS REGIONAIS SEDOP:

7480. MACRODRENAGEM DA BACIA DO TUCUNDUBA.

7642. OFERTA DE UNIDADE HABITACIONAL.

7567. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.1. AÇÃO 7480. MACRODRENAGEM DA BACIA DO TUCUNDUBA

Além de ser um Projeto Prioritário para o Governo do Estado do Pará, a Macro drenagem da Bacia do Tucunduba destaca-se no PPA 2020/2023 como Compromisso Regional assumido para a Região de Integração Guajará, tendo como meta estabelecida “Concluir a Macro drenagem do Tucunduba” na vigência do atual PPA.

Como Secretaria responsável pelo cumprimento deste compromisso, no decorrer do ano de 2020, a Sedop empenhou-se em fazer com que a evolução da obra tivesse a celeridade necessária para alcançar o compromisso assumido pelo Governo do Estado frente à população.

Na busca deste objetivo, em 2020 foi necessário investir cerca de R\$ 62.036.015,60¹ para a execução de serviços relativos à 2ª Etapa do Projeto de Saneamento Integrado da Bacia do Tucunduba, realizados no trecho correspondente a Rua São Domingos até a Travessa Vileta, possuindo 2.175,73 metros de extensão sendo sua divisão realizada em três trechos². É importante ressaltar que o montante investido refere-se tanto a execução física da obra, quanto ao desenvolvimento de atividades relacionadas ao Trabalho Técnico Social desenvolvido pela Sedop na área de abrangência do Projeto.

Com relação à evolução física da obra, a tabela abaixo apresenta de maneira consolidada os serviços realizados no decorrer do ano de 2020 nos três trechos e, na sequência, o registro fotográfico.

¹ FONTE: SIGPLAN – MÓDULO MONITORAMENTO – 04/12/2020

2 - TRECHO 01: Corresponde a Rua São Domingos até a Rua dos Mundurucus - 814,00 metros; TRECHO 02: Corresponde a Rua dos Mundurucus até a Rua 02 de Junho - 680,00 metros; TRECHO 03: Corresponde a Rua 02 de Junho até a Travessa Vileta - 681,73 metros

TABELA 01: MACRODRENAGEM DA BACIA DO TUCUNDUBA- EVOLUÇÃO DA OBRA

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

- Instalação do Canteiro de Pré-Moldados na Passagem Vilhena com a Avenida Gentil Bittencourt.

2. RETIFICAÇÃO DO IGARAPÉ

- Abertura e retificação de 240 metros de canal;
- Revestimento em grama do talude.

3. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

- Implantação de 3.420 metros de tubulação, sendo 1.068 metros no 1º trecho (Rua São Domingos a Rua dos Mundurucus) e 2.352 no 2º trecho (Rua dos Mundurucus a Rua 02 de Junho).

4. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

- Rede Coletora de Esgoto: ao total foram implantados 3546,27 metros, sendo 1.354,02 metros no 1º trecho (Rua São Domingos a Rua dos Mundurucus) e 2.192,25 metros no 2º trecho (Rua dos Mundurucus a Rua 02 de Junho);
- Estações Elevatórias de Esgoto: foram construídas três estações elevatórias no 2º trecho e encontram-se em construção três elevatórias no 1º trecho;
- Estação de Tratamento de Esgoto: houve a retomada dos serviços referentes a Estação de Tratamento de Esgoto, a priori, as atividades em questão eram responsabilidade da COHAB, mas foram repassados à Sedop.

5. SISTEMA VIÁRIO

- Execução de 440 metros de terraplanagem;
- Serviços de Pavimentação: 620 metros de imprimação, pintura de ligação e pavimentação em CBUQ;
- Serviços Complementares: execução de 2.087 metros de meio fio de concreto pré-moldado, 1.750 m² de calçadas, 1.482,75 metros de sarjeta em concreto, 1.320 metros de guarda corpo em concreto.

6. PONTES

- Rua dos Mundurucus: Execução de Gabião;
- Avenida Gentil Bittencourt (Vão de 8,0 metros): Execução de Muro de contenção, execução de laje de transição, execução de laje alveolar, execução de barreira new 35ersey e placas pré-moldadas de passeio;
- Passagem Nossa Senhora das Graças (Vão de 28,35 metros): Cravação de 800 metros de estacas pré-moldadas de concreto secção (0,40 x 0,40), execução de viga de coroamento e içamento das lajes alveolares;

7. PASSARELAS

- Passagem Vilhena: Fornecimento e montagem de estrutura metálica;
- Passagem Santa Helena: Fornecimento e montagem de estrutura metálica;
- Rua 02 de Junho: Fornecimento e cravação de 234 metros de estacas pré-moldadas de concreto secção (0,30 x 0,30), execução de blocos de coroamento, execução do piso em concreto, fornecimento e montagem de estrutura metálica.

8. SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL

- Assentamento de 673 metros de tubulação, sendo: 505 metros de Ø400mm, 98 metros de Ø800mm, 35 metros de Ø1000mm, 35 metros de tubulação Ø1200mm;
- Execução de 06 poços de visita;
- Execução de 37 alas de lançamento
- Rede de Drenagem Auxiliar: assentamento de 1.956, 39 metros de tubulação, sendo: 708 metros Ø100mm, 890, 39 metros Ø150mm, 358 metros Ø200mm.

REGISTRO FOTOGRÁFICO – OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES:



FOTO 01: INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE PRÉ-MOLDADOS

RETIFICAÇÃO DO IGARAPÉ:



FOTO 02: REVESTIMENTO EM GRAMA NO TALUDE

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA:



FOTO 03: REDE DE ÁGUA – IMPLANTAÇÃO DE TUBULAÇÃO

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO:



FOTO 04: RETOMADA DE SERVIÇO – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

SISTEMA VIÁRIO:



FOTO 05: EXECUÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO



FOTO 06: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ



FOTO 07: EXECUÇÃO DE CALÇADA E GUARDA-CORPO

PONTES:



FOTO 08: EXECUÇÃO DE GABIÃO – PONTE MUNDURUCUS



FOTO 09: EXECUÇÃO DE GABIÃO – PONTE MUNDURUCUS



FOTO 10: IÇAMENTO LAJES ALVEOLARES – PONTE NOSSA SENHORA DAS GRACAS



FOTO 11: IÇAMENTO LAJES ALVEOLARES – PONTE NOSSA SENHORA DAS GRACAS



FOTO 12: MURO DE CONTENÇÃO –PONTE GENTIL



FOTO 13: PONTE GENTIL

PASSARELAS:



FOTO 14: PASSARELA 02 DE JUNHO



FOTO 15: PASSARELA VILHENA



FOTO 16: PASSARELA SANTA HELENA

SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL:

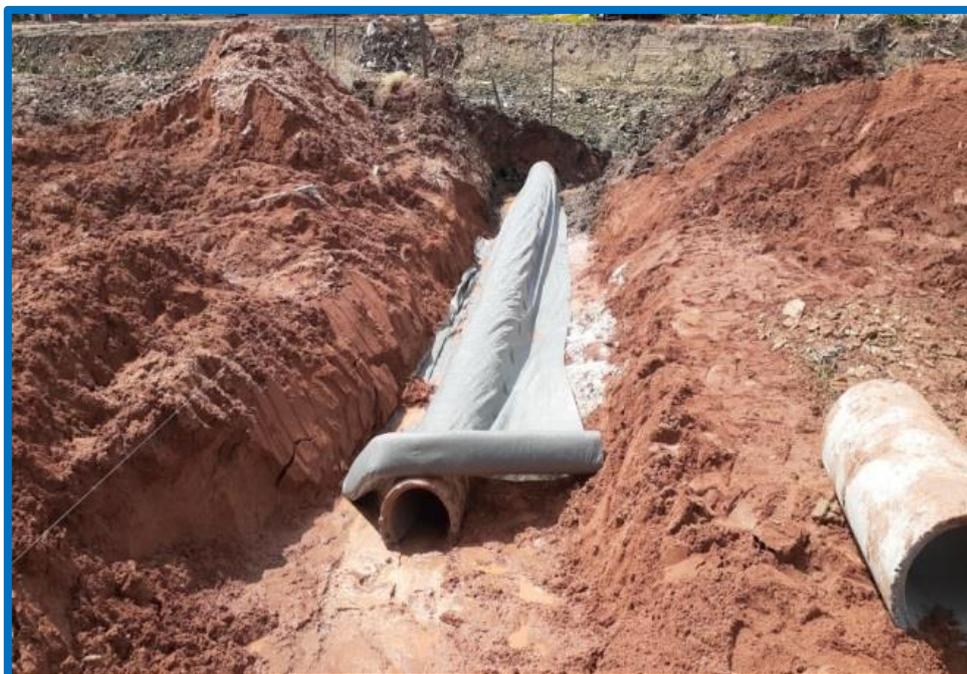


FOTO 17: ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO DE DRENAGEM



FOTO 18: REDE DE DRENAGEM

Quanto ao desenvolvimento de atividades direcionadas para a realização do Trabalho Técnico Social, como projeto integrado de urbanização, a obra de Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba, tem como uma de suas diretrizes transformar o local não só do ponto de vista urbanístico, mas de assegurar o direito à cidade aos moradores da área de influência do projeto.

Buscando atender esta premissa, do montante de R\$ 62.036.015,60 investidos na execução da obra de Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba, cerca de R\$ 8.161.465,54¹ foram destinados ao desenvolvimento de programas e ações que envolvem a comunidade residente na área de influência do projeto, principalmente no que diz respeito a oferecer suporte e apoio às intervenções físicas, sobretudo nas ações de remanejamento e reassentamento das famílias por ocasião da obra.

Dentre as atividades técnicas e sociais realizadas, a implementação do Programa Aterro de Quintais – PAQUIN, previsto em todas as fases do processo, teve seu desenvolvimento dentro do programado para o ano de 2020. Com o objetivo de possibilitar a melhoria das condições sanitárias e ambientais, o programa fornece material arenoso para os moradores que possuem suas casas localizadas em quadras com cotas muito abaixo das vias, e que por este motivo, transformaram-se em grandes bolsões de alagamentos sob os imóveis atingidos.



FOTO 19: PROGRAMA ATERRRO DE QUINTAIS (PAQUIN) – ENTREGA DE MATERIAL

¹FONTE: SIGPLAN – MÓDULO MONITORAMENTO – 04/12/2020.

A tabela abaixo apresenta o quantitativo de material distribuído para a comunidade no momento da execução dos serviços em cada trecho (1º, 2º e 3º Trechos), durante o ano de 2020:

TABELA 02: PROGRAMA ATERRO DE QUINTAIS – PAQUIN (2ª ETAPA)		
QUANTITATIVO DE MATERIAL ENTREGUE		ABRANGÊNCIA
1º TRECHO	1.175,23 m³	08 QUADRAS
2º TRECHO	6.434,42 m³	06 QUADRAS
3º TRECHO	20.154,00 m³	07 QUADRAS
TOTAL GERAL	27.763,65 m³	21 QUADRAS

FONTE: RELATÓRIO GERENCIAL - TRACTEBEL ENGINEERING Ltda –NOVEMBRO./2020

No que diz respeito às ações voltadas para a implementação do Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS), as principais atividades desenvolvidas, bem como os produtos alcançados durante o ano de 2020, podem ser conferidos de maneira sintetizada na tabela abaixo. Vale ressaltar que, em virtude da pandemia da COVID – 19 algumas atividades programadas tiveram que ser reduzidas, de modo a evitar aglomerações.

TABELA 3: PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (PTTS)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Atividades de mobilização, sensibilização e organização da comunidade;
	<ul style="list-style-type: none"> • Curso de atendente de farmácia;
	<ul style="list-style-type: none"> • Curso de operador de caixa;
	<ul style="list-style-type: none"> • Atividade de pesquisa junto aos moradores, avaliando-se os impactos e o grau de satisfação em relação ao andamento da obra e quanto às ações/atividades implementadas;
	<ul style="list-style-type: none"> • Reuniões para orientar de forma permanente a atuação dos membros da Comissão de Acompanhamento de Obra – CAO, para atuarem na resolução dos problemas e na mobilização dos moradores para participação efetiva no Projeto Social;
	<ul style="list-style-type: none"> • Plantão Social para realizar atendimentos aos moradores sobre suas reais necessidades, orientando-os a buscar soluções para os problemas apresentados;
	<ul style="list-style-type: none"> • Visita da CAO para acompanhar o andamento da obra;
	<ul style="list-style-type: none"> • Negociação de 322 famílias a serem desapropriadas em função do 3º trecho;
	<ul style="list-style-type: none"> • Remanejamento de 199 benfeitorias consideradas frentes de trabalho no 3º trecho;
	<ul style="list-style-type: none"> • Aproximadamente 49 famílias beneficiadas com o Auxílio Moradia enquanto aguardam unidades habitacionais do residencial Liberdade.

FONTE: RELATÓRIO INSTITUCIONAL DIMAC/SEDOP – NOVEMBRO 2020.

Com relação ao desempenho físico desta ação, para o ano de 2020, foi estabelecido a meta de 56% de obra executada. Destacamos que, os serviços realizados nos três trechos no decorrer do ano chegou ao percentual geral de 56,48%, ultrapassando a meta acordada e conferindo desta forma ao desempenho desta ação no ano de 2020 o status de *Conforme Programado*.

Quanto ao desempenho financeiro, da dotação inicial de R\$29.420.852,00¹ programado para atender esta ação durante o ano de 2020, foi necessário atualizar o valor com acréscimo de R\$ 32.615.163,60². Esta majoração deve-se, dentre outras situações, principalmente, a limitação do teto orçamentário disponibilizado para a Sedop, o qual ficou aquém da real necessidade para execução da obra.

Diante do exposto e considerando que a *Ação 7480. Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba* é uma das ações governamentais mais complexas e importantes, tanto para melhoria da qualidade da vida das pessoas que moram na área de abrangência do projeto, quanto para melhoria dos índices de saneamento básico do Estado do Pará, o fato da execução orçamentária ter ultrapassado a meta financeira estabelecida para o exercício de 2020, foi fundamental para que a Sedop pudesse dar a celeridade necessária para o desenvolvimento da obra e contribuindo efetivamente para o alcance do Compromisso Regional assumido pelo Governo do Estado do Pará de *Concluir a Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba* na vigência do PPA 2020/2023.

¹ FONTE: SIGPLAN – MÓDULO MONITORAMENTO – 04/12/2020.

² FONTE: SIGPLAN – MÓDULO MONITORAMENTO – 04/12/2020.

3.2. AÇÃO 7642. OFERTA DE UNIDADE HABITACIONAL

Embora o direito à moradia digna esteja assegurado pela Constituição Federal de 1988 como um dos Direitos Sociais dos Cidadãos, sendo de competência comum da União, Estados e Municípios, o referido tema é considerado um dos problemas sociais e econômicos do Brasil de maior relevância.

As péssimas condições habitacionais em que vive grande parte da população brasileira, há tempos, é um dos temas mais complexos e desafiantes a serem tratados nas políticas e ações governamentais.

Ciente deste compromisso, o Governo do Estado do Pará, utilizou como referência no momento da criação dos Programas e Ações Governamentais que conduzirão as intervenções do poder público estadual no período de 2020 a 2023, políticas públicas atentas à lógica dos direitos sociais e a garantia de melhores condições de vida.

Representando esta lógica, dentre os objetivos do Programa Desenvolvimento Urbano – Habitação, Saneamento e Mobilidade encontra-se o objetivo “*Melhorar as Condições de Habitabilidade de Famílias com Renda, Prioritariamente, até 03 Salários Mínimos*”, cuja ação responsável por contribuir com o alcance deste objetivo é a Ação 7642. Oferta de Unidade Habitacional.

A referida ação foi caracterizada como *Compromisso Regional* para a Região do Guajará no PPA 2020/2023, por ser considerado um investimento estruturante capaz de oferecer moradias com qualidade às famílias de baixa renda, proporcionando segurança, habitabilidade e saúde aos seus moradores.

Dentro desta ação, a Sedop executa a obra “Construção de 340 Unidades Habitacionais”, obra esta localizada no trecho compreendido entre o Terminal Rodoviário da UFPA e a entrada do Hospital Betina Ferro, no município de Belém.

Com relação à evolução física da obra, a tabela abaixo apresenta de maneira consolidada os serviços realizados no decorrer do ano de 2020 e, na sequência, o registro fotográfico.

TABELA 04: CONSTRUÇÃO DE 340 UNIDADES HABITACIONAIS- EVOLUÇÃO DA OBRA

1. RIACHO DOCE I (BLOCO 8)

- Instalação de Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica - SPDA;
- Instalação de rede de combate ao incêndio;
- Instalação de esquadrias;
- Instalações elétricas;
- Instalação de forro em PVC;
- Assentamento de cerâmica de parede e piso;
- Instalação de louças;
- Pintura PVA;

2. RIACHO DOCE II (BLOCOS REMANESCENTES: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 E 19)

- Tratamento/impermeabilização de calhas;
- Instalação de Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica - SPDA;
- Instalação de esquadrias;
- Instalações elétricas;
- Instalação de forro em PVC;
- Assentamento de cerâmica de parede e piso;
- Instalação de louças, metais e acessórios;
- Pintura PVA;

3. RIACHO DOCE II (BLOCOS NOVOS: 20, 21, 22, 23, 24 E 25)

- Execução de pilares, vigas e lajes;
- Execução de madeiramento, telhado;
- Fechamento dos blocos com alvenaria;
- Revestimento em chapisco;
- Revestimento em reboco;
- Instalações hidro sanitárias;
- Execução de contrapiso.

4. RIACHO DOCE III (BLOCOS 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 E 36)

- Instalação de Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica - SPDA;
- Instalação de rede de combate ao incêndio;
- Instalação de esquadrias;
- Instalações elétricas;
- Instalação de forro em PVC;
- Assentamento de cerâmica de parede e piso com rodapé;
- Revestimento de Gesso;
- Pintura PVA;
- Pintura externa;
- Execução de contrapiso.

REGISTRO FOTOGRÁFICO – RIACHO DOCE I

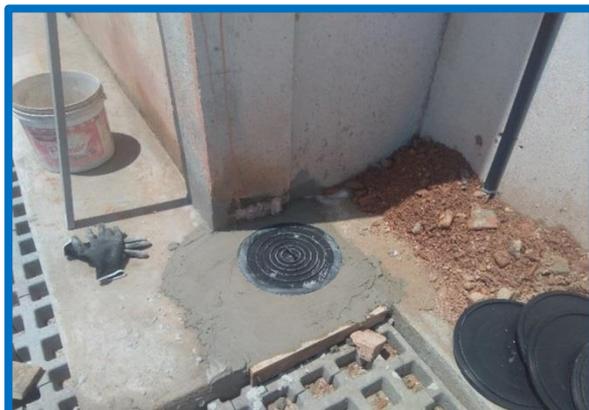


FOTO 01: INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA - SPDA



FOTO 02: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

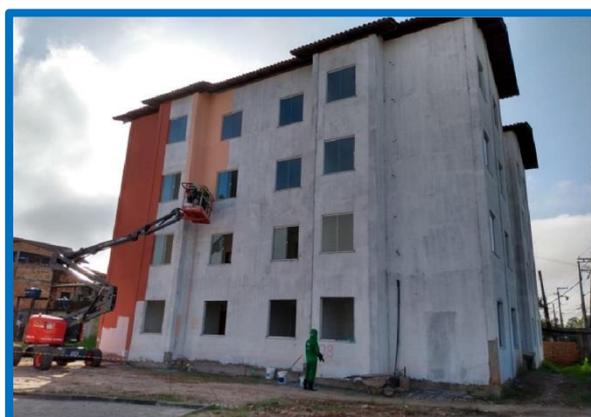


FOTO 03: PINTURA ÁREA EXTERNA

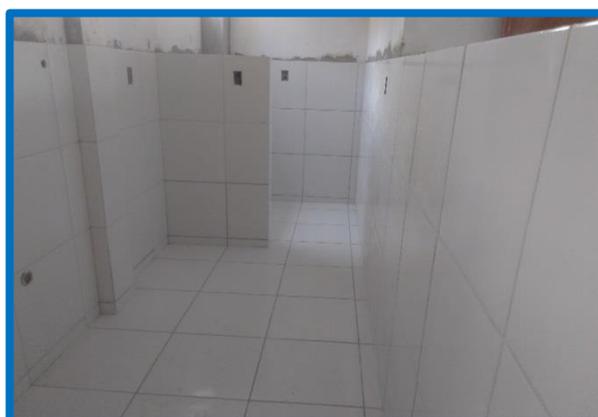


FOTO 04: ASSENTAMENTO CERÂMICA PAREDE

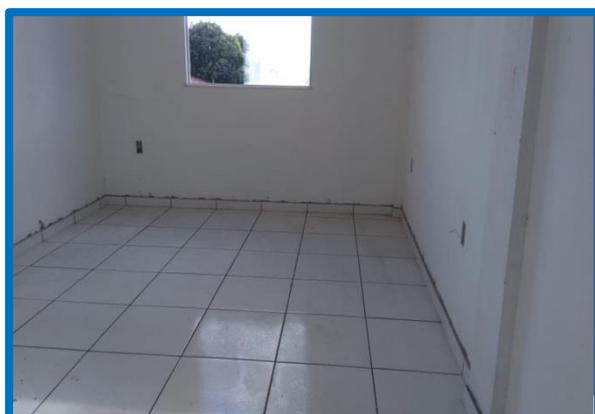


FOTO 05: ASSENTAMENTO CERÂMICA PISO

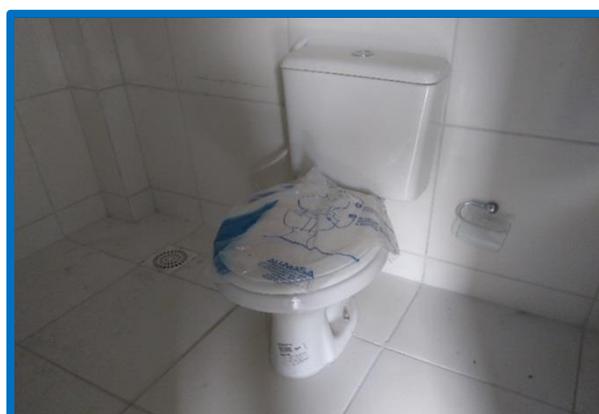


FOTO 06: INSTALAÇÃO DE LOUÇAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO – RIACHO DOCE II

BLOCOS NOVOS:



FOTO 01: MONTAGEM DE FORMAS DE PILARES, VIGAS E LAJES



FOTO 02: EXECUÇÃO DE PILARES, VIGAS E LAJES



FOTO 04: EXECUÇÃO DE MADEIRAMENTO



FOTO 03: TELHAMENTO

BLOCOS REMANESCENTES:



FOTO 01: ASSENTAMENTO DE CERÂMICA.



FOTO 02: EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA - SPDA



FOTO 03: PINTURA EXTERNA

REGISTRO FOTOGRÁFICO – RIACHO DOCE III



FOTO 01: ASSENTAMENTO DE CERÂMICA.



FOTO 02: CONTRAPISO



FOTO 03: INSTALAÇÃO DE FORRO



FOTO 04: PINTURA INTERNA



FOTO 05: REDE DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO



FOTO 03: INSTALAÇÃO DE FORRO

Com relação ao desempenho físico desta ação, para o ano de 2020, foi programado nos instrumentos de planejamento a conclusão desta obra, beneficiando cerca de 1.400 pessoas. No entanto, os 33,02% de execução física estabelecidos no cronograma físico e financeiro para serem executados no exercício de 2020, não foram alcançados.

Considerando que por conta da pandemia da COVID – 19, as obras em execução não puderam seguir a trajetória planejada, em 2020, a Sedop avançou apenas 9,36 pontos percentuais, ou seja, atingiu cerca de 28,34% da meta percentual estabelecida.

Quanto ao desempenho financeiro, do orçamento de R\$ 901.500,00¹ programado para atender esta ação durante o ano de 2020, foram utilizados R\$ 6.678.142,35². Esta majoração deve-se a limitação do teto orçamentário disponibilizado para a Sedop, o qual ficou aquém da real necessidade para execução da obra.

Diante do exposto e considerando que a *Ação 7642. Oferta de Unidade Habitacional* é uma ação prioritária e portanto um Compromisso Regional estabelecido no PPA 2020/2023, mais uma vez ressaltamos que a atualização da dotação orçamentária foi fundamental para que a Sedop pudesse dar a celeridade necessária para o desenvolvimento da obra e contribuindo efetivamente para a conclusão da obra “*Construção de 340 Unidades Habitacionais*” na vigência do PPA 2020/2023.

¹ FONTE: SIGPLAN – MÓDULO MONITORAMENTO – 04/12/2020.

² FONTE: SIGPLAN – MÓDULO MONITORAMENTO – 04/12/2020.

3.3. AÇÃO 7567. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Dentre os municípios propostos para serem contemplados com a execução de obra de Sistema de Abastecimento de Água, o município de Marabá destaca-se na Região de Integração Carajás, conforme metodologia estabelecida para elaboração do PPA 2020/2023, como município a ser contemplado com obra de Sistema de Abastecimento de Água, cujas características agregará valor substancial ao conjunto de serviços já colocados à disposição da população residente no município, preenchendo desta forma, os requisitos fundamentais para uma obra ser considerada Compromisso Regional.

No momento da elaboração do PPA 2020/2023, os técnicos da área de saneamento básico da Sedop, fizeram a projeção para construir um sistema de abastecimento de água levando em consideração a estimativa de crescimento populacional do município de Marabá até 2023. Este novo sistema teria capacidade de atendimento para cerca de 235 mil pessoas, com entrega de 29 mil ligações domiciliares.

Acontece que, com o cenário pandêmico que se estabeleceu durante todo o ano de 2020 e que perdura até os dias atuais, as tratativas para início de novas obras ficaram prejudicadas, principalmente, devido à suspensão das viagens dos técnicos da Sedop, as quais são fundamentais para a caracterização da área do projeto e diagnóstico da situação atual.

Tendo em vista este cenário e considerando que, a chegada da pandemia da COVID-19, evidenciou de maneira negativa a vulnerabilidade dos municípios com menores índices de saneamento básico quanto ao enfrentamento da doença, a Sedop, para o ano de 2021, considerando que possivelmente será um ano que acontecerá a primeira revisão do PPA 2020/2023, adotará como premissa para tomadas de decisão quanto à proposição de novas obras de sistema de abastecimento de água, bem como, de sistema de esgotamento sanitário, os principais estudos e pesquisas disponíveis que possam subsidiar as decisões da Sedop enquanto órgão responsável por realizar obras voltadas para o saneamento básico.

Neste sentido, temos a informar que ***todas as Novas Obras de Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário***, serão revistas na programação física e financeira para o ano de 2021, e isto inclui a obra de Sistema de Abastecimento de Água proposta para o município de Marabá.

4. DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SEDOP

4.1 PROGRAMA 1489

DESENVOLVIMENTO URBANO – HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MOBILIDADE

AÇÕES GOVERNAMENTAIS:

7567. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.

7568. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.

7608. CONSTRUÇÃO DE PARQUES URBANOS.

7644. IMPLANTAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS.

7645. PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.

7646. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GOVERNANÇA.

8463. APOIO ÀS AÇÕES DO CONCIDADES.

8692. APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO.

8694. APOIO TÉCNICO-INSTITUCIONAL NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

4.1.1. AÇÃO 7567. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

REGIÃO ARAGUAIA					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ÁGUA AZUL DO NORTE, FLORESTA DO ARAGUAIA, SANTA MARIA DAS BARREIRAS E SÃO FÉLIX DO XINGU.					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2020	14.832 LIGAÇÕES

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020					
<p>Para o ano de 2020, foi programado no PPA 2020/2023 a execução da <i>Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água</i> em quatro municípios da Região Araguaia: Água Azul do Norte, Floresta do Araguaia, Santa Maria das Barreiras e São Félix do Xingu.</p> <p>Com exceção da obra executada no município de Água Azul do Norte, as obras previstas nos demais municípios foram proposições da Sedop para o PPA 2020/2023, levando em consideração os municípios com os menores índices de atendimento em sistema de abastecimento de água¹.</p> <p>Destas proposições, a Sedop planejou início e conclusão da obra de sistema de abastecimento de água no município de São Félix do Xingu, o que corresponde a meta estabelecida para Região Araguaia de 14.832 ligações domiciliares.</p> <p>Acontece que, com o cenário pandêmico que se firmou no início de 2020 e que perdura até os dias atuais, as tratativas para início de novas obras nos municípios de Floresta do Araguaia, Santa Maria das Barreiras e, principalmente, no município de São Félix do Xingu não puderam começar.</p> <p>Quanto a obra que está em execução no município de Água Azul do Norte (<i>Perfuração de 2 poços com 90 metros e 8"cada, com capacidade para atender 750 pessoas</i>), com a suspensão das viagens dos técnicos responsáveis pelas fiscalizações das obras por conta da pandemia, não houve como realizar as vistorias necessárias para atestar a evolução da obra. No entanto, com o retorno das atividades no início do segundo semestre, a área técnica atestou que a obra está em processo de conclusão, com a expectativa de emitir o laudo final até dezembro de 2020.</p> <p>Ressaltando que a referida obra trata-se de uma complementação necessária para que o sistema de abastecimento de água já existente nos município possa funcionar com eficiência e eficácia.</p> <p>Com relação ao desempenho financeiro, como as obras previstas não puderam ser iniciadas em 2020, houve execução financeira de 7% do valor programado para atender a região durante o ano de 2020, correspondendo a um valor de R\$ 25.797,58². O referido valor foi destinado principalmente ao repasse financeiro para a Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte (destaque orçamentário), responsável pela execução da obra de <i>"Implantação de Microsistema de Abastecimento de Água Tratada"</i>.</p> <p>Finalizando, considerando que a execução física e financeira da <i>Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água</i> na Região Araguaia não aconteceu conforme o programado nos instrumentos de Planejamento Público (PPA 2020/2023 e LOA 2020), o desempenho físico e financeiro desta ação durante o ano de 2020 foi <i>Abaixo do Esperado</i>.</p>					

¹ FONTE: RELATÓRIO UFPA – CONVÊNIO 01/2012

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020.

REGIÃO BAIXO AMAZONAS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: BELTERRA, FARO, ÓBIDOS, PRAINHA.					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2020	4.701 LIGAÇÕES

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020					
<p>Na Região Baixo Amazonas, para o ano de 2020 a Sedop programou a execução de obras de sistema de abastecimento de água em quatro municípios: Belterra, Faro, Óbidos e Prainha.</p> <p>Dos quatro municípios, o único que não possui obra iniciada, é o município de Belterra, o qual foi contemplado com recursos oriundo da operação de crédito FINISA 2 para execução de obra de sistema de abastecimento de água. O processo pertinente à execução desta obra está na fase interna da licitação, ou seja, na etapa de elaboração do Termo de Referência, o qual fornece as principais informações quanto à definição do objeto a ser executados para posterior elaboração do projeto básico.</p> <p>Os demais municípios (Faro, Óbidos e Prainha) possuem obras executados com recursos provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, financiadas pela Fundação Nacional de Saúde – FUNASA e que, embora o cronograma físico e financeiro das referidas obras tivesse como meta a conclusão das mesmas até o final de 2020, o cenário pandêmico da COVID - 19 acabou por impactar na não execução do cronograma planejado, tanto no que diz respeito ao aspecto físico, quanto no financeiro.</p> <p>Com esta situação, o status de Paralisada manteve-se nas obras de Sistema de Abastecimento de Água em desenvolvimento nos municípios de Faro, Óbidos e Prainha, os quais aguardam a finalização do processo licitatório para posterior retomada das obras. Faz-se necessário esclarecer que, embora estas obras não tenham tido evolução física, a atuação da Sedop voltou-se para além da conclusão dos processos licitatórios, como análise e atualização de projetos, preços e serviços.</p> <p>O fato é que, a paralisação destas obras impactou diretamente na não obtenção da meta física estabelecida para a Região Baixo Amazonas, uma vez que, o cumprimento da meta de 4.701 ligações domiciliares realizadas, refere-se à previsão de conclusão das obras em dois municípios: Óbidos com 2.665 ligações domiciliares e Prainha com 2.036 ligações</p> <p>Com relação à execução financeira, embora as obras dos municípios planejados para terem desembolso financeiro durante o ano de 2020 não tenham tido execução física, do orçamento programado de R\$ 1.357.286,00¹ para o desenvolvimento desta ação na Região Baixo Amazonas, foram utilizados cerca de R\$ 557.800,53², para serviços referentes a conclusão do Sistema de Abastecimento de Água no município de Almeirim (PAC FUNASA) e a construção de microssistema de abastecimento de água no município de Mojuí dos Campos (destaque orçamentário).</p> <p>É importante esclarecer que, no momento da elaboração do orçamento para o exercício de 2020, não havia expectativa de dispêndios financeiros para a obra em execução no município de Almeirim, uma vez que, no exercício de 2019, a mesma apresentava desempenho físico e financeiro em acordo com o cronograma estabelecido e estava em fase</p>					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020.

de conclusão.

Ocorre que, para concluir a obra de Sistema de Abastecimento de Água no município de Almeirim, houve a necessidade de realizar serviços adicionais e pagamento de reequilíbrio financeiro do contrato os quais, por força maior, tiveram execução financeira durante o ano de 2020.

Outra situação a ser destacada é que no segundo semestre de 2020 ocorreu um acidente no Reservatório Elevado ocasionando o desabamento por completo. O Reservatório que desabou estava na fase de testes, e por isso não havia sido entregue.

Os motivos que ensejaram o acidente ocorrido na obra de Almeirim ainda são desconhecidos e a Sedop está no aguardo da Perícia realizada pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves com o laudo das possíveis causas. A Sedop informa que irá concluir o Sistema de Abastecimento de Água de Almeirim.

Frente ao cenário apresentado, a *Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água* teve o desempenho físico e financeiro durante o ano de 2020 na Região Baixo Amazonas, *Abaixo do Esperado*.

REGIÃO CARAJÁS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ELDORADO DOS CARAJÁS, MARABÁ, PALESTINA DO PARÁ, PIÇARRA E SÃO JOÃO DO ARAGUAIA.					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2020	1.244 LIGAÇÕES

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020
<p>Na Região Carajás, dos cinco municípios contemplados com obras de Sistema de Abastecimento de Água, apenas o município de Palestina do Pará possui obra em execução. Os demais municípios (Eldorado dos Carajás, Marabá, Piçarra e São João do Araguaia) são proposições da Sedop para o PPA 2020/2023.</p> <p>Quanto a evolução física das obras com status de Nova, todas foram impactadas pelo cenário pandêmico que se firmou no início de 2020, não conseguindo avançar nas tratativas necessárias para início das mesmas.</p> <p>Com relação à obra em desenvolvimento no município de Palestina do Pará, também impactada pelo cenário pandêmico, a mesma vem sendo executada com um ritmo muito abaixo do planejado no cronograma físico e financeiro. Como providência, a Sedop notificou a empresa para que cumpra o cronograma físico da obra conforme o programado e se manifeste quanto ao atraso no cumprimento do cronograma estabelecido.</p> <p>Quanto o alcance da meta estabelecida para Região Carajás (1.244 ligações domiciliares) no ano de 2020, a obtenção da mesma está diretamente relacionada com a conclusão da obra de Sistema de Abastecimento de Água no município de Palestina do Pará. Obra esta que, devido a baixa evolução física não pôde ser concluída e atribuindo desta forma um desempenho físico para esta ação na Região Carajás de <i>Abaixo do Esperado</i>.</p> <p>No que diz respeito ao desempenho financeiro, no decorrer do ano de 2020 foram investidos cerca de R\$ 132.676,67¹ referentes à execução e fiscalização da obra de Sistema de Abastecimento de Água no município de Palestina do Pará, o que corresponde a 30% do valor total programado para atender a Região Carajás durante o ano de 2020.</p> <p>Sendo assim, diante do exposto, o desempenho físico e financeiro da <i>Ação 7567. Realização de Obras de Sistema de Abastecimento de Água</i> na Região Carajás no exercício de 2020 ficou <i>Abaixo do Esperado</i>.</p>

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO - 04/12/2020

REGIÃO GUAJARÁ					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: BELÉM					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2020	24.830 LIGAÇÕES

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Tendo apenas Belém como município contemplado pela *Ação 7567. Realização de Obras de Sistema de Abastecimento de Água* na Região Guajará, para o ano de 2020, foi programada pela Sedop atender o município com duas obras de sistema de abastecimento de água:

1. A continuidade da obra *“Construção de Sistema de Abastecimento de Água - Ampliação do 4º Setor”*.
2. Início das obras de Sistema de Abastecimento de Água atendendo a população das ilhas do Combu, Murucutum e Ilha Grande.

A primeira obra é financiada com recurso da Caixa Econômica Federal – CEF e desde o ano de 2018 vem passando por alterações como reprogramação financeira e redução de metas, situações estas que acabaram por contribuir com a paralisação prolongada desta obra.

A continuidade desta obra depende da finalização do novo processo licitatório cujo objeto passa ser *“Reabilitação do Sistema de Abastecimento de Água no Município de Belém - 4º SETOR”* uma vez que, o objetivo agora é fazer intervenção física que prolongue a vida útil do sistema, melhorando seu desempenho de qualidade da água. O Projeto contempla a troca de 285 metros da rede de distribuição existente em fibrocimento para PVC e prevê 145 ligações domiciliares.

Entretanto, no decorrer do ano de 2020, não houve a finalização do processo licitatório para que a Sedop pudesse continuar a obra. O único dispêndio financeiro relacionado a esta obra, refere-se ao pagamento de tarifa de reprogramação financeira e alteração de vigência junto a Caixa Econômica Federal – CEF.

Quanto à segunda obra, a qual envolve a construção de sistema de abastecimento de água que beneficie a população residente nas ilhas do Combu, Murucutum e Ilha Grande, já encontra-se elaborado o Termo de Referência para elaboração do projeto e no momento está em fase de elaboração do edital.

Com relação à execução financeira, do valor programado de R\$ 1.901.205,00¹, foram utilizados cerca de R\$ 7.266.227,03², ultrapassando a meta financeira em R\$ 3.861.737,48. O montante ultrapassado é justificado pelo pagamento do Contrato que a Sedop tem com a Empresa que presta serviços técnicos de Consultoria e Assessoria Técnica para Gerenciamento, Supervisão, Fiscalização e Acompanhamento de Ações, Contratos e Obras sob a responsabilidade da Sedop. Este pagamento está programado para ser atendido por esta ação, na natureza de despesa 449035 – *Serviços de Consultoria* por ser considerado uma despesa necessária para a realização das obras de saneamento básico.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020.

Por fim, ressaltamos que todas as condicionantes relatadas anteriormente acabaram por influenciar na não obtenção da meta acordada para o ano de 2020 e, conseqüentemente, no baixo desempenho físico desta ação na Região Guajará, situação esta que confere à *Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água* status de *Abaixo do Esperado*.

REGIÃO GUAMÁ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: MARACANÃ, SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ, SÃO CAETANO DE ODIVELAS, SÃO FRANCISCO DO PARÁ.					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2020	9.784 LIGAÇÕES

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020
<p>Para o ano de 2020, a Sedop programou atender quatro municípios da Região Guamá com obras de Abastecimento de Água. São eles: Maracanã, Santo Antônio do Tauá, São Caetano de Odivelas e São Francisco do Pará.</p> <p>As referidas obras são executadas através de convênio celebrado entre o Governo do Estado do Pará e a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA e, embora no ano de 2019 a Sedop tenha estabelecido como meta priorizar todas as tratativas possíveis para solucionar os problemas que impedem a conclusão destas obras nos referidos municípios, a capacidade resolutiva de todas as pendências, sejam elas de ordem técnica, documental ou financeira, não está sob a governabilidade da Sedop.</p> <p>Desta forma, por maior que tenha sido o empenho da Sedop em dar continuidade às obras relacionadas a todos os municípios programados, no ano de 2020, apenas o município de Santo Antônio do Tauá e São Caetano de Odivelas tiveram execução física e financeira. Com relação ao município de São Caetano de Odivelas a referida obra foi concluída em Novembro, atingido a meta estabelecido de 1.300 ligações domiciliares realizadas.</p> <p>Outro município da Região do Guamá que, embora não tenha sido programado, mas teve execução de obra durante o ano de 2020, foi Igarapé-Açu. Licitada em dezembro de 2019, a obra prevê a execução de Serviços de uma Caixa D'água na Colônia do Prata que beneficiará 2.155 pessoas, contribuindo com a melhoria dos índices de saneamento básico da Região Guamá.</p> <p>Com relação à obra executada no município de São Francisco do Pará, em junho de 2020 foi dada a ordem de serviço para empresa iniciar a obra do sistema de abastecimento de água, no entanto, ainda sob o impacto da pandemia, o fornecimento do material necessário para execução da obra está sendo entregue com atraso, impactando diretamente no ritmo da obra.</p> <p>Diante do cenário de baixa evolução física das obras, e levando em conta que da meta estabelecida de 9.784 ligações domiciliares, foi alcançada 1.300 ligações domiciliares com a conclusão da obra de São Caetano de Odivelas, o que equivale cerca de 13,28% da meta programada, o desempenho físico <i>da Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água</i> na Região Guamá no exercício de 2020 esteve <i>Abaixo do Programado</i>.</p> <p>Quanto ao desempenho financeiro, houve investimento de R\$ 2.203.952,16¹ na Região Guamá, ultrapassando o orçamento programado de R\$ 1.591.330,00² em 38%. Do total investido, cerca de 87%, foram necessários para regularização de Boletins de Medição da obra em execução no município de Santo Antônio do Tauá.</p>

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

Por fim, a Sedop lamenta que, por todos os fatores ora apresentados, o desempenho físico e financeiro *da Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água* na Região Guamá no exercício de 2020 tenha sido *Abaixo do Esperado*.

REGIÃO LAGO DE TUCURUÍ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: BREU BRANCO, GOIANÉSIA DO PARÁ, JACUNDÁ					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2020	9.673 LIGAÇÕES

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Na Região de Integração Lago de Tucuruí, para o ano de 2020, foram previstos a continuidade das obras de Sistema de Abastecimento de Água nos municípios de Breu Branco, Goianésia do Pará e Jacundá. Todas estas obras são contempladas com recursos oriundos da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA.

Ressalta-se que a meta de 9.673 ligações domiciliares a serem obtidas no ano de 2020, está diretamente relacionada com a conclusão da obra de Sistema de Abastecimento de Água no município de Jacundá, a qual está em fase de finalização e espera-se que esteja concluída até dezembro de 2020.

Quanto às obras referentes aos municípios de Breu Branco e Goianésia do Pará, as mesmas continuam paralisadas, aguardando início de um novo processo licitatório. O município de Breu Branco encontra-se na etapa de elaboração do projeto básico e Goianésia do Pará com o projeto básico já está aprovado, estando na fase de elaboração do edital. Mais uma vez a Sedop destaca que o cenário pandêmico interferiu na celeridade deste processo durante o ano de 2020.

Com relação ao desempenho financeiro, o orçamento programado para o desenvolvimento desta ação na Região Lago de Tucuruí foi de R\$ 1.552.025,00¹, entretanto devido às obras estarem paralisadas, houve dispêndio financeiro de R\$ 461.911,08², o que equivale à execução financeira de apenas 30% do valor total planejado, e não reflete a execução física de obras na Região. O valor refere-se ao pagamento da outorga para a obra do município de Goianésia do Pará e devolução de recursos para FUNASA no caso da obra relacionada ao município de Jacundá.

Neste sentido, pelos motivos apresentados, no exercício de 2020 a *Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água* teve o desempenho físico e financeiro *Abaixo do Esperado* na Região Lago de Tucuruí.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO –04/12/2020.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO –04/12/2020.

REGIÃO MARAJÓ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ANAJÁS, BAGRE, BREVES, CHAVES, GURUPÁ, MELGAÇO, PORTEL, SALVATERRA, SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2020	3.141 LIGAÇÕES

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020
<p>Em 2020, a Sedop incluiu no seu planejamento o atendimento de nove municípios da Região do Marajó com obras de Abastecimento de Água: Anajás, Bagre, Breves, Chaves, Gurupá, Salvaterra e São Sebastião da Boa Vista.</p> <p>Dos municípios programados, Bagre, Chaves, Gurupá e Salvaterra foram proposições da Sedop para o PPA 2020/2023, fundamentadas nos municípios da Região Marajó com os menores índices de saneamento básico. Os demais municípios possuem obras de Sistema de Abastecimento de Água já iniciadas, as quais são contempladas ou com recursos oriundos da FUNASA (Anajás e São Sebastião da Boa Vista) ou da CAIXA (Breves).</p> <p>Ressaltamos que, a obra executada no município de Breves foi finalizada e entregue a COSANPA no ano de 2018, entretanto houve necessidade de manter o município no OGE 2020 devido à necessidade de solucionar algumas pendências para realizar a prestação de contas final. As referidas pendências já foram sanadas e a prestação de contas final junto à mandatária foi aprovada, encerrando desta forma o TC PAC.</p> <p>Com relação às obras previstas para iniciar em 2020, assim como nas demais regiões de integração, a pandemia de COVID – 19 acabou por interferir nas tratativas necessárias para a abertura do processo referente à execução das novas obras, tendo como consequência o adiamento do início das obras.</p> <p>Quanto às obras executadas com recurso da FUNASA, o município de Anajás possui duas obras de sistema de abastecimento de água. Uma financiada como recurso proveniente do PAC 1 a qual foi retomada no segundo semestre de 2020, e a outra financiada com recurso do PAC 2 a qual encontra-se paralisada aguardando início de novo processo licitatório.</p> <p>A obra de Sistema de Abastecimento de Água no município de São Sebastião da Boa Vista, encontra-se em execução, entretanto, com evolução abaixo do esperado, devido alguns problemas de ordem técnica encontrados no projeto licitado.</p> <p>Com relação à execução financeira, do valor de R\$ 2.073.000,00¹ programado para o ano de 2020, foram utilizados R\$ 1.372.722,68² o que corresponde a 50% do orçamento planejado, porém não reflete necessariamente dispêndio com a execução de obras nos municípios previstos para o ano de 2020. Parte deste descompasso é devido às tentativas de regularizar as pendências existentes em obras executadas com recursos da FUNASA na</p>

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

Região Marajó, seja concentrando esforços para finalizar obras previstas para encerrar no exercício passado, como no caso de Currealinho, seja através da devolução de saldo do convênio para FUNASA.

Por fim, considerando às circunstâncias apresentadas, no decorrer do ano de 2020, a *Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água* na Região Marajó apresentou o desempenho físico e financeiro *Abaixo do Esperado*.

REGIÃO RIO CAETÉ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: QUATIPURU E TRACUATEUA					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2020	1.136 LIGAÇÕES

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

A atuação da Sedop na Região Rio Caeté durante o ano de 2020 concentrou-se na execução de obras de sistema de abastecimento de água nos municípios de Quatipuru e Tracuateua, ambos contemplados com recursos provenientes do PAC FUNASA.

Quanto à obra referente ao município de Quatipuru, já foi finalizado o novo processo licitatório no qual a obra foi submetida e emitida a Ordem de Serviço para continuidade da obra.

O município de Tracuateua teve sua obra concluída no segundo semestre de 2020, alcançando desta forma a meta estabelecida para a Região Rio Caeté de 1.136 ligações domiciliares realizadas.

Outra obra que foi concluída durante o ano de 2020, foi à obra de Sistema de Abastecimento de Água executada no município de Primavera. A mesma fazia parte do grupo de obras financiadas com recursos oriundos do PAC FUNASA que estavam com várias pendências, sejam de ordem técnica, financeira ou documental, mas que, apesar deste cenário, a Sedop vislumbrava sua conclusão ainda no ano de 2019.

No entanto, apenas no segundo semestre de 2020, a Sedop conseguiu sanar todas as pendências referente à obra do município de Primavera e concluir a obra. Com a entrega da obra, a população será beneficiada com 1.000 novas ligações domiciliares.

Com relação à execução financeira, foram investidos cerca de R\$ 801.515,26¹ na execução de obras e apoio técnico necessário ao desenvolvimento desta ação na região Rio Caeté, o que representa uma execução de 47% do valor programado para o ano de 2020 que foi R\$ 1.689.523,00².

Por fim, considerando que a meta física acordada para a região foi ultrapassada em 1.000 ligações domiciliares, a atuação da Sedop na Região Rio Caeté através da *Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água* no exercício de 2020 foi *Acima do Programado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020.

REGIÃO RIO CAPIM					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: IRITUIA, NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, OURÉM					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2020	3.455 LIGAÇÕES

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020					
<p>Na Região Rio Capim, para o ano de 2020, a Sedop planejou o atendimento de três municípios com obras de abastecimento de água: Irituia, Nova Esperança do Piriá e Ourém.</p> <p>Os municípios de Irituia e Ourém foram beneficiados com o Programa Aceleração do Crescimento – PAC para execução de obras de sistema de abastecimento de água através de recursos financiado pela FUNASA.</p> <p>A obra no município de Irituia faz parte do conjunto de obras da FUNASA que tiveram que passar por minucioso levantamento (técnico, documental, financeiro...) durante o ano de 2019 e que, depois de identificadas e sanadas todas as pendências, houve necessidade de realizar um novo processo licitatório, situação em que a obra se encontra atualmente.</p> <p>Quanto ao município de Ourém, a obra está em fase de conclusão. É importante destacar que a paralisação das atividades de fiscalização por conta da pandemia da COVID – 19 acabou por interferir no ritmo da obra, postergando sua conclusão para 1º semestre de 2021.</p> <p>Ressaltamos que a meta física estabelecida para a Região, refere-se a conclusão das obras nos municípios de Irituia (1.777 ligações domiciliares) e Ourém (1.678 ligações domiciliares). Como não houve conclusão das obras, a meta acordada de 3.455 ligações domiciliares realizadas não foi alcançada, o que confere a esta ação o desempenho físico abaixo do esperado.</p> <p>A Obra de Nova Esperança do Piriá é executada através de Contrato de Repasse com a Caixa Econômica Federal – CEF, a qual está passando por um novo processo licitatório estando na fase de homologação.</p> <p>Com relação ao desempenho financeiro, do valor de R\$ 1.849.134,00¹ programado para atender esta região durante o ano de 2020, foram utilizados cerca de R\$ 2.643.009,82², ultrapassando a meta financeira em 43%. Do valor ultrapassado, R\$ 2.535.709,40 são referentes à execução da obra de sistema de abastecimento de água no município de Ourém. Esta majoração é justificada devido à necessidade de agilizar a evolução física da obra, a qual está em fase de conclusão.</p> <p>Finalizando, por mais esforços que a Sedop tenha feito para finalizar as obras na Região Rio Capim, o desempenho físico e financeiro da <i>Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água</i> na Região Rio Capim durante o ano de 2020 foi <i>Abaixo do Esperado</i>.</p>					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

REGIÃO TAPAJÓS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: AVEIRO, ITAITUBA, JACAREACANGA, TRAIRÃO					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2020	NÃO FOI PREVISTO CONCLUSÃO DE OBRA NESTA REGIÃO

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020					
<p>Para o ano de 2020, a Sedop programou atender quatro municípios da Região Tapajós: Aveiro, Itaituba, Jacareacanga e Trairão. Com exceção do município de Jacareacanga, os demais municípios constam no PPA 2020/2023 como proposições de obras novas de sistema de abastecimento de água para a Região Tapajós.</p> <p>Para o município de Aveiro, foi proposto a <i>Construção de 04 (quatro) Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água</i>, com valor inicial de R\$659.411,60. Atualmente o processo está na Casa Civil aguardando validação do valor da obra para posterior continuidade do processo.</p> <p>Em Itaituba, a decisão foi de <i>Construção de 02 (dois) Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água</i> com valor inicial de R\$ 300.000,00. A proposta inclui 01 Sistema Simplificado na Comunidade Moraes de Almeida e 01 Sistema Simplificado na Comunidade Nova União. Atualmente, o processo encontra-se em análise pela Diretoria Técnica (DITEC) da Sedop.</p> <p>No município de Trairão, também foi proposto a <i>Construção de 02 (dois) Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água</i> com valor inicial de R\$ 300.000,00. A proposta inclui 01 Sistema Simplificado na Comunidade Três Boeiras e 01 Sistema Simplificado na Comunidade Vila Planalto. Assim como no caso do município de Itaituba, o processo de Trairão também encontra-se em análise pela Diretoria Técnica (DITEC) da Sedop.</p> <p>Com relação ao município de Jacareacanga, o mesmo faz parte dos municípios que foram beneficiados com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com financiamento oriundo da FUNASA. Isto significa que, para a continuidade da obra, pendências de ordem técnica precisam ser solucionadas. Entretanto, embora a evolução física da obra de sistema de abastecimento de água no município de Jacareacanga esteja paralisada, o processo segue em andamento com os seguintes procedimentos adotados pela Sedop: Contrato com a empresa responsável pela execução da obra rescindido; Novo projeto básico em fase de elaboração para posterior início de Processo Licitatório.</p> <p>Quanto à execução financeira, embora esta ação governamental tenha tido avanços no decorrer do ano de 2020, todas as atividades realizadas demandaram apenas capital cognitivo dos técnicos envolvidos, o que justifica o não dispêndio financeiro.</p> <p>Por fim, considerando que não foi programado conclusão de obras nesta região para o ano de 2020 e que, embora tenha tido os avanços acima relatados nos municípios planejados, não houve desempenho financeiro. Sendo assim, o desempenho da <i>Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água</i> na Região Tapajós foi <i>Abaixo do Esperado</i>.</p>					

REGIÃO TOCANTINS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ACARÁ, BARCARENA, OEIRAS DO PARÁ, TAILÂNDIA					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2020	15.336 LIGAÇÕES

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020					
<p>Para a Região Tocantins, a Sedop planejou atender com obras novas os municípios de Acará e Barcarena e dar continuidade nas obras já iniciadas nos municípios de Oeiras do Pará e Tailândia.</p> <p>Quanto aos municípios de Acará e Barcarena, ainda não foi dado início ao processo necessário para execução de obras nos municípios. Parte disso é resultado do cenário pandêmico do COVID-19 em que estamos vivendo, no qual interferiu diretamente nas tratativas necessárias para início de novos processos.</p> <p>Com relação aos municípios de Oeiras do Pará e Tailândia, ambos fazem parte dos municípios que foram beneficiados com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o primeiro com financiamento oriundo da FUNASA e o segundo com financiamento oriundo da CEF.</p> <p>A obra no município de Oeiras do Pará passou por um novo processo licitatório e está no aguardo da Ordem de Serviço para reiniciar. Já a obra de sistema de abastecimento de água iniciada no município de Tailândia está passando por um novo processo licitatório para posterior continuidade dos serviços.</p> <p>A não evolução física das obras de sistema de abastecimento de água dos municípios de Oeiras do Pará e Tailândia impactaram diretamente no não atingimento da meta estabelecida para região, uma vez que a obtenção da mesma é consequência da conclusão destas obras.</p> <p>Quanto à execução financeira, do valor de R\$ 819.742,00¹ programado para atender a Região Tocantins no decorrer do ano de 2020, houve apenas movimentação orçamentária no valor de R\$ 1.305,59² para realização de serviços de apoio técnico (diárias), conferindo desta forma um baixo desempenho financeiro desta ação na Região Tocantins.</p>					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO- 04/12/2020.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO- 04/12/2020.

REGIÃO XINGU					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ALTAMIRA, ANAPU, BRASIL NOVO, MEDICILÂNDIA, PACAJÁ, PLACAS, URUARÁ, VITÓRIA DO XINGU					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2020	1.642 LIGAÇÕES

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020
<p>Para o ano de 2020, a Sedop planejou atender 08 municípios da Região Xingu: Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Placas, Uruará e Vitória do Xingu.</p> <p>Destes, 07 municípios são proposições da Sedop para o PPA 2020/2023. São eles: Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Uruará e Vitória do Xingu.</p> <p>Para o município de Altamira, foi proposto a <i>Construção de 02 (dois) Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água</i>, com valor inicial de R\$329.705,80. Atualmente o processo está na Casa Civil aguardando validação do valor da obra para posterior continuidade do processo.</p> <p>No município de Uruará, também foi proposto a <i>Construção de 07 (sete) Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água</i> com valor inicial de R\$ 1.153.970,30. Atualmente processo está aguardo Ordem de Serviço para início da obra.</p> <p>Nos demais municípios (Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá e Vitória do Xingu), ainda não houve início do processo necessário para execução das obras de sistema de abastecimento de água nos municípios em questão. Parte disso é resultado do cenário pandêmico do COVID-19 em que estamos vivendo, no qual interferiu diretamente nas tratativas necessárias para início de novos processos.</p> <p>Com relação ao município de Placas, o mesmo faz parte dos municípios que foram beneficiados com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com financiamento oriundo da FUNASA. Após pendências de ordem técnica terem sido solucionadas, a obra segue em execução, no entanto por não ser concluída em 2020, a meta física de 1.642 ligações domiciliares não será atingida.</p> <p>Quanto à execução financeira, do valor de R\$ 767.500,00¹ programado para atender a Região Xingu no decorrer do ano de 2020, houve movimentação orçamentária no valor de R\$ 400.574,22² correspondendo a cerca de 52% do total programado.</p> <p>Finalizando, diante do cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da <i>Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água</i> na Região do Xingu no exercício de 2020 esteve <i>Abaixo do Esperado</i>.</p>

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO- 04/12/2020.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO- 04/12/2020.

4.1.2. AÇÃO 7568. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

REGIÃO ARAGUAIA					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: SANTA MARIA DAS BARREIRAS					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2020	2.352 LIGAÇÕES

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020
<p>Considerando que no PPA 2016/2019 a Região Araguaia não foi contemplada com ação governamental para realização de obras de esgotamento sanitário, a Sedop, com o intuito de corrigir esta lacuna e levando em consideração a real necessidade de incluir nos instrumentos de planejamento público, municípios paraenses com os menores índices de atendimento em Sistema de Esgotamento Sanitário, propôs no momento da elaboração do PPA 2020/2023, que o município de Santa Maria das Barreiras fosse atendido pela <i>Ação 7568. Realização de Obras de Sistema de Esgotamento Sanitário</i>.</p> <p>Com este foco, a Sedop planejou para o ano de 2020 a Construção de Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Santa Maria das Barreiras, beneficiando a população local com 2.352 Ligações Domiciliares.</p> <p>No entanto, com o cenário pandêmico que se estabeleceu no começo de 2020 e que perdura até os dias atuais, as tratativas para início de novas obras ficaram prejudicadas, principalmente, devido à suspensão das viagens dos técnicos da Sedop, as quais são fundamentais para a caracterização da área do projeto e diagnóstico da situação atual.</p> <p>Tendo em vista este cenário, a execução física desta ação na Região Araguaia não ocorreu conforme o planejado, influenciando diretamente na não obtenção da meta programada para a região durante o ano de 2020.</p> <p>Quanto à execução financeira, embora a <i>Ação 7568. Realização de Obras de Sistema de Esgotamento Sanitário</i> tenha recebido um aporte orçamentário de R\$ 84.285,00¹ para execução de obras, os motivos acima apresentados acabaram por impedir o desempenho físico e, conseqüentemente, o desempenho financeiro desta ação na Região Araguaia, concedendo a mesma o status de <i>Abaixo do Esperado</i>.</p>

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

REGIÃO BAIXO AMAZONAS					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: BELTERRA					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2020	NÃO FOI PREVISTO CONCLUSÃO DE OBRA NESTA REGIÃO

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020					
<p>Assim como na Região Araguaia, o PPA 2016/2019 não contemplou a Região Baixo Amazonas com ação governamental para realização de obras de sistema de esgotamento sanitário.</p> <p>Sendo assim, mais uma vez a Sedop, com o intuito de corrigir esta lacuna e tendo como premissa incluir nos instrumentos de planejamento público, municípios paraenses com os menores índices de atendimento em Sistema de Esgotamento Sanitário, considerou a inclusão do município de Belterra no PPA 2020/2023 na <i>Ação 7568. Realização de Obras de Sistema de Esgotamento Sanitário</i>.</p> <p>O referido município, foi beneficiado com recursos oriundos da operação de crédito FINISA 2 para construção de sistema de esgotamento sanitário. Quanto ao desempenho físico desta ação, temos a informar que o processo pertinente a execução desta obra no município de Belterra está na fase interna da licitação. Ou seja, na etapa de elaboração do Termo de Referência, o qual fornece as principais informações quanto à definição do objeto a ser executado, para posterior elaboração do projeto básico.</p> <p>Quanto à execução financeira, embora a <i>Ação 7568. Realização de Obras de Sistema de Esgotamento Sanitário</i> tenha recebido um aporte orçamentário de R\$ 1.242.591,00¹, o cenário pandêmico que se estabeleceu no começo de 2020 e que perdura até os dias atuais, acabaram por prejudicar o ritmo adequado do processo, o qual ainda encontra-se na fase inicial. Para esta fase, exige-se da Sedop fundamentalmente recurso cognitivo, não havendo ainda dispêndios financeiros.</p> <p>Sendo assim, considerando os motivos acima apresentados, o desempenho físico e financeiro desta ação na Região Baixo Amazonas, no exercício de 2020 foi <i>Abaixo do Esperado</i>.</p>					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO -04/12/2020

REGIÃO GUAJARÁ					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: BELÉM					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2020	NÃO FOI PREVISTO CONCLUSÃO DE OBRA NESTA REGIÃO

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020					
<p>Na Região Guajará, para o ano de 2020, a Sedop programou o atender com obra de sistema de esgotamento sanitário três ilhas próximas ao município de Belém: Ilha do Combu, Ilha Murucutum e Ilha Grande.</p> <p>As obras, que serão financiadas com recursos oriundos da operação de crédito FINISA 2 encontram-se na fase interna da licitação. Ou seja, na etapa de elaboração do Termo de Referência, o qual fornece as principais informações quanto à definição do objeto a ser executado, para posterior elaboração do projeto básico.</p> <p>No entanto, com o cenário pandêmico que se estabeleceu no começo de 2020 e que perdura até os dias atuais, as tratativas para início de novas obras ficaram prejudicadas, principalmente, devido à suspensão das viagens dos técnicos da Sedop, as quais são fundamentais para a caracterização da área do projeto e diagnóstico da situação atual.</p> <p>Quanto à execução financeira, embora a <i>Ação 7568. Realização de Obras de Sistema de Esgotamento Sanitário</i> tenha recebido um aporte orçamentário de R\$ 1.019.000,00¹ para execução de obras, devido o processo encontrar-se em fase inicial, fase esta que demanda que a Sedop faça uso principalmente de recurso cognitivo, portanto, não houve dispêndios financeiros.</p> <p>Por fim, os motivos acima apresentados acabaram por impedir o avanço no desempenho físico e, conseqüentemente, no desempenho financeiro desta ação na Região Guajará, concedendo a mesma o status de <i>Abaixo do Esperado</i> no exercício de 2020.</p>					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

REGIÃO LAGO DE TUCURUÍ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: BREU BRANCO E JACUNDÁ					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2020	22.224 LIGAÇÕES

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Na Região Lago de Tucuruí, a Sedop programou a continuidade das obras de sistema de esgotamento sanitário nos Municípios de Breu Branco e Jacundá. O planejamento elaborado pela Sedop para atender esta região no decorrer do ano de 2020 incluía a conclusão das obras de esgotamento sanitário nos dois municípios, por isto a meta estabelecida para esta região foi de 22.224 ligações domiciliares.

Do número total de ligações domiciliares previstas para a Região Lago de Tucuruí, 9.036 ligações domiciliares referem-se à obra executada no município de Breu Branco e 13.188 ligações domiciliares à obra executada no município de Jacundá.

Com relação à obra em execução no município de Breu Branco, embora a Sedop tenha se empenhado para solucionar todas as pendências de ordem técnica que impedem a conclusão desta obra, o cenário pandêmico da COVID – 19 acabou por interferir nas tratativas adotadas para a finalização desta obra no ano de 2020, postergando para o ano de 2021.

Quanto à obra no município de Jacundá, apesar das interferências causadas pelo processo pandêmico em que estamos vivendo, devido a prefeitura ser o órgão responsável pela conclusão, a obra está conseguindo seguir cronograma físico elaborado e deverá ser finalizada até dezembro de 2020, atingindo cerca de 59,34% da meta firmada para a Região Lago de Tucuruí.

No que diz respeito à execução financeira, considerando que ambas as obras serão finalizadas na fonte 0101, que o valor programado de R\$ 250.000,00¹ obedece à limitação do teto orçamentário disponibilizado na fonte 0101 para Sedop e que há necessidade real e urgente para que estas obras sejam entregues a população, a Sedop ultrapassou o valor programado de modo a garantir o avanço das obras, principalmente a obra de sistema de esgotamento sanitário em execução no município de Jacundá.

Finalizando, levando em consideração o contexto apresentado para a Região Lago Tucuruí, o desempenho da *Ação 7568. Realização de obras de Sistema de Esgotamento Sanitário* no exercício de 2020 ficou *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

REGIÃO MARAJÓ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: BREVES, SALVATERRA, SOURE					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2020	22.569 LIGAÇÕES

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020					
<p>Para o ano de 2020, foi programado a execução da <i>Ação 7568. Realização de Obras de Esgotamento Sanitário</i> em três municípios da Região Marajó: Breves, Salvaterra e Soure.</p> <p>Com exceção da obra executada no município de Soure, as obras previstas nos municípios de Breves e Salvaterra foram proposições da Sedop para o PPA 2020/2023, levando em consideração os municípios com os menores índices de atendimento em sistema de esgotamento sanitário¹. Acontece que, conforme informado em outras Regiões de Integração, o cenário pandêmico que se firmou no início de 2020 e que perdura até os dias atuais, interferiram nas tratativas para início de novas obras nos municípios não apresentando a evolução física programada.</p> <p>Quanto à obra de sistema de esgotamento sanitário no município de Soure, a mesma é executada através de convênio celebrado entre o Governo do Estado do Pará e a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA. Embora a Sedop tenha estabelecido como meta concluir esta obra em 2020, a capacidade resolutiva de todas as pendências, sejam elas de ordem técnica, documental ou financeira, não está somente na governabilidade da Sedop. A obra, que está passando por processo de alteração de projeto junto ao órgão financiador, teve seu contrato rescindido e deverá ser iniciado novo processo licitatório para continuidade dos serviços.</p> <p>Com relação à execução financeira, como as obras novas não puderam ser iniciadas e na obra do município de Soure, embora o processo tenha tido andamento, não houve a evolução física esperada para o ano de 2020, do valor programado, houve apenas movimentação orçamentária no valor de R\$ 593,45² referente à realização de serviços de apoio técnico relacionados ao município de Soure.</p> <p>Neste sentido, considerando que a execução física e financeira da <i>Ação 7568. Realização de Obras de Esgotamento Sanitário</i> na Região Marajó não aconteceu conforme o programado nos instrumentos de Planejamento Público (PPA 2020/2023 e LOA 2020), conseqüentemente o desempenho físico e financeiro desta ação durante o ano de 2020 foi <i>Abaixo do Esperado</i>.</p>					

¹ FONTE: RELATÓRIO UFPA – CONVÊNIO 01/2012

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020.

REGIÃO RIO CAPIM					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: CAPITÃO POÇO					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2020	5.625 LIGAÇÕES

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

No ano de 2020, para a Região do Rio Capim, a Sedop programou a continuidade da obra de sistema de esgotamento sanitário no Município de Capitão Poço. A referida obra é executada através do contrato de repasse com Caixa Econômica Federal (PAC CEF) e, devido possuir pendências de ordem técnica e financeira que ainda não foram solucionadas, não houve avanço significativo na evolução física durante o ano de 2020 impedindo desta forma a conclusão da mesma.

Faz-se necessário esclarecer que o sistema de esgotamento sanitário de Capitão Poço sofreu reprogramação de redução de metas. Com isso, **a princípio** será executado aproximadamente 3 km de rede coletora com 70 ligações domiciliares, além do sistema de tratamento composto por quatro lagoas de maturação, calha parshall e sistema elétrico completo. **Posteriormente**, a Sedop pretende pleitear recursos para complementar o objeto com a execução restante da rede coletora e das demais ligações estabelecidas nesta ação governamental.

Esta situação contribuiu para que a *Ação 7568. Realização de Obras de Esgotamento Sanitário* tivessem o status de desempenho físico *Abaixo do Esperado*, uma vez que, atualmente a execução da obra está com o ritmo lento, tendo previsão para ser concluída no 1º semestre de 2021, não atingindo, portanto a meta estabelecida para o ano de 2020.

Quanto ao desempenho financeiro, embora esta ação tenha recebido um aporte orçamentário de R\$ 500.000,00¹ para execução da obra de Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Capitão Poço, apenas no final do segundo semestre de 2020 foram utilizados 42% do orçamento, cerca de R\$ 208.738,08², para continuidade dos serviços.

Todas as condicionantes acima relatadas acabaram por impedir que esta ação tivesse desempenho físico e financeiro de acordo com o planejado, conferindo desta forma para o ano de 2020 na Região do Rio Capim, o status de *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020.

REGIÃO TAPAJÓS					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: JACAREACANGA					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2020	NÃO FOI PREVISTO CONCLUSÃO DE OBRA NESTA REGIÃO

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020					
<p>Assim como outras regiões já identificadas, a Região de Integração Tapajós, também não foi contemplada no PPA anterior pela ação responsável por realizar obras de sistema de esgotamento sanitário.</p> <p>Conforme já explicado, a Sedop teve como premissa para o PPA 2020/2023 corrigir esta lacuna nas Regiões de Integração que não foram beneficiadas com obras de sistema de esgotamento sanitário, e isto inclui a Região Tapajós.</p> <p>Com este foco, foi feita a proposição de obra de sistema de esgotamento sanitário no município de Jacareacanga, tendo como direcionamento os municípios do Estado com os menores índices de atendimento em Sistema de Esgotamento Sanitário¹. A proposta da Sedop para o referido município durante o ano de 2020 era de que fossem realizadas as tratativas necessárias para início de novas obras. Ocorre que, com a pandemia estas tratativas foram prejudicadas, principalmente, devido à suspensão das viagens dos técnicos da Sedop, as quais são fundamentais para a caracterização da área do projeto e diagnóstico da situação atual.</p> <p>Quanto à execução financeira, embora a <i>Ação 7568. Realização de Obras de Sistema de Esgotamento Sanitário</i> tenha recebido um aporte orçamentário de R\$ 94.285,00² para execução de obras, os motivos acima apresentados acabaram por impedir o desempenho físico e, conseqüentemente, o desempenho financeiro desta ação na Região Tapajós, concedendo a mesma o status de <i>Abaixo do Esperado</i>.</p>					

¹ FONTE: RELATÓRIO UFPA – CONVÊNIO 01/2012

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

REGIÃO TOCANTINS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ACARÁ E BARCARENA					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2020	NÃO FOI PREVISTO CONCLUSÃO DE OBRA NESTA REGIÃO

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020					
<p>Assim como outras regiões já identificadas, a Região de Integração Tocantins também não foi contemplada no PPA anterior pela ação responsável por realizar obras de sistema de esgotamento sanitário.</p> <p>Conforme já explicado, a Sedop teve como premissa para o PPA 2020/2023 corrigir esta lacuna nas Regiões de Integração que não foram beneficiadas com obras de sistema de esgotamento sanitário, e isto inclui a Região Tocantins.</p> <p>Com este foco, foi feita a proposição de obra de sistema de esgotamento sanitário nos municípios de Acará e Barcarena, tendo como direcionamento os municípios da Região Tocantins com os menores índices de atendimento em Sistema de Esgotamento Sanitário. A proposta da Sedop para os referidos municípios durante o ano de 2020 era de que fossem realizadas as tratativas necessárias para início de novas obras. Ocorre que, com a pandemia estas tratativas foram prejudicadas, principalmente, devido à suspensão das viagens dos técnicos da Sedop, as quais são fundamentais para a caracterização da área do projeto e diagnóstico da situação atual.</p> <p>Quanto à execução financeira, embora a <i>Ação 7568. Realização de Obras de Sistema de Esgotamento Sanitário</i> tenha recebido um aporte orçamentário de R\$ 147.295,00¹ para execução de obras, os motivos acima apresentados acabaram por impedir o desempenho físico e, conseqüentemente, o desempenho financeiro desta ação na Região Tapajós, concedendo a mesma o status de <i>Abaixo do Esperado</i>.</p>					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

REGIÃO XINGU					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: PLACAS					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2020	1.577 LIGAÇÕES

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

A Região de Integração Xingu, também não foi contemplada no PPA 2016/2019 pela ação governamental responsável por realizar obras de sistema de esgotamento sanitário.

Conforme já explicado, a Sedop teve como premissa para o PPA 2020/2023 corrigir esta lacuna nas Regiões de Integração que não foram beneficiadas com obras de sistema de esgotamento sanitário, e isto inclui a Região Xingu.

Com este foco, foi feita a proposição de obra de sistema de esgotamento sanitário no município de Placas, tendo como direcionamento os municípios da Região Xingu com os menores índices de atendimento em Sistema de Esgotamento Sanitário. A proposta da Sedop para o referido município durante o ano de 2020 era de que fossem realizadas as tratativas necessárias para início de novas obras. Ocorre que, com a pandemia estas tratativas foram prejudicadas, principalmente, devido à suspensão das viagens dos técnicos da Sedop, as quais são fundamentais para a caracterização da área do projeto e diagnóstico da situação atual.

Quanto à execução financeira, embora a *Ação 7568. Realização de Obras de Sistema de Esgotamento Sanitário* tenha recebido um aporte orçamentário de R\$ 80.000,00¹ para execução de obras, os motivos acima apresentados acabaram por impedir o desempenho físico e, conseqüentemente, o desempenho financeiro desta ação na Região Xingu, concedendo a mesma o status de *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

4.1.3. AÇÃO 7608. CONSTRUÇÃO DE PARQUES URBANOS

REGIÃO DO GUAJARÁ					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: BELÉM					
PRODUTO	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2020	1 PARQUE

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Com o intuito de suprir a carência de espaços verdes em meio à zona urbana de Belém e de garantir ao município, além da função ecológica, espaços de convivência, lazer, urbanidade e contemplação para a população, a Sedop possui no PPA 2020/2023 a *Ação 7608. Construção de Parques Urbanos*.

A presença desta ação no PPA ratifica o compromisso da Sedop com sua missão institucional e marca a presença do Governo do Estado do Pará em potencializar o desenvolvimento urbano sustentável nos municípios paraenses.

Para Região Guajará, a Sedop irá unir forças com a SECULT na execução do “Parque da Cidade”, o qual vai proporcionar à população do município de Belém acesso a atividades esportivas, de recreação e manifestações culturais na área do Antigo Aeroclube de Belém, integradas com a natureza e primando pela interação entre diferentes perfis sociais e etários.

Ainda em 2019, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SECULT) lançou o edital “Prêmio Conceito do Parque da Cidade” e em 2020, após cumpridas todas as etapas do concurso, foi escolhido o projeto urbanístico que atendeu ao termo de referência em relação aos equipamentos públicos, a análise urbanística do entorno tem uma série de informações muito precisas e bem analisadas. A fase agora é de avanço nas tratativas do Governo do Estado com os diversos órgãos envolvidos no processo, para que no ano de 2021 seja iniciada a execução do Parque da Cidade.

Quanto à meta física acordada para esta ação, é necessário lembrar que a proposta da Sedop consiste no parque urbano implantado na vigência do PPA atual, ou seja, até o ano de 2023. Ocorre que, no momento da alimentação dos sistemas de planejamento público (SIGPLAN – MÓDULOS PPA E OGE) os mesmos não permitem a inserção do número zero no quantitativo anual, gerando a interpretação equivocada de que em cada ano do PPA haverá 1 Parque Implantado.

No caso da execução financeira, embora a *Ação 7608. Construção de Parques Urbanos* tenha recebido um aporte orçamentário de R\$ 16.866,00¹, como não houve execução física da obra, consequentemente também não houve execução financeira, conferindo ao desempenho desta ação na Região Guajará o status de *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020.

REGIÃO RIO CAETÉ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: BRAGANÇA					
PRODUTO	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2020	1 PARQUE

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020					
<p>Com o intuito de suprir a carência de espaços verdes em meio à zona urbana de Bragança e de garantir ao município, além da função ecológica, espaços de convivência, lazer, urbanidade e contemplação para a população, a Sedop possui no PPA 2020/2023 a <i>Ação 7608. Construção de Parques Urbanos</i>.</p> <p>A presença desta ação no PPA ratifica o compromisso da Sedop com sua missão institucional e marca a presença do Governo do Estado do Pará em potencializar o desenvolvimento urbano sustentável nos municípios paraenses.</p> <p>Com relação ao desempenho físico desta ação na Região Rio Caeté, para o ano de 2020, o planejamento da Sedop era de que fossem realizadas as tratativas necessárias para início da fase interna do processo licitatório, ou seja, que no exercício de 2020 o Termo de Referência, documento essencial para a elaboração do projeto básico, estivesse concluído.</p> <p>Acontece que, com a pandemia do COVID - 19 estas tratativas foram prejudicadas, principalmente, devido à suspensão das viagens dos técnicos da Sedop, as quais são fundamentais para a caracterização da área do projeto e diagnóstico da situação atual.</p> <p>Quanto à meta física acordada para esta ação, é necessário lembrar que a proposta da Sedop consiste no parque urbano implantado na vigência do PPA atual, ou seja, até o ano de 2023. Ocorre que, no momento da alimentação dos sistemas de planejamento público (SIGPLAN – MÓDULOS PPA E OGE) os mesmos não permitem a inserção do número zero no quantitativo anual, gerando a interpretação equivocada de que em cada ano do PPA haverá 1 Parque Implantado.</p> <p>No caso da execução financeira, embora a <i>Ação 7608. Construção de Parques Urbanos</i> tenha recebido um aporte orçamentário de R\$ 17.276,00¹, assim como não houve execução física pelos motivos acima apresentados, também não houve execução financeira, conferindo ao desempenho desta ação na Região Rio Caeté o status de <i>Abaixo do Esperado</i>.</p>					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020.

REGIÃO TAPAJÓS					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: ITAITUBA					
PRODUTO	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2020	1 PARQUE

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020					
<p>Com o intuito de suprir a carência de espaços verdes em meio à zona urbana de Itaituba e de garantir ao município, além da função ecológica, espaços de convivência, lazer, urbanidade e contemplação para a população, a Sedop possui no PPA 2020/2023 a Ação 7608. <i>Construção de Parques Urbanos.</i></p> <p>A presença desta ação no PPA ratifica o compromisso da Sedop com sua missão institucional e marca a presença do Governo do Estado do Pará em potencializar o desenvolvimento urbano sustentável nos municípios paraenses.</p> <p>Com relação ao desempenho físico desta ação na Região Tapajós, para o ano de 2020, o planejamento da Sedop era de que fossem realizadas as tratativas necessárias para início da fase interna do processo licitatório, ou seja, que no exercício de 2020 o Termo de Referência, documento essencial para a elaboração do projeto básico, estivesse concluído.</p> <p>Acontece que, com a pandemia da COVID - 19 estas tratativas foram prejudicadas, principalmente, devido à suspensão das viagens dos técnicos da Sedop, as quais são fundamentais para a caracterização da área do projeto e diagnóstico da situação atual.</p> <p>Quanto à meta física acordada para esta ação, é necessário lembrar que a proposta da Sedop consiste no parque urbano implantado na vigência do PPA atual, ou seja, até o ano de 2023. Ocorre que, no momento da alimentação dos sistemas de planejamento público (SIGPLAN – MÓDULOS PPA E OGE) os mesmos não permitem a inserção do número zero no quantitativo anual, gerando a interpretação equivocada de que em cada ano do PPA haverá 1 Parque Implantado.</p> <p>No caso da execução financeira, assim como não houve execução física pelos motivos acima apresentados, também não houve execução financeira, conferindo ao desempenho desta ação na Região Tapajós o status de <i>Abaixo do Esperado.</i></p>					

REGIÃO TOCANTINS					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: BARCARENA					
PRODUTO	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2020	1 PARQUE

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020					
<p>Com o intuito de suprir a carência de espaços verdes em meio à zona urbana de Barcarena e de garantir ao município, além da função ecológica, espaços de convivência, lazer, urbanidade e contemplação para a população, a Sedop possui no PPA 2020/2023 a <i>Ação. 7608. Construção de Parques Urbanos.</i></p> <p>A presença desta ação no PPA ratifica o compromisso da Sedop com sua missão institucional e marca a presença do Governo do Estado do Pará em potencializar o desenvolvimento urbano sustentável nos municípios paraenses.</p> <p>Com relação ao desempenho físico desta ação na Região Tocantins, para o ano de 2020, o planejamento da Sedop era de que fossem realizadas as tratativas necessárias para início da fase interna do processo licitatório, ou seja, que no exercício de 2020 o Termo de Referência, documento essencial para a elaboração do projeto básico, estivesse concluído.</p> <p>Acontece que, com a pandemia da COVID - 19 estas tratativas foram prejudicadas, principalmente, devido à suspensão das viagens dos técnicos da Sedop, as quais são fundamentais para a caracterização da área do projeto e diagnóstico da situação atual.</p> <p>Quanto à meta física acordada para esta ação, é necessário lembrar que a proposta da Sedop consiste no parque urbano implantado na vigência do PPA atual, ou seja, até o ano de 2023. Ocorre que, no momento da alimentação dos sistemas de planejamento público (SIGPLAN – MÓDULOS PPA E OGE) os mesmos não permitem a inserção do número zero no quantitativo anual, gerando a interpretação equivocada de que em cada ano do PPA haverá 1 Parque Implantado.</p> <p>No caso da execução financeira, embora a <i>Ação 7608. Construção de Parques Urbanos</i> tenha recebido um aporte orçamentário de R\$ 17.148,00¹, assim como não houve execução física pelos motivos acima apresentados, também não houve execução financeira, conferindo ao desempenho desta ação na Região Tocantins o status de <i>Abaixo do Esperado.</i></p>					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020.

4.1.4.AÇÃO 7644. IMPLANTAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS

REGIÃO GUAMÁ					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: CASTANHAL					
PRODUTO	ATERRO IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2020	1 ATERRO IMPLANTADO

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Com o olhar atento as questões ambientais e tendo como referência, no momento da elaboração do PPA 2020/2023, a Lei nº 12.305 de 02/08/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e estabelece em seu Art. 54 data limite para que todos os rejeitos do país tenham uma disposição final ambientalmente adequada, o Governo do Estado do Pará, reconhecendo a importância desta temática, propôs, dentre as ações governamentais que compõem o Plano Plurianual a Ação 7644. *Implantação de Aterros Sanitários*.

Esta ação é desenvolvida pela Sedop e tem como objetivo *“Subsidiar tecnicamente e financeiramente os municípios na elaboração de estudos, planos, projetos, construção de galpão de triagem e aquisição de equipamentos, visando à melhoria da coleta seletiva e destinação final dos resíduos sólidos”*.

Para o ano de 2020, na Região Guamá, a Sedop programou o desenvolvimento da Ação 7644. *Implantação de Aterros Sanitários* no município de Castanhal. Entretanto, diferente das demais Regiões de Integração que são atendidas por esta ação governamental, em que o produto obtido é 01 Aterro Implantado, para a Região Guamá o produto será 01 Aterro REGIONALIZADO Implantado.

Isto deve-se ao fato de que nesta região, no ano de 2019, os municípios de Castanhal, Inhangapi, Santa Maria do Pará, São Francisco do Pará e Santa Izabel do Pará formaram um consórcio municipal para solucionar os entraves que impedem a gestão ecologicamente correta de resíduos sólidos. Consórcio este que, além de unir os municípios em prol do mesmo objetivo (eliminar lixões a céu aberto), reduz os custos de operação e manutenção do aterro a ser implantado.

A Ação 7644. *Implantação de Aterros Sanitários*, que para o seu desenvolvimento conta com recursos provenientes da Confederação Andina de Fomento – CAF, no decorrer do ano de 2020, apresentou evolução, conforme tabela abaixo:

MUNICÍPIOS	OBRA	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
CASTANHAL, INHANGAPI, SANTA MARIA DO PARÁ, SANTA IZABEL DO PARÁ, SÃO FRANCISCO DO PARÁ	IMPLEMENTAÇÃO DE ATERRO REGIONALIZADO (Galpão de Triagem e Resíduos Sólidos)	# ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA PROCESSO LICITATÓRIO: - ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEMANETO BÁSICO E RESÍDUOS SÓLIDOS, NOS MUNICÍPIOS DE CASTANHAL, INHANGAPI, SANTA MARIA DO PARÁ, SANTA IZABEL DO PARÁ E SÃO FRANCISCO DO PARÁ; - TERMO DE REFERÊNCIA ENCAMINHADO E ANALISADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, QUANTO AO PLANO E ESTUDOS AMBIENTAIS, COM RELAÇÃO AO EARIMA, GESTÃO DE ATERROS, DENTRE OUTROS; - O PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO REGIONALIZADO A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL, ESTÁ SENDO ELABORADO PELOS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, BEM COMO EXECUÇÃO DO PROJETO DE PEQUENOS CENTROS DE TRIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE INHANGAPI, SANTA MARIA DO PARÁ, SÃO FRANCISCO DO PARÁ, SANTA IZABEL DO PARÁ;	20% DAS ATIVIDADES REALIZADAS, CONSIDERANDO A ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.

Com relação à execução financeira, como o desenvolvimento das atividades concentraram-se no apoio técnico aos municípios que integram o consórcio municipal, através de orientações para elaboração e/ou revisão de Planos Municipais de Saneamento Básico e Planos Municipais de Resíduos Sólidos e orientações quanto ao atendimento das condicionantes ambientais para obtenção das licenças necessárias para construção e implementação do Aterro Sanitário Regionalizado e do Galpão de Triagem nos municípios consorciados, dentre outras, do valor programado de R\$ 4.862.888,00² para atender a Região Guamá durante o ano de 2020, foram utilizados R\$ 1.353,96³ referentes a diárias e deslocamentos dos técnicos aos municípios. Ressaltamos que, o início da obra se dará após a conclusão das todas estas etapas e, fundamentalmente, após a conclusão do Termo de Referência.

Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7644. Implantação de Aterros Sanitários* na Região Guamá no exercício de 2020 foi *Abaixo do Esperado*.

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020.

³ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020.

REGIÃO RIO CAPIM					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: RONDON DO PARÁ					
PRODUTO	ATERRO IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2020	1 ATERRO IMPLANTADO

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Com o olhar atento as questões ambientais e tendo como referência, no momento da elaboração do PPA 2020/2023, a Lei nº 12.305 de 02/08/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e estabelece em seu Art. 54 data limite para que todos os rejeitos do país tenham uma disposição final ambientalmente adequada, o Governo do Estado do Pará, reconhecendo a importância desta temática, propôs, dentre as ações governamentais que compõem o Plano Plurianual a *Ação 7644. Implantação de Aterros Sanitários*.

Esta ação é desenvolvida pela Sedop e tem como objetivo *“Subsidiar tecnicamente e financeiramente os municípios na elaboração de estudos, planos, projetos, construção de galpão de triagem e aquisição de equipamentos, visando à melhoria da coleta seletiva e destinação final dos resíduos sólidos”*.

Para o ano de 2020, na Região Rio Capim, a Sedop programou o desenvolvimento da *Ação 7644. Implantação de Aterros Sanitários* no município de Rondon do Pará. A referida ação conta com recursos provenientes da Confederação Andina de Fomento – CAF e no decorrer do ano de 2020, apresentou evolução, conforme tabela abaixo:

MUNICÍPIO	OBRA	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
RONDON DO PARÁ	IMPLEMENTAÇÃO DE ATERRO REGIONALIZADO (Galpão de Triagem e Resíduos Sólidos)	# ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA PROCESSO LICITATÓRIO: - PROJETO EXECUTIVO E ARQUITETÔNICO DISTRIBUÍDO EM 40 PRANCHAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, BEM COMO OS CADERNOS DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AMBIENTAIS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO; - AS PEÇAS TÉCNICAS, APROVADAS PELO ÓRGÃO FINANCIADOR EM 10 DE AGOSTO DE 2020, FORAM ENCAMINHADAS COM OS AJUSTES PREVISTOS NECESSÁRIOS À COORDENADORIA DE LICITAÇÃO (CPL);	100% DAS PEÇAS TÉCNICAS CONCLUÍDAS E APROVADAS PELO ÓRGÃO FINANCIADOR.

Com relação à execução financeira, como o desenvolvimento das atividades concentraram-se no apoio técnico ao município de Rondon do Pará, através de orientações para elaboração e/ou revisão de Planos Municipais de Saneamento Básico e Planos Municipais de Resíduos Sólidos e orientações quanto ao atendimento das condicionantes ambientais para obtenção das licenças necessárias para construção e implementação do Aterro Sanitário e do Galpão de Triagem, dentre outras, do valor programado de R\$ 4.721.378,00² para atender a Região Rio Capim durante o ano de 2020, foram utilizados R\$ 1.186,90³ referentes a diárias e deslocamentos dos técnicos ao município.

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020.

³ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020.

Ressaltamos que, o início da obra se dará após a conclusão do processo licitatório, o qual obedecerá aos prazos e etapas necessárias para licitação de modalidade internacional em consonância com o previsto na lei 8666/93. Dito isso, provavelmente a execução da obra de aterro sanitário no município de Rondon do Pará, será iniciada em 2021.

Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7644. Implantação de Aterros Sanitários* na Região Rio Capim no exercício de 2020 foi *Abaixo do Esperado*.

REGIÃO TAPAJÓS					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: ITAITUBA					
PRODUTO	ATERRO IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2020	1 ATERRO IMPLANTADO

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Com o olhar atento as questões ambientais e tendo como referência, no momento da elaboração do PPA 2020/2023, a Lei nº 12.305 de 02/08/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e estabelece em seu Art. 54 data limite para que todos os rejeitos do país tenham uma disposição final ambientalmente adequada, o Governo do Estado do Pará, reconhecendo a importância desta temática, propôs, dentre as ações governamentais que compõem o Plano Plurianual a *Ação 7644. Implantação de Aterros Sanitários*.

Esta ação é desenvolvida pela Sedop e tem como objetivo *“Subsidiar tecnicamente e financeiramente os municípios na elaboração de estudos, planos, projetos, construção de galpão de triagem e aquisição de equipamentos, visando à melhoria da coleta seletiva e destinação final dos resíduos sólidos”*.

Para o ano de 2020, na Região Tapajós, a Sedop programou o desenvolvimento da *Ação 7644. Implantação de Aterros Sanitários* no município de Itaituba. A referida ação conta com recursos provenientes da Confederação Andina de Fomento – CAF e no decorrer do ano de 2020, apresentou evolução, conforme tabela abaixo:

MUNICÍPIO	OBRA	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
ITAITUBA	IMPLEMENTAÇÃO DE ATERRO REGIONALIZADO (Galpão de Triagem e Resíduos Sólidos)	# ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA PROCESSO LICITATÓRIO: - PROJETO EXECUTIVO E ARQUITETÔNICO DISTRIBUÍDO EM 40 PRANCHAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, BEM COMO OS CADERNOS DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AMBIENTAIS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO; - AS PEÇAS TÉCNICAS, APROVADAS PELO ÓRGÃO FINANCIADOR EM 10 DE AGOSTO DE 2020, FORAM ENCAMINHADAS COM OS AJUSTES PREVISTOS NECESSÁRIOS À COORDENADORIA DE LICITAÇÃO (CPL);	20% DAS PEÇAS TÉCNICAS CONCLUÍDAS E APROVADAS PELO ÓRGÃO FINANCIADOR.

Com relação à execução financeira, como o desenvolvimento das atividades concentraram-se no apoio técnico ao município de Itaituba, através de orientações para elaboração e/ou revisão de Planos Municipais de Saneamento Básico e Planos Municipais de Resíduos Sólidos e orientações quanto ao atendimento das condicionantes ambientais para obtenção das licenças necessárias para construção e implementação do Aterro Sanitário e do Galpão de Triagem, as mesmas foram realizadas através das mídias disponíveis, não gerando dispêndios financeiros.

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

Ressaltamos que, o início da obra se dará após a conclusão do processo licitatório, o qual obedecerá aos prazos e etapas necessárias para licitação de modalidade internacional em consonância com o previsto na lei 8666/93. Dito isso, provavelmente a execução da obra de aterro sanitário no município de Rondon do Pará, será iniciada em 2021.

Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7644. Implantação de Aterros Sanitários* na Região Tapajós no exercício de 2020 foi *Abaixo do Esperado*.

REGIÃO XINGU					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: BRASIL NOVO					
PRODUTO	ATERRO IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2020	1 ATERRO IMPLANTADO

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Com o olhar atento as questões ambientais e tendo como referência, no momento da elaboração do PPA 2020/2023, a Lei nº 12.305 de 02/08/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e estabelece em seu Art. 54 data limite para que todos os rejeitos do país tenham uma disposição final ambientalmente adequada, o Governo do Estado do Pará, reconhecendo a importância desta temática, propôs, dentre as ações governamentais que compõem o Plano Plurianual a *Ação 7644. Implantação de Aterros Sanitários*.

Esta ação é desenvolvida pela Sedop e tem como objetivo *“Subsidiar tecnicamente e financeiramente os municípios na elaboração de estudos, planos, projetos, construção de galpão de triagem e aquisição de equipamentos, visando à melhoria da coleta seletiva e destinação final dos resíduos sólidos”*.

Para o ano de 2020, na Região Xingu, a Sedop programou o desenvolvimento da *Ação 7644. Implantação de Aterros Sanitários* no município de Brasil Novo. A referida ação conta com recursos provenientes da Confederação Andina de Fomento – CAF e no decorrer do ano de 2020, apresentou evolução, conforme tabela abaixo:

MUNICÍPIO	OBRA	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
BRASIL NOVO	IMPLEMENTAÇÃO DE ATERRO REGIONALIZADO (Galpão de Triagem e Resíduos Sólidos)	- PROCESSO LICITATÓRIO FINALIZADO. A CONSTRUÇÃO DO GALPÃO INICIOU EM MARÇO DE 2020 OBEDECENDO AO CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO PROGRAMADO, ENTRETANTO, POR CONTA DO PERÍODO PANDÊMICO, A EMPRESA PRECISOU DIMINUIR O RITMO DA OBRA; - PEÇAS TÉCNICAS DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL IMPLANTADO PELA PREFEITURA, EM FASE DE ELABORAÇÃO. OBS: A revitalização prevista visa atender demanda do órgão financiador – CAF e contará com os seguintes serviços: limpeza do terreno, limpeza e manutenção das células implantadas, revitalização do complexo administrativo existente, troca da parte elétrica e hidráulica. Esta ação deverá acontecer paralelamente à obra do Galpão de Triagem finalizando juntamente com o galpão.	70% DA OBRA EXECUTADA.

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

Com relação à movimentação financeira, embora a ação tenha recebido um aporte orçamentário de R\$ 4.793.041,00¹, o empenho referente ao pagamento dos Boletins de Medição (BM) da obra em execução no município de Brasil Novo, foi realizado equivocadamente na *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico*, como já mencionado na análise do desempenho da referida ação. Identificado este equívoco, a Sedop, se compromete em não mais cometer esta falha na execução orçamentária para no ano de 2021.

Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7644. Implantação de Aterros Sanitários na Região Xingu* no exercício de 2020 foi *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020.

4.1.5.AÇÃO 7645. PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS

REGIÃO ARAGUAIA					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ÁGUA AZUL DO NORTE, BANNACH, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, CUMARÚ DO NORTE, FLORESTA DO ARAGUAIA, OURILÂNDIA DO NORTE, PAU D'ARCO, REDENÇÃO, RIO MARIA, SANTA MARIA DAS BARREIRAS, SANTANA DO ARAGUAIA, SÃO FÉLIX DO XINGU, SAPUCAIA, TUCUMÃ E XINGUARA.					
PRODUTO	VIA PAVIMENTADA	UNIDADE	KM	META 2020	56 KM

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020
<p>Com orçamento de R\$ 7.434.025,00¹ previsto para desenvolver a <i>Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas</i> na Região Araguaia durante o ano de 2020, a Sedop programou atender os seguintes Municípios: Água Azul do Norte, Conceição do Araguaia, Floresta do Araguaia, Redenção, Rio Maria, Santa Maria das barreiras, Santana do Araguaia, Tucumã e Xinguara.</p> <p>Em <i>Água Azul do Norte</i>, em 2020, a Sedop realizou visita técnica para implementação desta ação. No município de Conceição do Araguaia, a obra encontra-se em fase de conclusão, com percentual físico em 99% e 5 km de vias pavimentadas.</p> <p>No município de <i>Cumarú do Norte</i>, a execução dos serviços de drenagem e pavimentação asfáltica de vias urbanas foram concluídas com 3 km de vias pavimentadas. Em <i>Redenção</i> o percentual físico da obra se encontra em 99,77% com total de 5 km executados. A obra de pavimentação em <i>Santa Maria das Barreiras</i> segue em execução, com 3 km executados, o que corresponde a 92,39% do total.</p> <p>A execução dos serviços de drenagem e pavimentação asfáltica de vias urbanas no município de <i>Santana do Araguaia</i> está avançando como previsto no PPA e já se encontra com 2,39 km executados e o percentual físico em 79,51%. Em <i>Tucumã</i> a obra também evolui conforme previsto, com 1,29 km executados. Em <i>Rio Maria</i>, duas obras estão em execução: a obra de pavimentação asfáltica em CBUQ de ruas e avenidas nos setores Planalto, Vila Nova e Remor, através de convênio de repasse com a prefeitura do município, com percentual físico em 32,19% e 1 km executado e a obra de pavimentação executada com recursos oriundos do FINISA II, com percentual físico de 86,50% e 3,00 km executados.</p> <p>Com relação ao desempenho físico, no ano de 2020 foram concluídos 23,68 km de pavimentação na Região do Araguaia, o que corresponde a 42,28% do total de 56 km programados para a região no ano de 2020. Quanto à execução financeira, o valor orçado inicialmente foi atualizado em R\$ 23.218.974,87 para atender a região com execução de obras de pavimentação. Esta divergência <i>orçamento planejado X orçamento executado</i>, deve-se, em grande parte, devido o valor estabelecido no teto orçamentário disponibilizado para Sedop ser insuficiente para o atendimento real do número de obras executadas através desta ação.</p>

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO -04/12/2020

Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7536. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* na Região Araguaia, encerra o exercício de 2020 com status de *Merece Atenção*.

REGIÃO BAIXO AMAZONAS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ALENQUER, ALMEIRIM, BELTERRA, CURUÁ, FARO, JURUTI, MOJUI DOS CAMPOS, MONTE ALEGRE, ÓBIDOS, ORIXIMINÁ, PRAINHA, SANTARÉM, TERRA SANTA					
PRODUTO	VIA PAVIMENTADA	UNIDADE	KM	META 2020	50 KM

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020
<p>Com orçamento de R\$ 9.957.705,00¹ previsto para desenvolver a <i>Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas</i> na Região Baixo Amazonas durante o ano de 2020, a Sedop programou atender os seguintes Municípios: Alenquer, Almeirim, Faro, Oriximiná, Monte Alegre, Santarém, Terra Santa e Prainha.</p> <p>Em <i>Santarém</i> e <i>Terra Santa</i>, durante o ano de 2020, a Sedop realizou visita técnica para implementação desta ação. Em <i>Almeirim</i> a obra de Execução dos Serviços de Drenagem e Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas está em andamento, com percentual físico em 40,39% e 1,21 km executados. No município de <i>Alenquer</i> a obra está em execução, com percentual físico em 98,59% e 2,96 km executados e previsão de conclusão para 1º semestre de 2021.</p> <p>No município de <i>Faro</i>, a obra de pavimentação consta com 1 km executado, com percentual de execução física equivalente a 24,19%. A execução dos serviços de drenagem e pavimentação asfáltica de vias urbanas no município de <i>Oriximiná</i> também segue em andamento, com 2,52 km executados e com o percentual físico em 84,16%. Em <i>Monte Alegre</i> a obra já apresenta 5,49 km executados dos 7km programados para o município, o que corresponde a 78,43% do total e em <i>Prainha</i> a obra de Execução dos Serviços de Drenagem e Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas segue em andamento, com 1,19 km executados que representa 39,50% de percentual físico.</p> <p>Com relação ao desempenho físico, no ano de 2020 foram concluídos 14,37 km de pavimentação na região do Baixo Amazonas. Quanto à execução financeira, houve a necessidade de atualizar a dotação inicial em cerca de R\$ 9.616.294,16 além do orçamento planejado. A diferença entre o valor previsto e executado se justifica com a necessidade da região que ultrapassa o que foi previamente estabelecido como meta financeira.</p> <p>Finalizando, a Sedop considera que esta ação na região de integração Baixo Amazonas se encontra <i>Abaixo do Esperado</i>, uma vez que evidenciamos um percentual abaixo de 50% de execução dos serviços contratados.</p>

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020.

REGIÃO CARAJÁS

MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: BOM JESUS DO TOCANTINS, BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, CANÃA DOS CARAJÁS, CURIONÓPOLIS, ELDORADO DOS CARAJÁS, MARABÁ, PALESTINA DO PARÁ, PIÇARRA, SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, SÃO JOÃO DO ARAGUAIA.

PRODUTO	VIA PAVIMENTADA	UNIDADE	KM	META 2020	45 KM
----------------	-----------------	----------------	----	------------------	-------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

A Sedop executou obras voltadas para a mobilidade e acessibilidade nas áreas urbanas da Região Carajás, no ano de 2020, através do melhoramento do sistema viário dos seguintes municípios:

Em *Bom Jesus do Tocantins* a obra encontra-se em processo de conclusão, com 3 km de vias pavimentadas de acordo com o previsto para o município. No Município de *Marabá* a obra está em execução, com percentual físico em 65,74% e com 8,55 km concluídos dos 10 km programados e em *Curionópolis* foram concluídos os 5 km programados.

A execução dos serviços de drenagem e pavimentação asfáltica de vias urbanas no município de *Parauapebas* também está em fase de conclusão, com os 10 km previstos já executados. Em *Piçarra* constam 91,84% o andamento da obra, com 3 km executados. No município de *São Geraldo do Araguaia* a obra de drenagem e pavimentação encontra-se em conclusão, com 3 km executados.

Ressaltamos que esta região de integração faz parte da área de atuação da Companhia Vale do Rio Doce, sendo, portanto, atendida com recursos provenientes do Fundo Para o desenvolvimento Regional com Recursos da Desestatização (FRD2) do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) para execução de obras de pavimentação e drenagem. Os municípios contemplados por este recurso são: Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Canãa dos Carajás. Curionópolis, Eldorado dos Carajás, São Domingos do Araguaia e São João do Araguaia.

Entretanto, com a exceção de Curionópolis e São Domingos do Araguaia que seguem a obra de acordo com o cronograma físico, as obras dos demais municípios não puderam avançar, ou devido à morosidade dos municípios no atendimento das pendências de ordem técnica e documental identificadas seja pela Sedop, seja pelo BNDES, ou, principalmente, devido a suspensão da aprovação e liberação de novos projetos pelo BNDES no primeiro semestre de 2020.

Mesmo diante deste contexto, considerando todos os serviços de pavimentação executados no decorrer do ano de 2020, foram executados na Região Carajás 32,55 km de pavimentação em vias urbanas, atingindo cerca de 72,33 % da meta estabelecida.

Quanto ao orçamento, foi previsto para a região no ano de 2020 o valor de R\$10.054.611,00¹, valor este abaixo do necessário para atender as demandas das obras de pavimentação, exigindo, portanto, atualização da dotação orçamentária inicial para o valor de R\$29.494.414,16².

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO - 04/12/2020

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO - 04/12/2020

Concluindo, a Sedop enfatiza que no ano de 2020 a *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas*, embora as obras tenham tido evolução física acima da média, estando em fase de finalização, a não obtenção do produto, faz com que o desempenho da ação na Região Carajás encerre o ano de 2020 com o status de *Merece Atenção*.

REGIÃO GUAJARÁ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ANANINDEUA, BELÉM, BENEVIDES, MARITUBA, SANTA BÁRBARA DO PARÁ.					
PRODUTO	VIA PAVIMENTADA	UNIDADE	KM	META 2020	70 KM

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020
<p>A Sedop assumiu o compromisso de ampliar em 70 km a mobilidade e acessibilidade na Região Guajará no ano de 2020. Os municípios contemplados nesta ação foram: Ananindeua, Benevides, Belém e Marituba e Santa Bárbara do Pará, com orçamento previsto para o ano de 2020 no valor de R\$ 11.162.137,00¹.</p> <p>No município de <i>Ananindeua</i>, houve execução 10 obras de drenagem e pavimentação de vias urbanas: 01 obra executada com recursos oriundos da fonte de financiamento FINISA 2 – CEF foram executados 7,00 km, do total de 10 km programados e 09 obras de pavimentação de vias urbanas executadas com recursos oriundo da fonte 0101 (Tesouro Próprio), foram iniciadas.</p> <p>No município de <i>Belém</i>, a ação contempla os seguintes bairros: Guamá, Terra Firme, além do distrito de Icoaraci. No Guamá a obra está com 1,00 km executados e com percentual físico em 60,04%; O bairro Terra Firme deve receber quase 1 km de asfalto novo, beneficiando moradores de pelo menos três ruas.</p> <p>No <i>distrito de Icoaraci</i> as obras irão contemplar ruas que nunca haviam sido pavimentadas, como a Rua Dias da Fonseca, no bairro Parque Guajará². A ação avança conforme programado, com término previsto para fevereiro de 2021.</p> <p>Em <i>Marituba</i>, a obra de Drenagem e Pavimentação asfáltica de Vias Urbanas segue em execução, com 2,73 km executados e com percentual físico em 27,27%. No município de <i>Santa Bárbara do Pará</i> a obra tem 2 km executados e 53,23% de percentual físico e no município de <i>Benevides</i> a obra está em execução com 91,07% de percentual físico e com 4,55 km executados.</p> <p>Com relação à execução financeira nesta região, houve necessidade de atualizar a dotação orçamentária inicial majorando em R\$ 20.300.866,63. Esta atualização foi necessária, principalmente, devido a grande demanda de serviços relacionados à execução obras de pavimentação que a Sedop recebe, cuja dotação inicial era insuficiente para o perfeito atendimento dos pleitos.</p> <p>Para finalizar, a Sedop enfatiza que no ano de 2020 a <i>Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas</i> teve o desempenho abaixo do programado, alcançando 72,78% da meta física estabelecida para a Região Guajará, com cerca de 50,95 km de vias urbanas pavimentadas no exercício de 2020.</p>

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020.

² Fonte: <https://www.Sedop.pa.gov.br/noticias/governo-acompanha-obras-do-programa-asfalto-por-todo-o-par%C3%A1-em-bel%C3%A9m-e-icoaraci>

REGIÃO DO GUAMÁ

MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: CASTANHAL, COLARES, CURUÇA, IGARAPÉ-AÇÚ, INHANGAPI, MAGALHÃES BARATA, MARACANÃ, MARAPANIM, SANTA IZABEL DO PARÁ, SANTA MARIA DO PARÁ, SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ, SÃO CAETANO DE ODIVELAS, SÃO DOMINGOS DO CAPIM, SÃO FRANCISCO DO PARÁ, SÃO JOÃO DA PONTA, SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, TERRA ALTA, VIGIA.

PRODUTO	VIA PAVIMENTADA	UNIDADE	KM	META 2020	45 KM
----------------	-----------------	----------------	----	------------------	-------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Com orçamento de R\$6.902.380,00¹, a *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* teve como meta prevista para a Região Guamá, a ampliação em 45 km de pavimentação no decorrer do ano de 2020. O atendimento aos municípios contemplados por esta ação ocorreu da seguinte forma:

Em *Castanhãl*, foram executados serviços relacionados às seguintes obras: Obra de drenagem, pavimentação, urbanização e iluminação pública da Avenida Brasil foram realizados 3 km de vias pavimentadas, somando 61,76% de percentual físico e Execução de Drenagem e Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas com realização de 3,54 km de vias pavimentadas e percentual de execução física em 35,44%.

No município de *Curuçá* a obra de drenagem e pavimentação asfáltica de vias urbanas tem 83,20% de percentual físico e 4,16 km de vias pavimentadas.

Em *Magalhães Barata*, além de visitas técnicas para a fiscalização e acompanhamento da ação, 3 km de vias urbanas foram pavimentadas, equivalente a 94,56% do total da obra. No município de *Marapanim* mais de 80% da obra de drenagem e pavimentação asfáltica já foi realizada, com 2,42 km pavimentados.

A obra no município de *Santa Maria do Pará* foi concluída com 3 km de vias pavimentadas entregues a população, contribuindo com a mobilidade, acessibilidade e aumentando a qualidade de vida dos moradores e trabalhadores locais.

Em *Santo Antônio do Tauá* 20,62% da obra já foi executada com 2,92 km de via pavimentada. No município de *São Domingos do Capim* as obras seguem em execução, com 2,09 km de vias urbanas foram pavimentadas, em relação ao desempenho físico, a obra já se encontra com 69,79%.

Em *São Francisco do Pará*, os 3 km previstos como meta já foram concluídos, proporcionando mais acessibilidade aos moradores e trabalhadores. A obra de drenagem, pavimentação, urbanização em *Terra Alta* está em fase de finalização, com 96,87% da obra concluída e 3 km de asfalto nas ruas do município.

Em *Vigia* a obra possui 1 km executado, o que corresponde a 28,61% de percentual físico, conforme informação da firma executora, a obra será concluída em fevereiro de 2021, portanto segue como previsto.

Com relação à execução financeira, houve necessidade de atualizar a dotação orçamentária inicial majorando em R\$ 36.626.689,89. Esta atualização foi necessária, principalmente, devido a grande demanda de serviços relacionados à execução obras de

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

pavimentação que a Sedop recebe, cuja dotação inicial era insuficiente para o perfeito atendimento dos pleitos.

Por fim, a Sedop destaca que no ano de 2020, na Região Guamá, a *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas*, teve um desempenho mediano (*Merece Atenção*) em relação ao programado, uma vez que, evidenciamos um percentual abaixo de 50% de execução dos serviços contratados.

REGIÃO DO LAGO DE TUCURUÍ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: BREU BRANCO, GOIANÉSIA DO PARÁ, ITUPIRANGA, JACUNDÁ, NOVA IPIXUNA, NOVO REPARTIMENTO, TUCURUÍ.					
PRODUTO	VIA PAVIMENTADA	UNIDADE	KM	META 2020	38 KM

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020
<p>A Sedop assumiu o compromisso no ano de 2020 de ampliar em 38 km a mobilidade e acessibilidade nas áreas urbanas dos seguintes municípios da Região Lago de Tucuruí: Breu Branco, Goianésia Do Pará, Itupiranga, Jacundá, Nova Ipixuna, Novo Repartimento e Tucuruí.</p> <p>A obra de pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ na Avenida Galetti, no município de <i>Breu Branco</i>, que é financiada com recursos da OGE, está em execução, e neste ano de 2020, a mesma atingiu um percentual de execução físico de 81% e financeiro em torno de 70%. Sua conclusão vai proporcionar melhoria de trafegabilidade, urbanização de via e melhores condições humanísticas para aproximadamente 1.250 pessoas beneficiadas.</p> <p>Em <i>Goianésia do Pará</i> a execução dos serviços de drenagem e pavimentação asfáltica de vias urbanas foi concluída com 3 km de vias pavimentadas, beneficiando moradores e trabalhadores do município. Em <i>Itupiranga</i>, a obra foi concluída dentro do prazo contratual e 5 km de vias pavimentadas foram entregues à população. No município de <i>Jacundá</i>, a obra segue como programada, com percentual físico de 89,67% e 1,79 km executados.</p> <p>A execução dos serviços de drenagem e pavimentação asfáltica de vias urbanas em <i>Nova Ipixuna</i> está em fase de conclusão, com percentual físico em 99,45% e 3 km de vias pavimentadas. Em <i>Novo Repartimento</i> a obra está concluída com 3 km de vias pavimentadas entregues à população.</p> <p>A obra de drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica de vias públicas em TST, nos bairros Popular e Serra Azul, no município de <i>Tucuruí</i>, que é financiada com recursos da OGE, está em execução, e neste ano de 2020, a mesma atingiu um percentual de execução físico em torno de 95,89% e financeiro em torno de 100,00%. Sua conclusão vai proporcionar melhoria de trafegabilidade, urbanização de via e melhores condições humanísticas para aproximadamente 3.600,00 pessoas beneficiadas. Outra obra de pavimentação e drenagem em execução no município de Tucuruí é financiada com recurso do FINISA 2 – CEF e já consta com 4,61 km de vias pavimentadas.</p> <p>No que diz respeito à execução financeira, houve necessidade de atualizar a dotação orçamentária inicial majorando em R\$ 29,825.522,31. Esta atualização foi necessária, principalmente, devido a grande demanda de serviços relacionados à execução obras de pavimentação que a Sedop recebe, cuja dotação inicial era insuficiente para o perfeito atendimento dos pleitos.</p> <p>Finalizando, a Sedop destaca que no ano de 2020, na Região Lago de Tucuruí, a <i>Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas</i>, teve um desempenho mediano (<i>Merece Atenção</i>) em relação ao programado, uma vez que atingiu cerca de 62,76% da meta estipulada para a região.</p>

REGIÃO MARAJÓ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: BAGRE, BREVES, CACHOEIRA DO ARARI, CHAVES, CURRALINHO, MELGAÇO, MUANÁ, PONTA DE PEDRAS, PORTEL, SALVATERRA, SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, SOURE.					
PRODUTO	VIA PAVIMENTADA	UNIDADE	KM	META 2020	33 KM

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020					
<p>Com orçamento de R\$ 4.739.420,00¹, durante o ano de 2020, a Sedop desenvolveu a <i>Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas</i> na Região Marajó, nos seguintes municípios:</p> <p>No município de <i>Bagre</i>, a obra de drenagem e pavimentação asfáltica de vias urbanas está com 46,25% e 1,39 km de vias pavimentadas.</p> <p>Em <i>Breves</i> foram realizadas visitas técnicas para implementação do programa Asfalto por Todo Pará. Em <i>Cachoeira do Arari</i> a obra se encontra em fase de finalização com 3 km de vias pavimentadas, beneficiando moradores e trabalhadores da região.</p> <p>A obra de pavimentação no município de <i>Curralinho</i> alcançou um percentual de execução física de 87,74% com 2,63 km de pavimentação executados. No município de <i>Muaná</i> a obra segue em execução com percentual de 62,28% e 1,87 km de vias pavimentadas.</p> <p>No município de <i>Ponta de Pedras</i> a evolução foi de 90,61% com 2,72 km executados. Em <i>Portel</i> foram executados 2,90 km de vias e no município de <i>Salvaterra</i> 2,11 km. A obra de em execução no município de <i>Soure</i> teve um percentual de execução física de 80,60% com 2,42 km executados.</p> <p>Quanto ao desempenho físico da <i>Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas</i> na Região Marajó, considerando a difícil logística para execução de obras de pavimentação na região, tanto no que diz respeito à mobilização de pessoal, quanto para equipamentos e maquinários e considerando o cenário pandêmico da COVID - 19 que se estabeleceu no ano de 2020, o quantitativo de 18,04 km de vias pavimentadas em 2020, o que representa 54,66% de alcance da meta estabelecida para a Região Marajó, confere um bom desempenho físico a esta ação em meio a todas as adversidades.</p> <p>Em relação ao desempenho financeiro houve necessidade de atualizar a dotação orçamentária inicial majorando em R\$ 22.381.200,33. Esta atualização foi necessária, principalmente, devido a grande demanda de serviços relacionados à execução obras de pavimentação que a Sedop recebe, cuja dotação inicial era insuficiente para o perfeito atendimento dos pleitos.</p>					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO - 04/12/2020

REGIÃO RIO CAETÉ

MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: AUGUSTO CORRÊA, BONITO, BRAGANÇA, CACHOEIRA DO PIRIÁ, CAPANEMA, NOVA TIMBOTEUA, PEIXE-BOI, PRIMAVERA, QUATIPURU, SALINÓPOLIS, SANTA LUZIA DO PARÁ, SANTARÉM NOVO, SÃO JOÃO DE PIRABAS, TRAQUATEUA, VISEU.

PRODUTO	VIA PAVIMENTADA	UNIDADE	KM	META 2020	55 KM
----------------	-----------------	----------------	----	------------------	-------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Com orçamento de R\$ 7.811.657,00¹, durante o ano de 2020, a Sedop desenvolveu a *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbana* na Região Rio Caeté, nos seguintes municípios:

Em *Bonito* a obra drenagem e pavimentação asfáltica de vias urbanas, segue em execução, com percentual físico em 74,15% e 2,22 km concluídos.

No município de *Bragança*, 3,51 km dos 10 km previstos já foram executados, somando 35,13% no percentual físico da obra. Em *Cachoeira do Piriá* a obra está com percentual físico de execução de 71,75% e com 2,15 km de pavimentação executados.

A obra de serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ, de 7,64 km de vias e ruas, no município de *Capanema*, que é financiada com recursos da OGE, no ano de 2019 passou por uma reprogramação, chegando a executar cerca de 3,875 km de pavimentação, teve sua conclusão atingida ainda no ano de 2020, com execução física de 100,00% e financeiro de 100,00%, proporcionando melhoria de trafegabilidade, urbanização de via e melhores condições humanísticas, beneficiando mais de 8.100 pessoas.

No município de *Nova Timboteua* já foram pavimentados 2,03 km de vias urbanas e no município de *Primavera*, a obra segue em execução com percentual de 68,51% e 2,06 km executados.

Em *Santa Luzia*, a obra já consta com percentual de execução física de 81,45% e 2,44 km de vias pavimentadas. No município de *Viseu* a obra iniciada em novembro está com percentual de execução física de 25,26% e com 1,26 km executados.

Os municípios de Augusto Corrêa, Peixe-Boi, Quatipuru, Salinópolis, Santarém Novo, São João de Pirabas e Traquateua receberam visita técnica para iniciar a ação.

Quanto ao desempenho físico da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* na Região Rio Caeté, foram executados o quantitativo de 23,32 km de vias pavimentadas no decorrer do ano de 2020, o que representa 42,40% de alcance da meta estabelecida para a região, não atingindo, portanto, a meta estipulada.

Em relação ao desempenho financeiro houve necessidade de atualizar a dotação orçamentária inicial majorando em R\$ 6.432.715,96. Esta atualização foi necessária, principalmente, devido a grande demanda de serviços relacionados à execução obras de pavimentação que a Sedop recebe, cuja dotação inicial era insuficiente para o perfeito atendimento dos pleitos.

Finalizando, a Sedop destaca que no ano de 2020, na Região Rio Caeté, a *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas*, teve um desempenho mediano (*Merece Atenção*) em relação ao programado.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020.

REGIÃO RIO CAPIM					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ABEL FIGUEIREDO, AURORA DO PARÁ, BUJARU, CAPITÃO POÇO, CONCÓRDIA DO PARÁ, DOM ELISEU, GARRAFÃO DO NORTE, IPIXUNA DO PARÁ, IRITUIA, MÃE DO RIO, NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, OURÉM, PARAGOMINAS, RONDON DO PARÁ, TOMÉ-AÇÚ, ULIANÓPOLIS.					
PRODUTO	VIA PAVIMENTADA	UNIDADE	KM	META 2020	42 KM

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020					
<p>Com orçamento de R\$ 8.310.747,00¹, durante o ano de 2020, a Sedop desenvolveu a <i>Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbana</i> na Região Rio Capim, nos municípios relatados a seguir:</p> <p>Os municípios desta região que foram contemplados com recurso oriundo do FINISA 2 – CEF para executarem obras de pavimentação e drenagem de vias urbanas, apresentaram a seguinte evolução no quantitativo de quilômetros de vias pavimentadas: <i>Aurora do Pará</i> 2,87 km; <i>Bujaru</i> 2,53 km; <i>Capitão Poço</i> 7,40 km; <i>Concórdia do Pará</i> 2,61 km; <i>Dom Eliseu</i> 2,44 km; <i>Ipixuna do Pará</i> 2,90 km; <i>Irituia</i> 2,96 km; <i>Mãe do Rio</i> 5,33 km; <i>Nova Esperança do Piriá</i> 2,67 km; <i>Tomé Açú</i> 2,71 km; <i>Tomé Açú (Quatro Bocas)</i> 2,74 km; <i>Ulianópolis</i> 3,00 km.</p> <p>Outra obra no município de <i>Dom Eliseu</i> é a pavimentação de vias urbanas nos trechos das Ruas Marechal Deodoro da Fonseca, Antônio Batista e Emanuel Augusto Miguel, com total de 1.052,58 m², que é financiada com recursos da OGE. Em 2020, a obra seguiu conforme programado e alcançou um percentual de execução físico em torno de 79,81% e financeiro em torno de 51,30%.</p> <p>A obra de pavimentação asfáltica no residencial Cunha, no município de <i>Ipixuna do Pará</i>, que é financiada com recursos da OGE, neste ano de 2020, evidenciamos um ritmo lento de execução, conseguindo apenas alcançar um percentual de execução físico em torno de 39,00% e financeiro em torno de 30,00%.</p> <p>A obra de pavimentação e drenagem de 5.909,95 m de ruas, no município de <i>Paragominas</i>, que é financiada com recursos da OGE, neste ano de 2020, segue conforme programado e alcançou um percentual de execução físico em torno de 70,83% e financeiro em torno de 65,00%, iniciando a etapa de pavimentação.</p> <p>A obra de Implantação e pavimentação asfáltica nas Vilas Marapanim e Livramento, no município de <i>Garrafão do Norte</i>, que é financiada com recursos da OGE, neste ano de 2020, segue conforme programado e alcançou um percentual de execução físico em torno de 96,00% e financeiro em torno de 65,00%.</p> <p>A obra de Implantação e pavimentação asfáltica nas Vilas Louro e Mamorana, no município de <i>Garrafão do Norte</i>, que é financiada com recursos da OGE, neste ano de 2020, segue conforme programado e alcançou um percentual de execução físico em torno de 65,00% e financeiro em torno de 65,00%.</p> <p>A obra de Execução de drenagem e pavimentação de vias urbanas em CBUQ - FRD II, no município de <i>Rondon do Pará</i>, que é financiada com recursos do BNDES, neste ano de 2020, segue em ritmo acelerado dos serviços, alcançando um percentual de execução físico em torno de 96,88% e financeiro em torno de 85,91%, objetivando sua conclusão ainda no ano</p>					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020.

de 2020.

Quanto ao desempenho físico da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* na Região Rio Capim, foram executados o quantitativo de 56,09 km de vias pavimentadas no decorrer do ano de 2020, o que representa superação da meta estabelecida para a região com cerca de 14,09 km.

Em relação ao desempenho financeiro houve necessidade de atualizar a dotação orçamentária inicial majorando em R\$ 45.801.533,10. Esta atualização foi necessária, principalmente, devido a grande demanda de serviços relacionados à execução obras de pavimentação que a Sedop recebe, cuja dotação inicial era insuficiente para o perfeito atendimento dos pleitos.

Finalizando, considerando o cenário exposto, a Sedop destaca que no ano de 2020, na Região Rio Capim, a *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas*, teve um desempenho *Acima do Programado*.

REGIÃO TAPAJÓS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: AVEIRO, ITAITUBA, JACAREACANGA, NOVO PROGRESSO, RURÓPOLIS, TRAIRÃO.					
PRODUTO	VIA PAVIMENTADA	UNIDADE	KM	META 2020	37 KM

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020					
<p>Com orçamento de R\$ 27.504.731,00¹ e tendo como atuação os municípios de Aveiro, Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, Rurópolis e Trairão, a <i>Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbana</i> visa melhoria das condições de deslocamento da população da Região Tapajós como demonstrado abaixo no detalhamento dos municípios contemplados.</p> <p>Em <i>Itaituba</i>, a obra de terraplanagem, pavimentação e drenagem pluvial, financiada com recursos do NDB, segue em execução com percentual físico em 29,5% e 27 km de vias pavimentadas.</p> <p>No município de <i>Novo Progresso</i> a obra, também financiada com recursos do NDB, segue sua programação com execução física em 68,46% e com término previsto para fevereiro de 2021.</p> <p>A obra de terraplanagem, pavimentação e drenagem pluvial no município de <i>Rurópolis</i>, que conta com financiamento do NDB, tem execução física em 37,80% e 15 km de vias pavimentadas.</p> <p>Em <i>Trairão</i>, a obra desta ação, financiada com recursos do NDB, tem execução física de 27,73% e 12 km de vias pavimentadas.</p> <p>Ainda em <i>Itaituba</i>, a Sedop executa obra de Pavimentação de Vias Urbanas em CBUQ através de Convênio de Cooperação Técnica Com Encargos, celebrado com a Prefeitura Municipal, cuja obra está com percentual de execução física em 60%.</p> <p>Quanto ao desempenho físico da <i>Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas</i> na Região Tapajós, foram executados o quantitativo de 70,37 km de vias pavimentadas no decorrer do ano de 2020, o que representa superação da meta estabelecida para a região, em 33,37 km além do programado.</p> <p>Em relação ao desempenho financeiro houve necessidade de atualizar a dotação orçamentária inicial majorando em R\$ 4.688.680,52. Esta atualização foi necessária, principalmente, devido a grande demanda de serviços relacionados à execução obras de pavimentação que a Sedop recebe, cuja dotação inicial era insuficiente para o perfeito atendimento dos pleitos.</p> <p>Finalizando, considerando o cenário exposto, a Sedop destaca que no ano de 2020, na Região Tapajós, a <i>Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas</i>, teve um desempenho físico e financeiro <i>Acima do Programado</i>.</p>					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

REGIÃO TOCANTINS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ABAETETUBA, ACARÁ, BAIÃO, BARCARENA, CAMETÁ, IGARAPÉ-MIRI, LIMOEIRO DO AJURÚ, MOCAJUBA, MOJU, OEIRAS DO PARÁ, TAILÂNDIA					
PRODUTO	VIA PAVIMENTADA	UNIDADE	KM	META 2020	50 KM

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Com orçamento de R\$ 4.467.903,00¹ previsto para o ano de 2020 e tendo como atuação os municípios de Abaetetuba, Acará, Baião, Barcarena, Cametá, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru, Moju, Oeiras do Pará e Tailândia, a *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* visa melhoria das condições de deslocamento da população da Região Tocantins como demonstrado abaixo no detalhamento dos municípios contemplados.

Em *Abaetetuba*, a obra de drenagem e pavimentação de asfáltica de vias urbanas, financiada com recursos FINISA, está em execução, com percentual físico em 47,83% e previsão de término para fevereiro de 2021.

O Município de *Acará* recebeu visita técnica para implementação da ação e teve a obra de drenagem e pavimentação de asfáltica de vias urbanas iniciadas. Em relação a execução física, a obra se encontra com 23,32% do total.

Em *Baião*, a obra avança conforme programado. O município de Barcarena recebeu visita técnica para análise e futura implementação do programa Asfalto Por Todo Pará.

Quanto ao município de *Igarapé-Miri*, a obra possui avanço de 54,02% em relação ao percentual físico e 5 km de vias pavimentadas. A obra em *Moju*, que é financiada pela FINISA, segue sua programação e tem execução física de 68,91% conta com 7 km de vias pavimentadas.

Em *Oeiras do Pará* a obra de drenagem e pavimentação de asfáltica de vias urbanas, financiada com recursos FINISA, está em execução, com percentual físico em 32,70% e previsão de finalização para fevereiro de 2021.

Em *Tailândia* a obra de drenagem e pavimentação de asfáltica de vias urbanas, financiada com recursos FINISA, está em execução, com percentual físico em 48,19% e previsão de finalização para fevereiro de 2021.

Quanto ao desempenho físico da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* na Região Tocantins, foram executados o quantitativo de 35,82 km de vias pavimentadas no decorrer do ano de 2020, o que representa 71,64% de alcance da meta estabelecida para a região, não atingindo, portanto, a meta estipulada.

Em relação ao desempenho financeiro houve necessidade de atualizar a dotação orçamentária inicial majorando em R\$ 22.343.933,17. Esta atualização foi necessária, principalmente, devido a grande demanda de serviços relacionados à execução obras de pavimentação que a Sedop recebe, cuja dotação inicial era insuficiente para o perfeito atendimento dos pleitos.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020.

Finalizando, considerando o cenário exposto, a Sedop destaca que no ano de 2020, na Região Tocantins, a *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas*, teve um desempenho (*Merece Atenção*) em relação ao programado.

REGIÃO XINGU					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ALTAMIRA, ANAPU, BRASIL NOVO, MEDICILÂNDIA, PACAJÁ, PLACAS, PORTO DE MOZ, SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, URUARÁ, VITÓRIA DO XINGU					
PRODUTO	VIA PAVIMENTADA	UNIDADE	KM	META 2020	59 KM

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020					
<p>A Sedop assumiu o compromisso de ampliar em 59 km, no ano de 2020, a mobilidade e acessibilidade nas áreas urbanas da Região Xingu através da ação governamental Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas.</p> <p>Com orçamento de R\$ 53.432.046,00¹ previsto para o ano de 2020, esta ação visa melhoria das condições de deslocamento da população dos municípios de Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Placas, Porto De Moz, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu.</p> <p>Em <i>Anapu</i>, a obra de drenagem e pavimentação de asfáltica de vias urbanas, financiada com recursos CAF, está em execução, com percentual físico em 91,98%. No município de <i>Altamira</i> a execução dos serviços de drenagem e pavimentação asfáltica de vias urbanas da região de integração Xingu – Lote 4, financiada com recursos FINISA, está em execução, com percentual físico em 82,61%.</p> <p>Em <i>Brasil Novo</i> a obra de terraplanagem, pavimentação e drenagem pluvial, financiada com recursos NDB, está em execução com percentual físico em 63,30%. No Município de <i>Medicilândia</i>, A obra de terraplanagem, pavimentação e drenagem pluvial, que conta com financiamento do NDB, tem execução física em 58,43% e 15 km de vias pavimentadas. A previsão de finalização da obra é em junho de 2021.</p> <p>Em <i>Pacajá</i>, a obra de terraplanagem, pavimentação e drenagem pluvial, que conta com financiamento do NDB, tem execução física em 51,91%. A obra de terraplanagem, pavimentação e drenagem pluvial, no município de <i>Placas</i>, que conta com financiamento do NDB, tem execução física em 49,21% e previsão de finalização para janeiro de 2021.</p> <p>Em <i>Porto de Moz</i>, a obra financiada com recurso CAF, segue sua programação, com execução física em 67,80%. No município de <i>Senador José Porfírio</i>, a obra que é financiada com recursos NDB, segue conforme programada e tem execução física em 69,82% e 11 km de vias pavimentadas. Em <i>Uruará</i> a obra que é financiada com recursos NDB, segue como programada e tem execução física em 72,28% e 20 km de vias pavimentadas.</p> <p>Quanto ao desempenho físico da <i>Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas</i> na Região Xingu, foram executados o quantitativo de 125,75 km de vias pavimentadas no decorrer do ano de 2020, o que representa superação da meta estabelecida para a região em 66,75 km além do programado.</p> <p>Em relação ao desempenho financeiro houve necessidade de atualizar a dotação orçamentária inicial majorando em R\$ 72.548.760,02. Esta atualização foi necessária, principalmente, devido a grande demanda de serviços relacionados à execução obras de pavimentação que a Sedop recebe, cuja dotação inicial era insuficiente para o perfeito atendimento dos pleitos.</p>					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020.

Finalizando, considerando o cenário exposto, a Sedop destaca que no ano de 2020, na Região Xingu, a *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas*, teve um desempenho físico e financeiro *Conforme Programado*.

4.1.6.AÇÃO 7646. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GOVERNANÇA METROPOLITANA

REGIÃO BAIXO AMAZONAS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: BELTERRA, MOJUÍ DOS CAMPOS, SANTARÉM.					
PRODUTO	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2020	1 SISTEMA IMPLANTADO

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

A ação Implantação do Sistema de Gestão e Planejamento integrado das Regiões Metropolitanas é uma das ações que atuam diretamente no trecho da lei de criação da Sedop (Lei 8.096, 01/01/2015) que trata de “[...] propor e implementar a política de organização urbana e regional [...]”.

Esta ação tem como objetivo responder aos requisitos da Lei Federal nº 13.089/2015 (Estatuto da Metrópole), que estabeleceu diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e aglomerações urbanas brasileiras e que foi modificada pela Lei Federal nº 13.683 de 2018.

As ações da Retomada das articulações com os órgãos municipais da Região Metropolitana de Santarém (RMS), a readequação da minuta de projeto de lei Complementar da RMS, e os estudos e pesquisas para a elaboração do Termo de Referência para a contratação de uma consultoria do PDUI - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, foram suspensas devido a COVID-19, por isso manteve-se dentro do orçamento previsto do início do ano, sem nenhuma execução física ou financeira.

Ainda como justificativa ao status *Abaixo do Esperado* conferido ao desempenho físico e financeiro na Região Baixo Amazonas, a Sedop informa que:

- A meta da *Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana* é ter 01 Sistema de Governança Implantado na Região Metropolitana de Santarém – RMS, a qual abrange três municípios da Região de Integração Baixo Amazonas (Belterra, Mojuí dos Campos e Santarém) e não ter 01 sistema implantado em cada município e em cada ano do PPA, como o sistema consolida;

- O bom desempenho desta ação não está totalmente na governabilidade da Sedop, haja vista que, para que a mesma se concretize, a resolutividades de condicionantes políticas são fundamentais para a continuidade do processo;

- A obtenção do produto/meta desta ação tem como prazo limite o período de vigência do PPA 2020/2023, ou seja, até o ano de 2023, podendo ocorrer antes dependendo da evolução das tratativas técnicas e, principalmente, políticas.

Frente ao exposto, a Sedop espera justificar o motivo do desempenho físico e financeiro da *Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana* na Região Baixo Amazonas no decorrer do ano de 2020, apresentar o status de *Abaixo do Programado* no Sistema Integrado de Planejamento - SIGPLAN – Monitoramento.

REGIÃO CARAJÁS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: BOM JESUS DO TOCANTINS, MARABÁ, SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, SÃO JOÃO DO ARAGUAIA.					
PRODUTO	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2020	1 SISTEMA IMPLANTADO

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020
<p>A ação Implantação do Sistema de Gestão e Planejamento integrado das Regiões Metropolitanas é uma das ações que atuam diretamente no trecho da lei de criação da Sedop (Lei 8.096, 01/01/2015) que trata de '[...] propor e implementar a política de organização urbana e regional [...].</p> <p>Esta ação tem como objetivo responder aos requisitos da Lei Federal nº 13.089/2015 (Estatuto da MetrÓpole), que estabeleceu diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e aglomerações urbanas brasileiras e que foi modificada pela Lei Federal nº 13.683 de 2018.</p> <p>As ações da Retomada das articulações com os órgãos municipais da Região Metropolitana de Marabá (RMM), a readequação da minuta de projeto de lei Complementar da RMM, e os estudos e pesquisas para a elaboração do Termo de Referência para a contratação de uma consultoria do PDUI, Plano de desenvolvimento urbano integrado, foram suspensas devido a COVID-19, por isso manteve-se dentro do orçamento previsto do início do ano, sem nenhuma execução física ou financeira.</p> <p>Ainda como justificativa ao status <i>Abaixo do Esperado</i> conferido ao desempenho físico e financeiro na Região Carajás, a Sedop informa que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A meta da <i>Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana</i> é ter 01 Sistema de Governança Implantado na Região Metropolitana de Marabá – RMM, caso a referida RMM seja instituída. O Projeto de lei nº 167/2012 estabelece a composição da RMM com municípios que fazem parte da Região de Integração Carajás (Bom Jesus do Tocantins, Marabá e São Domingos do Araguaia) e da Região de Integração Lago de Tucuruí (Itupiranga e Nova Ipixuna); - O Sistema Integrado de Planejamento - SIGPLAN – Monitoramento, consolida equivocadamente 01 sistema implantado em cada município e em cada ano do PPA, o que, conforme explicado acima, não condiz com o produto esperado para esta ação. - O bom desempenho desta ação não está totalmente na governabilidade da Sedop, haja vista que, para que a mesma se concretize, a resolutividades de condicionantes políticas são fundamentais para a continuidade do processo; - A obtenção do produto/meta desta ação tem como prazo limite o período de vigência do PPA 2020/2023, ou seja, até o ano de 2023, podendo ocorrer antes dependendo da evolução das tratativas técnicas e, principalmente, políticas. <p>Frente ao exposto, a Sedop espera justificar o motivo do desempenho físico e financeiro da <i>Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana</i> na Região Carajás no decorrer do ano de 2020, apresentar o status de <i>Abaixo do Programado</i> no Sistema Integrado de Planejamento - SIGPLAN – Monitoramento.</p>

REGIÃO GUAJARÁ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ANANINDEUA, BELÉM, BENEVIDES, MARITUBA, SANTA BÁRBARA DO PARÁ.					
PRODUTO	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2020	1 SISTEMA IMPLANTADO

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020
<p>A ação Implantação do Sistema de Gestão e Planejamento integrado das Regiões Metropolitanas é uma das ações que atuam diretamente no trecho da lei de criação da Sedop (Lei 8.096, 01/01/2015) que trata de '[...] propor e implementar a política de organização urbana e regional [...].</p> <p>Esta ação tem como objetivo responder aos requisitos da Lei Federal nº 13.089/2015 (Estatuto da Metrópole), que estabeleceu diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e aglomerações urbanas brasileiras e que foi modificada pela Lei Federal nº 13.683 de 2018.</p> <p>As ações da Retomada das articulações com os órgãos municipais da Região Metropolitana de Belém (RMB), a readequação da minuta de projeto de lei Complementar da RMB, e os estudos e pesquisas para a elaboração do Termo de Referência para a contratação de uma consultoria do PDUI, Plano de desenvolvimento urbano integrado, foram suspensas devido a COVID-19, por isso manteve-se dentro do orçamento previsto do início do ano, sem nenhuma execução física ou financeira.</p> <p>Ainda como justificativa ao status <i>Abaixo do Esperado</i> conferido ao desempenho físico e financeiro na Região Guajará, a Sedop informa que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A meta da <i>Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana</i> é ter 01 Sistema de Governança Implantado na Região Metropolitana de Belém – RMB. A Lei Complementar nº 76/2011 estabelece a composição da RMB com municípios que fazem parte da Região de Integração Guajará (Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba e Santa Bárbara do Pará) e da Região de Integração Guamá (Castanhal e Santa Izabel do Pará); - O Sistema Integrado de Planejamento - SIGPLAN – Monitoramento, consolida equivocadamente 01 sistema implantado em cada município e em cada ano do PPA, o que, conforme explicado acima, não condiz com o produto esperado para esta ação. - O bom desempenho desta ação não está totalmente na governabilidade da Sedop, haja vista que, para que a mesma se concretize, a resolutividades de condicionantes políticas são fundamentais para a continuidade do processo; - A obtenção do produto/meta desta ação tem como prazo limite o período de vigência do PPA 2020/2023, ou seja, até o ano de 2023, podendo ocorrer antes dependendo da evolução das tratativas técnicas e, principalmente, políticas. <p>Frente ao exposto, a Sedop espera justificar o motivo do desempenho físico e financeiro da <i>Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana</i> na Região Guajará no decorrer do ano de 2020, apresentar o status de <i>Abaixo do Programado</i> no Sistema Integrado de Planejamento - SIGPLAN – Monitoramento.</p>

REGIÃO GUAMÁ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: CASTANHAL, SANTA IZABEL.					
PRODUTO	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2020	MUNICÍPIOS FAZEM PARTE DA RMB

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

A ação Implantação do Sistema de Gestão e Planejamento integrado das Regiões Metropolitanas é uma das ações que atuam diretamente no trecho da lei de criação da Sedop (Lei 8.096, 01/01/2015) que trata de '[...] propor e implementar a política de organização urbana e regional [...].

Esta ação tem como objetivo responder aos requisitos da Lei Federal nº 13.089/2015 (Estatuto da Metr pole), que estabeleceu diretrizes gerais para o planejamento, a gest o e a execu o das fun es p blicas de interesse comum em regi es metropolitanas e aglomera es urbanas brasileiras e que foi modificada pela Lei Federal n  13.683 de 2018.

As a es da Retomada das articula es com os  rg os municipais da Regi o Metropolitana de Bel m (RMB), a readequa o da minuta de projeto de lei Complementar da RMB, e os estudos e pesquisas para a elabora o do Termo de Refer ncia para a contrata o de uma consultoria do PDUI, Plano de desenvolvimento urbano integrado, foram suspensas devido a COVID-19, por isso manteve-se dentro do or amento previsto do in cio do ano, sem nenhuma execu o f sica ou financeira.

Ainda como justificativa ao status *Abaixo do Esperado* conferido ao desempenho f sico e financeiro na Regi o Guam , a Sedop informa que:

- A meta da *A o 7646. Implanta o do Sistema de Governan a Metropolitana*   ter 01 Sistema de Governan a Implantado na Regi o Metropolitana de Bel m – RMB. A Lei Complementar n  76/2011 estabelece a composi o da RMB com munic pios que fazem parte da Regi o de Integra o Guajar  (Ananindeua, Bel m, Benevides, Marituba e Santa B rbara do Par ) e da Regi o de Integra o Guam  (Castanhal e Santa Izabel do Par );

- O Sistema Integrado de Planejamento - SIGPLAN – Monitoramento, consolida equivocadamente 01 sistema implantado em cada munic pio e em cada ano do PPA, o que, conforme explicado acima, n o condiz com o produto esperado para esta a o.

- O bom desempenho desta a o n o est  totalmente na governabilidade da Sedop, haja vista que, para que a mesma se concretize, a resolutividades de condicionantes pol ticas s o fundamentais para a continuidade do processo;

- A obten o do produto/meta desta a o tem como prazo limite o per odo de vig ncia do PPA 2020/2023, ou seja, at  o ano de 2023, podendo ocorrer antes dependendo da evolu o das tratativas t cnicas e, principalmente, pol ticas.

Frente ao exposto, a Sedop espera justificar o motivo do desempenho f sico e financeiro da *A o 7646. Implanta o do Sistema de Governan a Metropolitana* na Regi o Guam  no decorrer do ano de 2020, apresentar o status de *Abaixo do Programado* no Sistema Integrado de Planejamento - SIGPLAN – Monitoramento.

REGIÃO LAGO DE TUCURUÍ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ITUPIRANGA, NOVA IPIXUNA.					
PRODUTO	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2020	MUNICÍPIOS FAZEM PARTE DA RMM

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

A ação Implantação do Sistema de Gestão e Planejamento integrado das Regiões Metropolitanas é uma das ações que atuam diretamente no trecho da lei de criação da Sedop (Lei 8.096, 01/01/2015) que trata de “[...] propor e implementar a política de organização urbana e regional [...]”.

Esta ação tem como objetivo responder aos requisitos da Lei Federal nº 13.089/2015 (Estatuto da MetrÓpole), que estabeleceu diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e aglomerações urbanas brasileiras e que foi modificada pela Lei Federal nº 13.683 de 2018.

As ações da Retomada das articulações com os órgãos municipais da Região Metropolitana de Marabá (RMM), a readequação da minuta de projeto de lei Complementar da RMM, e os estudos e pesquisas para a elaboração do Termo de Referência para a contratação de uma consultoria do PDUI, Plano de desenvolvimento urbano integrado, foram suspensas devido a COVID-19, por isso manteve-se dentro do orçamento previsto do início do ano, sem nenhuma execução física ou financeira.

Ainda como justificativa ao status *Abaixo do Esperado* conferido ao desempenho físico e financeiro na Região Lago de Tucuruí, a Sedop informa que:

- A meta da *Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana* é ter 01 Sistema de Governança Implantado na Região Metropolitana de Marabá – RMM, caso a referida RMM seja instituída. O Projeto de lei nº 167/2012 estabelece a composição da RMM com municípios que fazem parte da Região de Integração Carajás (Bom Jesus do Tocantins, Marabá e São Domingos do Araguaia) e da Região de Integração Lago de Tucuruí (Itupiranga e Nova Ipixuna);

- O Sistema Integrado de Planejamento - SIGPLAN – Monitoramento, consolida equivocadamente 01 sistema implantado em cada município e em cada ano do PPA, o que, conforme explicado acima, não condiz com o produto esperado para esta ação.

- O bom desempenho desta ação não está totalmente na governabilidade da Sedop, haja vista que, para que a mesma se concretize, a resolutividades de condicionantes políticas são fundamentais para a continuidade do processo;

- A obtenção do produto/meta desta ação tem como prazo limite o período de vigência do PPA 2020/2023, ou seja, até o ano de 2023, podendo ocorrer antes dependendo da evolução das tratativas técnicas e, principalmente, políticas.

Frente ao exposto, a Sedop espera justificar o motivo do desempenho físico e financeiro da *Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana* na Região Lago de Tucuruí no decorrer do ano de 2020, apresentar o status de *Abaixo do Programado* no Sistema Integrado de Planejamento - SIGPLAN – Monitoramento.

4.1.7.AÇÃO 8463. APOIO AS AÇÕES DO CONCIDADES

REGIÃO GUAJARÁ					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: BELÉM					
PRODUTO	CONSELHO APOIADO	UNIDADE	UN	META 2020	1 CONSELHO APOIADO

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Devido ao cenário pandêmico estabelecido no ano de 2020 e por força do Decreto Estadual que previa medidas de combate a COVID - 19, a *Ação 8463. Apoio as Ações do Concidades*, não pôde ser desenvolvida conforme o programado.

Consta no seu planejamento a realização de reuniões ordinárias com periodicidade trimestral, as quais só puderam acontecer nos meses de janeiro e fevereiro, sendo suspensas no mês de março.

Das 04 reuniões programadas, a Sedop realizou 02 reuniões extraordinárias, conforme pode ser constatado na tabela abaixo:

AÇÕES CONCIDADES 2020		
REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	ATIVIDADES	PRINCIPAIS PRODUTOS
GUAJARÁ	REALIZAÇÃO DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS.	<p>1. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO AUDITÓRIO DA SEDOP, DIA 21/01/2020 E 28/01/2020.</p> <p>1.1. APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA PARA ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CONCIDADES/PA, CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES, CALENDÁRIO DAS REUNIÕES ANUAIS DO CONCIDADES/PA;</p> <p>1.2. APRESENTAÇÃO DAS SUGESTÕES DE ALTERAÇÕES NO REGIMENTO INTERNO DO CONCIDADES/PA. ENCAMINHAMENTOS: DEFINIDA A METODOLOGIA PARA A ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO E MARCADA REUNIÃO PARA DEFINIR O CALENDÁRIO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONCIDADES E CONFERÊNCIA ESTADUAL.</p> <p>2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NA SALA DO CONSELHO NA SEDOP, DIAS 11/02/2020 E 20/02/2020 PARA PROPOR E MONTAR PAUTA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONCIDADES.</p>

Cabe ressaltar que, apesar da suspensão das reuniões presenciais, a Sedop realizou reuniões remotas através de aplicativos de mensagens com o intuito de elaborar o planejamento de como se dará o retorno das atividades e como será o remanejamento das reuniões, garantindo desta forma apoio às ações do Conselho das Cidades no momento de pandemia.

Quanto à execução financeira, como o apoio dado as ações do Concidades no decorrer do ano de 2020 não exigiu dispêndios financeiros, não houve execução orçamentária na *Ação 8463. Apoio as Ações do Concidades*, mantendo intacto o orçamento programado para atender esta ação no valor de R\$ 207.016¹.

Finalizando, apesar do cenário adverso enfrentado no ano de 2020 para desenvolver a *Ação 8463. Apoio as Ações do Concidades*, o esforço dos técnicos envolvidos na execução desta ação, possibilitou que a meta estabelecida de 1 Conselho Apoiado fosse alcançada, garantindo desta forma o status de *Conforme o Programado* para esta ação no exercício de 2020.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

4.1.8.AÇÃO 8692. APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO

REGIÃO ARAGUAIA					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: BANNACH, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PAU D'ARCO, REDENÇÃO, RIO MARIA.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2020	5 INSTRUMENTOS ELABORADOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020			
<p>Com o objetivo de subsidiar tecnicamente os municípios em ações de investimento em instrumentos de saneamento básico, a Sedop desenvolve a <i>Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico</i> simultaneamente em várias Regiões de Integração.</p> <p>Para o ano de 2020, a Sedop planejou atender os seguintes municípios da Região Araguaia: Bannach, Conceição do Araguaia, Pau D'arco, Redenção e Rio Maria. Ressaltamos que, para o desenvolvimento desta ação, são necessárias várias visitas técnicas aos municípios, as quais não puderam acontecer devido à pandemia da COVID – 19. No entanto, a Sedop conseguiu desenvolver algumas atividades de monitoramento e controle através de contato telefônico, mensagem eletrônica e grupos de WhatsApp formados por municípios, para cada ação de instrumento na área de saneamento.</p> <p>É necessário ressaltar que nem todos os municípios programados puderam ser acompanhados através das mídias disponíveis. Exemplo disso são os municípios de Banach, Conceição do Araguaia e Pau D'arco que não puderam ser trabalhados em 2020 e serão revistos na programação física e financeira para o ano de 2021.</p> <p>Quanto aos municípios de Redenção e Rio Maria, a execução física ocorreu conforme tabela abaixo:</p>			
MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO¹
REDENÇÃO	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	- FORMAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO; - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL; - LEVANTAMENTOS PRELIMINARES PARA FORMULAÇÃO DO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL.	20% COM CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DE PRODUTOS.
RIO MARIA (Convênio FUNASA)	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	- FORMAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO, ATRAVÉS DE DECRETO MUNICIPAL E ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL.	30% DOS PRODUTOS DA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO FORAM EXECUTADOS E ENTREGUES PELA EMPRESA CONTRATADA.

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

Com relação à execução financeira, embora a ação tenha recebido um aporte orçamentário de R\$ 1.860,00¹ para o desenvolvimento desta ação na Região Araguaia durante o ano de 2020, conforme explicado anteriormente, por conta da pandemia os técnicos da Sedop não puderam realizar o apoio técnico *in loco* o que, conseqüentemente, não gerou dispêndios financeiros.

Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* na Região Araguaia no exercício de 2020, foi *Abaixo do Esperado*. No entanto, vale ressaltar que, a obtenção do produto desta ação, bem como o alcance da meta física estabelecida não está totalmente na governabilidade da Sedop. Os municípios contemplados têm grande influência para que o desempenho da referida ação seja conforme o programado.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020.

REGIÃO BAIXO AMAZONAS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ALENQUER, BELTERRA, MOJUÍ DOS CAMPOS, MONTE ALEGRE, ORIXIMINÁ, SANTARÉM.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2020	6 INSTRUMENTOS ELABORADOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020					
<p>Com o objetivo de subsidiar tecnicamente os municípios em ações de investimento em instrumentos de saneamento básico, a Sedop desenvolve a <i>Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico</i> simultaneamente em várias Regiões de Integração.</p> <p>Para o ano de 2020, a Sedop planejou atender os seguintes municípios da Região Baixo Amazonas: Alenquer, Belterra, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Oriximiná e Santarém. Ressaltamos que, para o desenvolvimento desta ação, são necessárias várias visitas técnicas aos municípios, as quais aconteceram apenas para o desenvolvimento das atividades pertinentes ao município de Monte Alegre, não podendo acontecer nos demais municípios devido à pandemia da COVID – 19.</p> <p>No entanto, a Sedop conseguiu desenvolver algumas atividades de monitoramento e controle através de contato telefônico, mensagem eletrônica e grupos de WhatsApp formados por municípios, para cada ação de instrumento na área de saneamento.</p> <p>É necessário ressaltar que nem todos os municípios programados puderam ser acompanhados através das mídias disponíveis. Exemplo disso são os municípios de Belterra, Mojuí dos Campos e Santarém que não puderam ser trabalhados em 2020 e serão revistos na programação física e financeira para o ano de 2021.</p> <p>Quanto à execução física, na Região Baixo Amazonas, a ação foi desenvolvida tanto nos municípios programados (Alenquer, Monte Alegre e Oriximiná), quanto em municípios atendidos por meio de demanda espontânea, como é o caso dos municípios de Curuá, Juruti e Prainha.</p> <p>A tabela abaixo sintetiza as principais atividades desenvolvidas nestes municípios no decorrer do ano de 2020.</p>					

MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
ALENQUER	PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	- RETOMADA DE ORIENTAÇÕES REFERENTES À IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAL.	50% ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTES À ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA
MONTE ALEGRE	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	- FORMAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO COM DECRETO MUNICIPAL DEFININDO OS INTEGRANTES; - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL; - CONTINUAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS PARA FINALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL.	10% INÍCIO DAS ORIENTAÇÕES E APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA DE TRABALHO
ORIXIMINÁ	SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	- AUXÍLIO NA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAL.	70% CONTINUIDADE NAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.
CURUÁ (Demanda Espontânea)	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	- INÍCIO DAS AÇÕES COM A FORMAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO; - PUBLICAÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL DEFININDO OS INTEGRANTES; - ORIENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTOS PRELIMINARES QUE AUXILIARAM A FORMULAÇÃO DO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL.	15% COM CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DE PRODUTOS.
JURUTI (Demanda Espontânea)	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	- FORMAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO COM DECRETO MUNICIPAL DEFININDO OS INTEGRANTES; - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL; - CONTINUAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS PARA FINALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL.	20% DAS ATIVIDADES REALIZADAS.
PRAINHA (Demanda Espontânea)	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	- CONTINUAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS; - FORMULAÇÃO DO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL; - REORGANIZAÇÃO DE CRONOGRAMA DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E DAS ETAPAS DE ELABORAÇÃO.	20% COM CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE ELABORAÇÃO DAS ETAPAS DO PLANO.

Com relação à execução financeira, da dotação inicial de R\$ 1.576,00² para atender a Região Baixo Amazonas durante o ano de 2020, houve a necessidade de atualizar o valor programado em cerca de R\$ 2.147,32 para o desenvolvimento da *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* nesta região. Esta divergência *orçamento planejado x orçamento executado* deve-se, principalmente, ao valor estabelecido no teto orçamentário disponibilizado para Sedop ser insuficiente para o desenvolvimento das atividades de apoio técnico.

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020.

Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* na Região Baixo Amazonas no exercício de 2020, foi *Abaixo do Esperado*. No entanto, vale ressaltar que, a obtenção do produto desta ação, bem como o alcance da meta física estabelecida não está totalmente na governabilidade da Sedop. Os municípios contemplados têm grande influência para que o desempenho da referida ação seja conforme o programado.

REGIÃO CARAJÁS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ELDORADO DOS CARAJÁS, SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2020	2 INSTRUMENTOS ELABORADOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Com o objetivo de subsidiar tecnicamente os municípios em ações de investimento em instrumentos de saneamento básico, a Sedop desenvolve a *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* simultaneamente em várias Regiões de Integração.

Para o ano de 2020, a Sedop planejou atender os seguintes municípios da Região Carajás: Eldorado dos Carajás e São Domingos do Araguaia. Ressaltamos que, para o desenvolvimento desta ação, são necessárias várias visitas técnicas aos municípios, as quais não puderam acontecer devido à pandemia da COVID – 19.

No entanto, embora a Sedop tenha conseguido desenvolver algumas atividades de monitoramento e controle através de contato telefônico, mensagem eletrônica e grupos de WhatsApp formados por municípios em algumas regiões de integração, na Região Carajás não houve este acompanhamento. Por este motivo, os municípios de Eldorado dos Carajás e São Domingos do Araguaia serão revistos na programação física e financeira da *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* para o ano de 2021.

Com relação à execução financeira, embora a ação tenha recebido um aporte orçamentário de R\$ 744,00¹ para o desenvolvimento desta ação na Região Carajás durante o ano de 2020, conforme explicado anteriormente, por conta da pandemia os técnicos da Sedop não puderam realizar o apoio técnico *in loco* o que, conseqüentemente, não gerou dispêndios financeiros.

Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* na Região Carajás no exercício de 2020, foi *Abaixo do Esperado*. No entanto, vale ressaltar que, a obtenção do produto desta ação, bem como o alcance da meta física estabelecida não está totalmente na governabilidade da Sedop. Os municípios contemplados têm grande influência para que o desempenho da referida ação seja conforme o programado.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020.

REGIÃO GUAJARÁ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: BENEVIDES, SANTA BÁRBARA					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2020	2 INSTRUMENTOS ELABORADOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Com o objetivo de subsidiar tecnicamente os municípios em ações de investimento em instrumentos de saneamento básico, a Sedop desenvolve a *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* simultaneamente em várias Regiões de Integração.

Para o ano de 2020, a Sedop planejou atender os seguintes municípios da Região Guajará: Benevides e Santa Bárbara. Ressaltamos que, para o desenvolvimento desta ação, são necessárias várias visitas técnicas aos municípios, as quais não puderam acontecer devido à pandemia da COVID – 19.

No entanto, embora a Sedop tenha conseguido desenvolver algumas atividades de monitoramento e controle através de contato telefônico, mensagem eletrônica e grupos de WhatsApp formados por municípios em algumas regiões de integração, na Região Guajará não houve este acompanhamento. Por este motivo, os municípios de Benevides e Santa Bárbara serão revistos na programação física e financeira da *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* para o ano de 2021.

Com relação à execução financeira, embora a ação tenha recebido um aporte orçamentário de R\$ 744,00¹ para o desenvolvimento desta ação na Região Guajará durante o ano de 2020, conforme explicado anteriormente, por conta da pandemia os técnicos da Sedop não puderam realizar o apoio técnico *in loco* o que, conseqüentemente, não gerou dispêndios financeiros.

Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* na Região Guajará no exercício de 2020, foi *Abaixo do Esperado*. No entanto, vale ressaltar que, a obtenção do produto desta ação, bem como o alcance da meta física estabelecida não está totalmente na governabilidade da Sedop. Os municípios contemplados têm grande influência para que o desempenho da referida ação seja conforme o programado.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – XX/12/2020.

REGIÃO GUAMÁ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: CASTANHAL, CURUÇÁ, INHANGAPI, MARACANÃ, MARAPANIM, SANTA IZABEL DO PARÁ, SANTA MARIA DO PARÁ, SÃO FRANCISCO DO PARÁ, SÃO MIGUEL DO GUAMÁ.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2020	9 INSTRUMENTOS ELABORADOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020
<p>Com o objetivo de subsidiar tecnicamente os municípios em ações de investimento em instrumentos de saneamento básico, a Sedop desenvolve a <i>Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico</i> simultaneamente em várias Regiões de Integração.</p> <p>Para o ano de 2020, a Sedop planejou atender os seguintes municípios da Região Guamá: Castanhal, Curuçá, Inhangapi, Maracanã, Marapanim, Santa Izabel do Pará, Santa Maria do Pará, São Francisco do Pará, São Miguel do Guamá. Ressaltamos que, para o desenvolvimento desta ação, são necessárias várias visitas técnicas aos municípios, as quais tiveram suas programações alteradas devido à pandemia da COVID – 19.</p> <p>No entanto, a Sedop conseguiu desenvolver algumas atividades de monitoramento e controle através de contato telefônico, mensagem eletrônica e grupos de WhatsApp formados por municípios, para cada ação de instrumento na área de saneamento.</p> <p>É necessário ressaltar que nem todos os municípios programados puderam ser acompanhados através das mídias disponíveis. Exemplo disso são os municípios de Curuçá, Maracanã e Marapanim que não puderam ser trabalhados em 2020 e serão revistos na programação física e financeira para o ano de 2021.</p> <p>Quanto à execução física, na Região Guamá, a ação foi desenvolvida tanto nos municípios programados (Castanhal, Inhangapi, Santa Izabel do Pará, Santa Maria do Pará, São Francisco do Pará e São Miguel do Guamá), quanto em municípios atendidos por meio de demanda espontânea, como é o caso dos municípios de São Domingos do Capim e Santo Antônio do Tauá.</p> <p>A tabela abaixo sintetiza as principais atividades desenvolvidas nestes municípios no decorrer do ano de 2020.</p>

MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
CASTANHAL, INHANGAPI, SANTA MARIA DO PARÁ, SANTA IZABEL DO PARÁ, SÃO FRANCISCO DO PARÁ	PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (Vinculado ao CAF)	# ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA PROCESSO LICITATÓRIO: - INICIADO A ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E RESÍDUOS SÓLIDOS; - TERMO DE REFERÊNCIA ENCAMINHADO AO BANCO PARA ANÁLISE QUANTO AO PLANO DE ESTUDOS AMBIENTAIS (EARIMA), GESTÃO DE ATERROS E OUTROS.	30% DAS ATIVIDADES REALIZADAS
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	- FORMAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO COM DECRETO MUNICIPAL DEFININDO OS INTEGRANTES; - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL; - LEVANTAMENTOS PRELIMINARES QUE AUXILIAREM A FORMULAÇÃO DO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL.	10% FASE INICIAL DE ELABORAÇÃO
SÃO DOMINGOS DO CAPIM (Demanda Espontânea)	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	- FORMAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO COM DECRETO MUNICIPAL DEFININDO OS INTEGRANTES; - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL; - LEVANTAMENTOS PRELIMINARES QUE AUXILIAREM A FORMULAÇÃO DO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL.	10% FASE INICIAL DE ELABORAÇÃO
SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ (Demanda Espontânea)	IMPLANTAÇÃO DE CONSÓRCIO MUNICIPAL	# PROPOSTA CONSÓRCIO MUNICIPAL (SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ, VIGIA DE NAZARÉ, COLARES E SÃO CAETANO DE ODIVELAS): - FASE INICIAL DE LEVANTAMENTO.	10% FASE INICIAL DE ELABORAÇÃO

Com relação à execução financeira, da dotação inicial de R\$ 28.348,00² para atender a Região Guamá durante o ano de 2020, houve a necessidade de atualizar o valor programado para R\$ 90.114,11³ de modo a garantir o desenvolvimento da *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* nesta região. Esta divergência *orçamento planejado x orçamento executado* deve-se, principalmente, ao valor estabelecido no teto orçamentário disponibilizado para Sedop ser insuficiente para o desenvolvimento das atividades de apoio técnico.

Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* na Região Guamá no exercício de 2020, foi *Abaixo do Esperado*. No entanto, vale ressaltar que, a obtenção do produto desta ação, bem como o alcance da meta física estabelecida não está totalmente na governabilidade da Sedop. Os municípios contemplados têm grande influência para que o desempenho da referida ação seja conforme o programado.

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020.

³ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020.

REGIÃO LAGO DE TUCURUÍ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: BREU BRANCO, JACUNDÁ.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2020	2 INSTRUMENTOS ELABORADOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Com o objetivo de subsidiar tecnicamente os municípios em ações de investimento em instrumentos de saneamento básico, a Sedop desenvolve a *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* simultaneamente em várias Regiões de Integração.

Para o ano de 2020, a Sedop planejou atender os seguintes municípios da Região Lago de Tucuruí: Breu Branco e Jacundá. Ressaltamos que, para o desenvolvimento desta ação, são necessárias várias visitas técnicas aos municípios, as quais não puderam acontecer devido à pandemia da COVID – 19.

No entanto, embora a Sedop tenha conseguido desenvolver algumas atividades de monitoramento e controle através de contato telefônico, mensagem eletrônica e grupos de WhatsApp formados por municípios em algumas regiões de integração, na Região Lago de Tucuruí não houve este acompanhamento. Por este motivo, os municípios de Breu Branco e Jacundá serão revistos na programação física e financeira da *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* para o ano de 2021.

É necessário destacar que, mesmo que os municípios programados não tenham tido execução física, a ação foi desenvolvida na Região Lago de Tucuruí por meio de demanda espontânea no município de Tucuruí.

A tabela abaixo sintetiza as principais atividades desenvolvidas neste município no decorrer do ano de 2020.

MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
TUCURUÍ	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	- CONTINUAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS; - FORMULAÇÃO DO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL; - REORGANIZAÇÃO DE CRONOGRAMA DAS ETAPAS DE ELABORAÇÃO.	10% CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE ELABORAÇÃO DAS ETAPAS DO PLANO.

Com relação à execução financeira, embora a ação tenha recebido um aporte orçamentário de R\$ 744,00² para o desenvolvimento desta ação na Região Lago de Tucuruí durante o ano de 2020, conforme explicado anteriormente, por conta da pandemia os técnicos da Sedop não puderam realizar o apoio técnico *in loco* o que, conseqüentemente, não gerou dispêndios financeiros.

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020.

Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* na Região Lago de Tucuruí no exercício de 2020, foi *Abaixo do Esperado*. No entanto, vale ressaltar que, a obtenção do produto desta ação, bem como o alcance da meta física estabelecida não está totalmente na governabilidade da Sedop. Os municípios contemplados têm grande influência para que o desempenho da referida ação seja conforme o programado.

REGIÃO MARAJÓ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: AFUÁ, BREVES, PORTEL, SALVATERRA, SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, SOURE.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2020	6 INSTRUMENTOS ELABORADOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020					
<p>Com o objetivo de subsidiar tecnicamente os municípios em ações de investimento em instrumentos de saneamento básico, a Sedop desenvolve a <i>Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico</i> simultaneamente em várias Regiões de Integração.</p> <p>Para o ano de 2020, a Sedop planejou atender os seguintes municípios da Região Marajó: Afuá, Breves, Portel, Salvaterra, São Sebastião da Boa Vista e Soure. Ressaltamos que, para o desenvolvimento desta ação, são necessárias várias visitas técnicas aos municípios, as quais tiveram suas programações alteradas devido à pandemia da COVID – 19.</p> <p>No entanto, a Sedop conseguiu desenvolver algumas atividades de monitoramento e controle através de contato telefônico, mensagem eletrônica e grupos de WhatsApp formados por municípios, para cada ação de instrumento na área de saneamento.</p> <p>É necessário ressaltar que nem todos os municípios programados puderam ser acompanhados através das mídias disponíveis. Exemplo disso são os municípios de Afuá, Salvaterra, São Sebastião da Boa Vista e Soure que não puderam ser trabalhados em 2020 e serão revistos na programação física e financeira para o ano de 2021.</p> <p>Quanto à execução física, na Região Marajó, a ação foi desenvolvida tanto nos municípios programados (Portel e Breves), quanto em municípios atendidos por meio de demanda espontânea, como é o caso dos municípios de Gurupá, Santa Cruz do Arari e Ponta de Pedras.</p> <p>A tabela abaixo sintetiza as principais atividades desenvolvidas nestes municípios no decorrer do ano de 2020.</p>					

MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
PORTEL	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	- CONTINUAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS; - FORMULAÇÃO DO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE QUESTIONÁRIOS, RELATÓRIOS E DAS ETAPAS DE ELABORAÇÃO.	10% CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE ELABORAÇÃO DAS ETAPAS DO PLANO
BREVES	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	- ORIENTAÇÕES INICIAIS; - EM FASE DE ASSINATURA DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 04/2020.	10% FASE INICIAL DE ELABORAÇÃO
GURUPÁ (Demanda Espontânea)	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	- CONTINUAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS; - FORMULAÇÃO DO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE QUESTIONÁRIOS, RELATÓRIOS E DAS ETAPAS DE ELABORAÇÃO.	10% CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DE PRODUTOS.
SANTA CRUZ DO ARARI (Demanda Espontânea)	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	- CONTINUAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS; - FORMULAÇÃO DO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE QUESTIONÁRIOS, RELATÓRIOS E DAS ETAPAS DE ELABORAÇÃO.	10% CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DE PRODUTOS.
PONTA DE PEDRAS (Demanda Espontânea)	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	- EM FASE DE ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA.	INICIANDO AS AÇÕES

Com relação à execução financeira, com a pandemia da COVID – 19 apresentando sinais de estabilidade no segundo semestre de 2020, os técnicos da Sedop puderam realizar visitas técnicas *in loco* em alguns municípios, gerando um pequeno dispêndio de 28% do orçamento programado para atender a Região Marajó, cerca de R\$ 3.323,32².

Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* na Região Marajó no exercício de 2020, foi *Abaixo do Esperado*. No entanto, vale ressaltar que, a obtenção do produto desta ação, bem como o alcance da meta física estabelecida não está totalmente na governabilidade da Sedop. Os municípios contemplados têm grande influência para que o desempenho da referida ação seja conforme o programado.

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

REGIÃO RIO CAETÉ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: AUGUSTO CORRÊA, BONITO, BRAGANÇA, CACHOEIRA DO PIRIÁ, CAPANEMA, QUATIPURU, SALINÓPOLIS, SANTA LUZIA DO PARÁ, VISEU.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2020	9 INSTRUMENTOS ELABORADOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Com o objetivo de subsidiar tecnicamente os municípios em ações de investimento em instrumentos de saneamento básico, a Sedop desenvolve a *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* simultaneamente em várias Regiões de Integração.

Para o ano de 2020, a Sedop planejou atender os seguintes municípios da Região Rio Caeté: Augusto Corrêa, Bonito, Bragança, Cachoeira do Piriá, Capanema, Quatipuru, Salinópolis, Santa Luzia do Pará e Viseu. Ressaltamos que, para o desenvolvimento desta ação, são necessárias várias visitas técnicas aos municípios, as quais tiveram suas programações alteradas devido à pandemia da COVID – 19.

No entanto, a Sedop conseguiu desenvolver algumas atividades de monitoramento e controle através de contato telefônico, mensagem eletrônica e grupos de WhatsApp formados por municípios, para cada ação de instrumento na área de saneamento.

É necessário ressaltar que nem todos os municípios programados puderam ser acompanhados através das mídias disponíveis. Exemplo disso são os municípios de Augusto Corrêa, Bonito, Bragança, Cachoeira do Piriá, Capanema, Salinópolis, Santa Luzia do Pará e Viseu que não puderam ser trabalhados em 2020 e serão revistos na programação física e financeira para o ano de 2021.

Quanto à execução física e financeira desta ação na Região Rio Caeté, a mesma foi desenvolvida apenas no município de Quatipuru. No que diz respeito à execução física, a tabela abaixo sintetiza as principais atividades realizadas no município no decorrer do ano de 2020.

MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
QUATIPURU	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	- FORMAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO; - ORIENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTOS PRELIMINARES QUE AUXILIARAM A FORMULAÇÃO DO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL.	10% ORIENTAÇÕES INICIAIS E APRESENTAÇÃO DE METODOLOGIA DE TRABALHO REALIZADA.

Com relação à execução financeira, os técnicos da Sedop puderam realizar visitas técnicas *in loco* no município de Quatipuru, gerando um dispêndio de 75% do orçamento programado para atender a Região Rio Caeté, cerca de R\$ 1.780,35².

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO -04/12/2020.

Finalizando, considerando o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* na Região Rio Caeté no exercício de 2020, foi *Abaixo do Esperado*. No entanto, vale ressaltar que, a obtenção do produto desta ação, bem como o alcance da meta física estabelecida não está totalmente na governabilidade da Sedop. Os municípios contemplados têm grande influência para que o desempenho da referida ação seja conforme o programado.

REGIÃO RIO CAPIM					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: AURORA DO PARÁ, CAPITÃO POÇO, CONCÓRDIA DO PARÁ, IRITUÍIA, MÃE DO RIO, RONDON DO PARÁ, TOMÉ – AÇU.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2020	8 INSTRUMENTOS ELABORADOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020					
<p>Com o objetivo de subsidiar tecnicamente os municípios em ações de investimento em instrumentos de saneamento básico, a Sedop desenvolve a <i>Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico</i> simultaneamente em várias Regiões de Integração.</p> <p>Para o ano de 2020, a Sedop planejou atender os seguintes municípios da Região Rio Capim: Aurora do Pará, Capitão Poço, Concórdia do Pará, Irituia, Mãe do Rio, Rondon do Pará e Tomé – Açú. Ressaltamos que, para o desenvolvimento desta ação, são necessárias várias visitas técnicas aos municípios, as quais tiveram suas programações alteradas devido à pandemia da COVID – 19.</p> <p>No entanto, a Sedop conseguiu desenvolver algumas atividades de monitoramento e controle através de contato telefônico, mensagem eletrônica e grupos de WhatsApp formados por municípios, para cada ação de instrumento na área de saneamento.</p> <p>É necessário ressaltar que nem todos os municípios programados puderam ser acompanhados através das mídias disponíveis. Exemplo disso são os municípios de Aurora do Pará, Capitão Poço, Irituia e Mãe do Rio que não puderam ser trabalhados em 2020 e serão revistos na programação física e financeira para o ano de 2021.</p> <p>Quanto à execução física, na Região Rio Capim, a ação foi desenvolvida tanto nos municípios programados (Concórdia, Rondon do Pará e Tomé-Açú), quanto em municípios atendidos por meio de demanda espontânea, como é o caso dos municípios de Bujaru e Ulianópolis.</p> <p>A tabela abaixo sintetiza as principais atividades desenvolvidas nestes municípios no decorrer do ano de 2020.</p>					

MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
CONCÓRDIA DO PARÁ, TOMÉ-AÇU	FORMALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO CIGERS (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS)	- ASSINATURA DO PROTOCOLO DE INTENSÕES ENTRE OS MUNICÍPIOS ENVOLVIDOS.	20% DAS ATIVIDADES REALIZADAS
RONDON DO PARÁ (Vinculado ao CAF)	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	- ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTES A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	50% DAS ATIVIDADES REALIZADAS
BUJARU (Demanda Espontânea)	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	- ENTREGA DO PRODUTO FINAL REFERENTE AO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO.	100% INSTRUMENTO ELABORADO
ULIANÓPOLIS	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (CONVÊNIO FUNASA)	- FORMAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO, ATRAVÉS DE DECRETO MUNICIPAL; - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL; - ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO TÉCNICO PARTICIPATIVO.	40% DOS PRODUTOS DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO FORAM EXECUTADOS E ENTREGUES PELA EMPRESA CONTRATADA.

Com relação à execução financeira, da dotação inicial de R\$ 69.641,00² para atender a Região Rio Capim durante o ano de 2020, houve a necessidade de atualizar o valor programado para R\$ 101.225,30 de modo a garantir, principalmente, a execução do Convênio nº 89/2012 FUNASA/Sedop no município de Ulianópolis. Esta divergência *orçamento planejado x orçamento executado* deve-se, principalmente, ao valor estabelecido no teto orçamentário disponibilizado para Sedop ser insuficiente para o desenvolvimento das atividades de apoio técnico.

Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico na Região Rio Capim no exercício de 2020, foi *Abaixo do Esperado*. No entanto, vale ressaltar que, a obtenção do produto desta ação, bem como o alcance da meta física estabelecida não está totalmente na governabilidade da Sedop. Os municípios contemplados têm grande influência para que o desempenho da referida ação seja conforme o programado.

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020.

REGIÃO TAPAJÓS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ITAITUBA, NOVO PROGRESSO, RURÓPOLIS, TRAIRÃO.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2020	4 INSTRUMENTOS ELABORADOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Com o objetivo de subsidiar tecnicamente os municípios em ações de investimento em instrumentos de saneamento básico, a Sedop desenvolve a *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* simultaneamente em várias Regiões de Integração.

Para o ano de 2020, a Sedop planejou atender os seguintes municípios da Região Tapajós: Itaituba, Novo Progresso, Rurópolis e Trairão. Ressaltamos que, para o desenvolvimento desta ação, são necessárias várias visitas técnicas aos municípios, as quais tiveram suas programações alteradas devido à pandemia da COVID – 19.

No entanto, a Sedop conseguiu desenvolver algumas atividades de monitoramento e controle através de contato telefônico, mensagem eletrônica e grupos de WhatsApp formados por municípios, para cada ação de instrumento na área de saneamento.

É necessário ressaltar que nem todos os municípios programados puderam ser acompanhados através das mídias disponíveis. Exemplo disso são os municípios de Novo Progresso, Rurópolis e Trairão que não puderam ser trabalhados em 2020 e serão revistos na programação física e financeira para o ano de 2021.

Quanto à execução física, na Região Tapajós, a ação foi desenvolvida apenas no município de Itaituba. A tabela abaixo sintetiza as principais atividades realizadas neste município no decorrer do ano de 2020.

MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
ITAITUBA (Vinculado ao CAF)	ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	- ENTREGA DE MATERIAIS E PROJETOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS FÍSICAS; - ELABORAÇÃO DE PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMO CONDICIONANTE PARA RECEBIMENTO DO FINANCIAMENTO.	30% DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Com relação à execução financeira, embora a ação tenha recebido um aporte orçamentário de R\$ 26.484,00² para o desenvolvimento desta ação na Região Tapajós durante o ano de 2020, conforme explicado anteriormente, por conta da pandemia os técnicos da Sedop não puderam realizar o apoio técnico *in loco* o que, conseqüentemente, não gerou dispêndios financeiros.

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020.

Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* na Região Tapajós no exercício de 2020, foi *Abaixo do Esperado*. No entanto, vale ressaltar que, a obtenção do produto desta ação, bem como o alcance da meta física estabelecida não está totalmente na governabilidade da Sedop. Os municípios contemplados têm grande influência para que o desempenho da referida ação seja conforme o programado.

REGIÃO TOCANTINS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ACARÁ, CAMETÁ, IGARAPÉ-MIRI, LIMOEIRO DO AJURU, MOJU, TAILÂNDIA.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2020	6 INSTRUMENTOS ELABORADOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020			
<p>Com o objetivo de subsidiar tecnicamente os municípios em ações de investimento em instrumentos de saneamento básico, a Sedop desenvolve a <i>Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico</i> simultaneamente em várias Regiões de Integração.</p> <p>Para o ano de 2020, a Sedop planejou atender os seguintes municípios da Região Tocantins: Acará, Cametá, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru, Moju e Tailândia. Ressaltamos que, para o desenvolvimento desta ação, são necessárias várias visitas técnicas aos municípios, as quais tiveram suas programações alteradas devido à pandemia da COVID – 19.</p> <p>No entanto, a Sedop conseguiu desenvolver algumas atividades de monitoramento e controle através de contato telefônico, mensagem eletrônica e grupos de WhatsApp formados por municípios, para cada ação de instrumento na área de saneamento.</p> <p>É necessário ressaltar que nem todos os municípios programados puderam ser acompanhados através das mídias disponíveis. Exemplo disso são os municípios de Cametá, Igarapé-Miri, Moju e Tailândia que não puderam ser trabalhados em 2020 e serão revistos na programação física e financeira para o ano de 2021.</p> <p>Quanto à execução física, na Região Tocantins a ação foi desenvolvida tanto nos municípios programados (Acará e Limoeiro do Ajuru), quanto em municípios atendidos por meio de demanda espontânea, como é o caso dos municípios de Baião e Oeiras do Pará.</p> <p>A tabela abaixo sintetiza as principais atividades desenvolvidas nestes municípios no decorrer do ano de 2020.</p>			
MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
ACARÁ	FORMALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO CIGERS – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	- CONTINUAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NO QUE DIZ RESPEITO À FORMAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS – CIGERS;	20% DAS ATIVIDADES REALIZADAS
LIMOEIRO DO AJURU	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	- ENTREGA DO PRODUTO FINAL REFERENTE AO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU.	100% DO INSTRUMENTO ELABORADO
BAIÃO (Demanda Espontânea)	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	- EM FASE DE ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA.	INICIANDO AS AÇÕES
OEIRAS DO PARÁ (Demanda Espontânea)	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	- EM FASE DE ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA.	INICIANDO AS AÇÕES

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

Com relação à execução financeira, da dotação inicial de R\$ 1.898,00¹ para atender a Região Tocantins durante o ano de 2020, houve a necessidade de atualizar o valor programado para R\$ 2.600,80² de modo a garantir o desenvolvimento da *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* nesta região. Esta divergência *orçamento planejado x orçamento executado* deve-se, principalmente, ao valor estabelecido no teto orçamentário disponibilizado para Sedop ser insuficiente para o desenvolvimento das atividades de apoio técnico.

Finalizando, considerando o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* na Região Tocantins no exercício de 2020, foi *Abaixo do Esperado*. No entanto, vale ressaltar que, a obtenção do produto desta ação, bem como o alcance da meta física estabelecida não está totalmente na governabilidade da Sedop. Os municípios contemplados têm grande influência para que o desempenho da referida ação seja conforme o programado.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020.

REGIÃO XINGU					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ALTAMIRA, ANAPU, BRASIL NOVO, MEDICILÂNDIA, PACAJÁ, PORTO DE MOZ, SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, URUARÁ, VITÓRIA DO XINGU.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2020	12 INSTRUMENTOS ELABORADOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020			
<p>Com o objetivo de subsidiar tecnicamente os municípios em ações de investimento em instrumentos de saneamento básico, a Sedop desenvolve a <i>Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico</i> simultaneamente em várias Regiões de Integração.</p> <p>Para o ano de 2020, a Sedop planejou atender os seguintes municípios da Região Rio Xingu: Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu. Ressaltamos que, para o desenvolvimento desta ação, são necessárias várias visitas técnicas aos municípios, as quais tiveram suas programações alteradas devido à pandemia da COVID – 19.</p> <p>No entanto, a Sedop conseguiu desenvolver algumas atividades de monitoramento e controle através de contato telefônico, mensagem eletrônica e grupos de WhatsApp formados por municípios, para cada ação de instrumento na área de saneamento.</p> <p>É necessário ressaltar que nem todos os municípios programados puderam ser acompanhados através das mídias disponíveis. Exemplo disso são os municípios de Altamira, Anapu, Medicilândia, Pacajá, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu que não puderam ser trabalhados em 2020 e serão revistos na programação física e financeira para o ano de 2021.</p> <p>Quanto à execução física, a ação foi desenvolvida apenas no município de Brasil Novo. A tabela abaixo sintetiza as principais atividades realizadas neste município no decorrer do ano de 2020.</p>			
MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
BRASIL NOVO	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	- CAPACITAÇÕES TÉCNICAS E AUXÍLIO NA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAL; - ORIENTAÇÕES QUANTO A EXECUÇÃO DAS ETAPAS DE FORMULAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS E MOBILIZAÇÃO URBANA.	30% DAS ATIVIDADES REALIZADAS
<p>Com relação à execução financeira, embora a ação tenha recebido um aporte orçamentário de R\$ 28.364,00² para o desenvolvimento desta ação na Região Xingu durante o ano de 2020, conforme explicado anteriormente, por conta da pandemia os técnicos da Sedop não puderam realizar o apoio técnico <i>in loco</i> o que, conseqüentemente, não gerou dispêndios financeiros.</p>			

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020.

Entretanto, foram executados R\$ 708.743,50 além do valor programado. Esta situação ocorreu devido a uma execução orçamentária na natureza de despesa 449051- Obras e Instalações, a qual não é prevista nesta ação para a aplicação dos recursos. Trata-se da obra “*Construção de 01 (Um) Galpão de Triagem para Resíduos Sólidos, Inclusive Projetos*” financiada com recursos oriundos da Confederação Andina de Fomento – CAF, a qual deveria ter sido empenhada e paga na *Ação 7644. Implantação de Aterros Sanitários*. Identificado este equívoco, a Sedop, se compromete em não mais cometer esta falha na execução orçamentária para no ano de 2021.

Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* na Região Xingu no exercício de 2020, foi *Abaixo do Esperado*. No entanto, vale ressaltar que, a obtenção do produto desta ação, bem como o alcance da meta física estabelecida não está totalmente na governabilidade da Sedop. Os municípios contemplados têm grande influência para que o desempenho da referida ação seja conforme o programado.

4.1.9. AÇÃO 8694. APOIO TÉCNICO-INSTITUCIONAL NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO

REGIÃO ARAGUAIA					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: BANNACH, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PAU D'ARCO, REDENÇÃO, SÃO FÉLIX DO XINGU, XINGUARA.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2020	6 INSTRUMENTOS ELABORADOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Com o objetivo de subsidiar tecnicamente os municípios na elaboração e revisão dos Planos Diretores, Planos de Mobilidade, Lei de Perímetro Urbano, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei de Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária, a Sedop desenvolve a *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* simultaneamente em várias Regiões de Integração.

Para o ano de 2020, a Sedop planejou atender os seguintes municípios da Região Araguaia: Bannach, Conceição do Araguaia, Pau D'arco, Redenção, São Félix do Xingu e Xinguara. Ressaltamos que, para o desenvolvimento desta ação, são necessárias várias visitas técnicas aos municípios, as quais não puderam acontecer devido à pandemia da COVID – 19. No entanto, a Sedop conseguiu desenvolver algumas atividades de monitoramento e controle através de contato telefônico, mensagem eletrônica e grupos de WhatsApp formados por municípios, para cada ação de instrumento urbanístico.

É necessário ressaltar que nem todos os municípios programados puderam ser acompanhados através das mídias disponíveis. Exemplo disso são os municípios de Banach, Conceição do Araguaia e Pau D'arco que não puderam ser trabalhados em 2020 e serão revistos na programação física e financeira para o ano de 2021.

Quanto aos municípios de Redenção, São Félix do Xingu e Xinguara, a execução física ocorreu conforme tabela abaixo:

MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
REDENÇÃO	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- CAPACITAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA CONCEPÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE; - ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS, INVENTÁRIOS E FINALIZAÇÃO DE MAPAS TEMÁTICOS DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA.	30% DOS PRODUTOS REALIZADOS
	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	- CAPACITAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUANTO AS ETAPAS NECESSÁRIAS À REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL; - ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO PRELIMINAR, MAPAS TEMÁTICOS E RELATÓRIOS VIÁRIOS PARA SEGUNDA ETAPA DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL.	30% DOS PRODUTOS REALIZADOS
SÃO FÉLIX DO XINGU	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS; - EM FASE DE ELABORAÇÃO DA MINUTA DO PROJETO DE LEI.	80% DOS PRODUTOS REALIZADOS
	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	- ORIENTAÇÕES AOS GRUPOS DE TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ATUAL E ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS PARA AUDIÊNCIAS SETORIAIS.	50% DOS PRODUTOS REALIZADOS
XINGUARA	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- TODAS AS ATIVIDADES FORAM CONCLUÍDAS COM ÊXITO E COM A APROVAÇÃO DA MINUTA DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA.	100% DOS PRODUTOS DA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA.

Com relação à execução financeira, no segundo semestre de 2020 houve uma pequena movimentação financeira referente a despesas de custeio (diárias). Conforme explicado anteriormente, por conta da pandemia os técnicos da Sedop não puderam realizar o apoio técnico *in loco* no primeiro semestre o que, conseqüentemente, não gerou dispêndios financeiros.

Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* na Região Baixo Amazonas no exercício de 2020, foi *Abaixo do Esperado*. No entanto, vale ressaltar que, a obtenção do produto desta ação, bem como o alcance da meta física estabelecida não está totalmente na governabilidade da Sedop. Os municípios contemplados têm grande influência para que o desempenho da referida ação seja conforme o programado.

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

REGIÃO BAIXO AMAZONAS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ALENQUER, CURUÁ, JURUTI, MONTE ALEGRE, ÓBIDOS, ORIXIMINÁ, SANTARÉM, TERRA SANTA.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2020	8 INSTRUMENTOS ELABORADOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020					
<p>Com o objetivo de subsidiar tecnicamente os municípios na elaboração e revisão dos Planos Diretores, Planos de Mobilidade, Lei de Perímetro Urbano, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei de Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária, a Sedop desenvolve a <i>Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano</i> simultaneamente em várias Regiões de Integração.</p> <p>Para o ano de 2020, a Sedop planejou atender os seguintes municípios da Região Baixo Amazonas: Alenquer, Curuá, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Santarém e Terra Santa. Ressaltamos que, para o desenvolvimento desta ação, são necessárias várias visitas técnicas aos municípios, as quais não puderam acontecer devido à pandemia da COVID – 19. No entanto, a Sedop conseguiu desenvolver algumas atividades de monitoramento e controle através de contato telefônico, mensagem eletrônica e grupos de WhatsApp formados por municípios, para cada ação de instrumento urbanístico.</p> <p>É necessário ressaltar que nem todos os municípios programados puderam ser acompanhados através das mídias disponíveis. Exemplo disso é o município de Monte Alegre, que não pôde ser trabalhado em 2020 e será revisto na programação física e financeira para o ano de 2021.</p> <p>Com relação ao município de Santarém, não há ações desenvolvidas. O mesmo atua como município polo, por tratar-se de uma via de transbordo para as viagens destinadas aos municípios do Baixo Amazonas.</p> <p>Quanto à execução física, a tabela a seguir sintetiza as atividades desenvolvidas na Região Baixo Amazonas no decorrer do ano de 2020.</p>					

MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
ALENQUER	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS, INVENTÁRIOS, ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE MAPAS TEMÁTICOS E RELATÓRIOS VIÁRIOS.	50% DOS PRODUTOS REALIZADOS
	LEGISLAÇÕES URBANÍSTICAS (Implementação e revisão)	- TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 10/2020 ASSINADO. OBJETO: IMPLEMENTAÇÃO E REVISÃO DAS LEGISLAÇÕES URBANÍSTICAS (LEI DE PERÍMETRO URBANO, PARCELAMENTO DE SOLO, CÓDIGO TRIBUTÁRIO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ELABORAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO); - ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTES A ELABORAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO.	20% DOS PRODUTOS REALIZADOS
CURUÁ	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS DO INVENTÁRIO PRELIMINAR, ELABORAÇÃO DE MAPAS TEMÁTICOS E RELATÓRIOS VIÁRIOS.	30% DO MATERIAL ELABORADO PARA DIAGNÓSTICO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA.
JURUTI	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS; - EM FASE DE FINALIZAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.	35% DOS PRODUTOS REALIZADOS
ÓBIDOS	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS; - EM FASE DE FINALIZAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.	35% DOS PRODUTOS REALIZADOS
ORIXIMINÁ	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- TODAS AS ATIVIDADES FORAM CONCLUÍDAS COM ÊXITO E COM A APROVAÇÃO DA MINUTA DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA.	100% DOS PRODUTOS DA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA.
	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	- BASE CARTOGRÁFICA DO MUNICÍPIO ATUALIZADA, CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA; - INICIADO O CADASTRO DAS FAMÍLIAS QUE SERÃO BENEFICIADAS COM A TITULAÇÃO.	40% DOS PRODUTOS REALIZADOS
TERRA SANTA	LEGISLAÇÕES URBANÍSTICAS (Implementação e revisão)	- TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 125/2018. OBJETO: IMPLEMENTAÇÃO E REVISÃO DAS LEGISLAÇÕES URBANÍSTICAS (LEI DE PERÍMETRO URBANO, PARCELAMENTO DE SOLO, CÓDIGO TRIBUTÁRIO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ELABORAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO); - ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTES A ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTO URBANÍSTICO NO QUE DIZ RESPEITO A LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO E REVISÃO DA LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO.	40% DOS PRODUTOS REALIZADOS

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

Com relação à execução financeira, da dotação inicial de R\$ 2.344,00¹ para atender a Região Baixo Amazonas durante o ano de 2020, houve a necessidade de atualizar o valor programado em cerca de R\$ 1.454,08 para o desenvolvimento da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* nesta região. Esta divergência *orçamento planejado x orçamento executado* deve-se, principalmente, ao valor estabelecido no teto orçamentário disponibilizado para Sedop ser insuficiente para o desenvolvimento das atividades de apoio técnico.

Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* na Região Baixo Amazonas no exercício de 2020, foi *Abaixo do Esperado*. No entanto, vale ressaltar que, a obtenção do produto desta ação, bem como o alcance da meta física estabelecida não está totalmente na governabilidade da Sedop. Os municípios contemplados têm grande influência para que o desempenho da referida ação seja conforme o programado.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020.

REGIÃO CARAJÁS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ELDORADO DOS CARAJÁS, MARABÁ, PARAUAPEBAS, SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2020	4 INSTRUMENTOS ELABORADOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Com o objetivo de subsidiar tecnicamente os municípios na elaboração e revisão dos Planos Diretores, Planos de Mobilidade, Lei de Perímetro Urbano, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei de Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária, a Sedop desenvolve a *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* simultaneamente em várias Regiões de Integração.

Para o ano de 2020, a Sedop planejou atender os seguintes municípios da Região Carajás: Eldorado dos Carajás, Marabá, Parauapebas e São Domingos Do Araguaia. Ressaltamos que, para o desenvolvimento desta ação, são necessárias várias visitas técnicas aos municípios, as quais não puderam acontecer devido à pandemia da COVID – 19. No entanto, a Sedop conseguiu desenvolver algumas atividades de monitoramento e controle através de contato telefônico, mensagem eletrônica e grupos de WhatsApp formados por municípios, para cada ação de instrumento urbanístico.

É necessário ressaltar que nem todos os municípios programados puderam ser acompanhados através das mídias disponíveis. Exemplo disso são os municípios de Parauapebas e São Domingos do Araguaia, que não puderam ser trabalhados em 2020, portanto serão revistos na programação física e financeira para o ano de 2021.

Com relação ao município de Marabá, não há ações desenvolvidas. O mesmo atua como município polo, por tratar-se de uma via de transbordo para as viagens destinadas aos municípios vizinhos.

Quanto à execução física, a tabela a seguir sintetiza as atividades desenvolvidas na Região Carajás no decorrer do ano de 2020.

MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
ELDORADO DOS CARAJÁS	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO PRELIMINAR; - ELABORAÇÃO DE MAPAS TEMÁTICOS E RELATÓRIOS VIÁRIOS.	30% DO MATERIAL TÉCNICO ELABORADO

Com relação à execução financeira, do orçamento programado de R\$ 1.168,00 ², no segundo semestre de 2020 houve movimentação financeira de cerca de 66% do valor total, referente a despesas de custeio (diárias). Conforme explicado anteriormente, por conta da pandemia os técnicos da Sedop não puderam realizar o apoio técnico *in loco* no primeiro semestre o que, conseqüentemente, não gerou dispêndios financeiros.

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO - 04/12/2020.

Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* na Região Carajás no exercício de 2020, foi *Abaixo do Esperado*. No entanto, vale ressaltar que, a obtenção do produto desta ação, bem como o alcance da meta física estabelecida não está totalmente na governabilidade da Sedop. Os municípios contemplados têm grande influência para que o desempenho da referida ação seja conforme o programado.

REGIÃO GUAJARÁ**MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS:** MARITUBA.

PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2020	1 INSTRUMENTO ELABORADO
----------------	------------------------------	----------------	-----------	------------------	--------------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Com o objetivo de subsidiar tecnicamente os municípios na elaboração e revisão dos Planos Diretores, Planos de Mobilidade, Lei de Perímetro Urbano, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei de Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária, a Sedop desenvolve a *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* simultaneamente em várias Regiões de Integração.

Para o ano de 2020, a Sedop planejou atender o município de Marituba na Região Guajará. No entanto, não houve demanda para este município no período vigente, o que faz com que a Sedop reveja a programação física e financeira da Região Guajará para o ano de 2021.

Sendo assim, considerando que não houve desempenho físico e nem financeiro da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* na Região Guajará no exercício de 2020, o desenvolvimento da mesma foi *Abaixo do Esperado*.

REGIÃO GUAMÁ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: CASTANHAL, CURUÇÁ, IGARAPÉ-AÇU, INHANGAPI, MARACANÃ, MARAPANIM, SANTA IZABEL DO PARÁ, SANTA MARIA DO PARÁ, SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ, SÃO CAETANO DE ODIVELAS, SÃO DOMINGOS DO CAPIM, SÃO FRANCISCO DO PARÁ, SÃO MIGUEL DO GUAMÁ.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2020	13 INSTRUMENTOS ELABORADOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020					
<p>Com o objetivo de subsidiar tecnicamente os municípios na elaboração e revisão dos Planos Diretores, Planos de Mobilidade, Lei de Perímetro Urbano, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei de Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária, a Sedop desenvolve a <i>Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano</i> simultaneamente em várias Regiões de Integração.</p> <p>Para o ano de 2020, a Sedop planejou atender os seguintes municípios da Região Guamá: Castanhal, Curuçá, Igarapé-Açu, Inhangapi, Maracanã, Marapanim, Santa Izabel Do Pará, Santa Maria Do Pará, Santo Antônio Do Tauá, São Caetano De Odiveles, São Domingos Do Capim, São Francisco Do Pará e São Miguel Do Guamá.</p> <p>Ressaltamos que, para o desenvolvimento desta ação, são necessárias várias visitas técnicas aos municípios, as quais não puderam acontecer devido à pandemia da COVID – 19. No entanto, a Sedop conseguiu desenvolver algumas atividades de monitoramento e controle através de contato telefônico, mensagem eletrônica e grupos de WhatsApp formados por municípios, para cada ação de instrumento urbanístico.</p> <p>É necessário ressaltar que nem todos os municípios programados puderam ser acompanhados através das mídias disponíveis. Exemplo disso são os municípios de Curuçá, Igarapé-Açu, Inhangapi, Maracanã, Santa Izabel do Pará, Santa Maria do Pará, Santo Antônio do Tauá, São Caetano de Odiveles e São Francisco do Pará, os quais não puderam ser trabalhados em 2020, portanto serão revistos na programação física e financeira para o ano de 2021.</p> <p>Quanto à execução física, a tabela a seguir sintetiza as atividades desenvolvidas na Região Guamá no decorrer do ano de 2020.</p>					

MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
CASTANHAL	LEGISLAÇÕES URBANÍSTICAS (Implementação e revisão)	- TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 07/2020 OBJETO: IMPLEMENTAÇÃO E REVISÃO DAS LEGISLAÇÕES URBANÍSTICAS (LEI DE PERÍMETRO URBANO, PARCELAMENTO DE SOLO, CÓDIGO TRIBUTÁRIO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ELABORAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO); - ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTES A ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTO URBANÍSTICO NO QUE DIZ RESPEITO A LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO E REVISÃO DA LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO.	30% DOS PRODUTOS REALIZADOS
MARAPANIM	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS E DOCUMENTOS PARA CONCEPÇÃO DO PLANO.	10% ATIVIDADES INICIADAS
	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	- ORIENTAÇÕES AOS GRUPOS DE TRABALHO PARA: - ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ATUAL; - LEITURAS COMPARTILHADAS; - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA.	70% DOS PRODUTOS REALIZADOS
SÃO DOMINGOS DO CAPIM	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E RELATÓRIOS VIÁRIOS.	20% DOS PRODUTOS REALIZADOS
	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	- ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS TEMÁTICAS, SEMINÁRIOS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS.	25% DOS PRODUTOS REALIZADOS
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- REALIZADA PRIMEIRA REUNIÃO TÉCNICA COM PREFEITO E SECRETÁRIOS, OBJETIVANDO COLETAR INFORMAÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL DO MUNICÍPIO; - EM FASE DE ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA.	10% ATIVIDADES INICIADAS

Com relação à execução financeira, da dotação inicial de R\$ 3.474,00² para atender a Região Guamá durante o ano de 2020, houve a necessidade de atualizar o valor programado em cerca de R\$ 798,84 para o desenvolvimento da Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano nesta região. Esta divergência orçamento planejado x orçamento executado deve-se, principalmente, ao valor estabelecido no teto orçamentário disponibilizado para sedop ser insuficiente para o desenvolvimento das atividades de apoio técnico.

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020.

Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* na Região Guamá no exercício de 2020, foi *Abaixo do Esperado*. No entanto, vale ressaltar que, a obtenção do produto desta ação, bem como o alcance da meta física estabelecida não está totalmente na governabilidade da Sedop. Os municípios contemplados têm grande influência para que o desempenho da referida ação seja conforme o programado.

REGIÃO LAGO DE TUCURUÍ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: BREU BRANCO, JACUNDÁ, TUCURUÍ.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2020	3 INSTRUMENTOS ELABORADOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Com o objetivo de subsidiar tecnicamente os municípios na elaboração e revisão dos Planos Diretores, Planos de Mobilidade, Lei de Perímetro Urbano, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei de Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária, a Sedop desenvolve a *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* simultaneamente em várias Regiões de Integração.

Para o ano de 2020, a Sedop planejou atender os seguintes municípios da Região Lago de Tucuruí: Breu Branco, Jacundá e Tucuruí.

Ressaltamos que, para o desenvolvimento desta ação, são necessárias várias visitas técnicas aos municípios, as quais não puderam acontecer devido à pandemia da COVID – 19. No entanto, a Sedop conseguiu desenvolver algumas atividades de monitoramento e controle através de contato telefônico, mensagem eletrônica e grupos de WhatsApp formados por municípios, para cada ação de instrumento urbanístico.

É necessário ressaltar que nem todos os municípios programados puderam ser acompanhados através das mídias disponíveis. Exemplo disso são os municípios de Jacundá e Tucuruí, os quais não puderam ser trabalhados em 2020, portanto serão revistos na programação física e financeira para o ano de 2021.

Quanto à execução física, a tabela a seguir sintetiza as atividades desenvolvidas na Região Guamá no decorrer do ano de 2020.

MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
BREU BRANCO	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.	40% DOS PRODUTOS REALIZADOS
	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	- ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS TEMÁTICAS, SEMINÁRIOS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS.	50% DOS PRODUTOS DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL.

Com relação à execução financeira, da dotação inicial de R\$ 793,00² para atender a Região Guamá durante o ano de 2020, houve a necessidade de atualizar o valor programado em cerca de R\$ 987,35 para o desenvolvimento da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* nesta região. Esta divergência *orçamento planejado x orçamento executado* deve-se, principalmente, ao valor

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – XX/12/2020.

estabelecido no teto orçamentário disponibilizado para Sedop ser insuficiente para o desenvolvimento das atividades de apoio técnico.

Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* na Região Lago de Tucuruí no exercício de 2020, foi Abaixo do Esperado. No entanto, vale ressaltar que, a obtenção do produto desta ação, bem como o alcance da meta física estabelecida não está totalmente na governabilidade da Sedop. Os municípios contemplados têm grande influência para que o desempenho da referida ação seja conforme o programado.

REGIÃO MARAJÓ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: AFUÁ, BAGRE, BREVES, CACHOEIRA DO ARARI, CHAVES, CURRALINHO, GURUPÁ, MUANÁ, PORTEL, SALVATERRA, SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, SOURE.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2020	12 INSTRUMENTOS ELABORADOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020					
<p>Com o objetivo de subsidiar tecnicamente os municípios na elaboração e revisão dos Planos Diretores, Planos de Mobilidade, Lei de Perímetro Urbano, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei de Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária, a Sedop desenvolve a <i>Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano</i> simultaneamente em várias Regiões de Integração.</p> <p>Para o ano de 2020, a Sedop planejou atender os seguintes municípios da Região Marajó: Afuá, Bagre, Breves, Cachoeira do Arari, Chaves, Curralinho, Gurupá, Muaná, Portel, Salvaterra, São Sebastião da Boa Vista e Soure.</p> <p>Ressaltamos que, para o desenvolvimento desta ação, são necessárias várias visitas técnicas aos municípios, as quais não puderam acontecer devido à pandemia da COVID – 19. No entanto, a Sedop conseguiu desenvolver algumas atividades de monitoramento e controle através de contato telefônico, mensagem eletrônica e grupos de WhatsApp formados por municípios, para cada ação de instrumento urbanístico.</p> <p>É necessário ressaltar que nem todos os municípios programados puderam ser acompanhados através das mídias disponíveis. Exemplo disso são os municípios de Afuá, Bagre, Breves, Cachoeira do Arari, Chaves, Curralinho, Muaná, Salvaterra, São Sebastião da Boa Vista e Soure, os quais não puderam ser trabalhados em 2020, portanto serão revistos na programação física e financeira para o ano de 2021.</p> <p>Quanto à execução física, na Região Marajó, a ação foi desenvolvida tanto nos municípios programados (Gurupá e Portel), quanto em município atendido por meio de demanda espontânea, como é o caso do município de Ponta de Pedras.</p> <p>A tabela abaixo sintetiza as principais atividades desenvolvidas nestes municípios no decorrer do ano de 2020.</p>					

MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
GURUPÁ	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, MAPAS TEMÁTICOS E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS.	20% DOS PRODUTOS REALIZADOS
	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	- ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS TEMÁTICAS, SEMINÁRIOS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS.	20% DOS PRODUTOS REALIZADOS
PORTEL	REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- CONCLUÍDA AS ETAPAS DE REVISÃO DO PLANO, BEM COMO AS ALTERAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 07/2018.	100% DOS PRODUTOS REALIZADOS
	LEGISLAÇÕES URBANÍSTICAS (Implementação e revisão)	- ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTES A ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTO URBANÍSTICO NO QUE DIZ RESPEITO A LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO E REVISÃO DA LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO.	30% DOS PRODUTOS REALIZADOS
PONTA DE PEDRAS (Demanda Espontânea)	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- REALIZADA PRIMEIRA REUNIÃO TÉCNICA COM PREFEITO E SECRETÁRIOS, OBJETIVANDO COLETAR INFORMAÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL DO MUNICÍPIO; - EM FASE DE ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA.	10% DOS PRODUTOS REALIZADOS
	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	- REALIZADA PRIMEIRA REUNIÃO TÉCNICA COM PREFEITO E SECRETÁRIOS, OBJETIVANDO COLETAR INFORMAÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL DO MUNICÍPIO; - EM FASE DE ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA.	10% DOS PRODUTOS REALIZADOS

Com relação à execução financeira, do orçamento programado de R\$ 3.516,00 ², no segundo semestre de 2020 houve movimentação financeira de cerca de 17% do valor total, referente a despesas de custeio (diárias). Conforme explicado anteriormente, por conta da pandemia os técnicos da Sedop não puderam realizar o apoio técnico *in loco* no primeiro semestre o que, conseqüentemente, não gerou dispêndios financeiros.

Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* na Região Marajó no exercício de 2020, foi *Abaixo do Esperado*. No entanto, vale ressaltar que, a obtenção do produto desta ação, bem como o alcance da meta física estabelecida não está totalmente na governabilidade da Sedop. Os municípios contemplados têm grande influência para que o desempenho da referida ação seja conforme o programado.

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO - 04/12/2020.

REGIÃO RIO CAETÉ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: AUGUSTO CORRÊA, BRAGANÇA, CAPANEMA, PRIMAVERA, SALINÓPOLIS, SANTA LUZIA DO PARÁ, SÃO JOÃO DE PIRABAS, TRACUATEUA.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2020	8 INSTRUMENTOS ELABORADOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020					
<p>Com o objetivo de subsidiar tecnicamente os municípios na elaboração e revisão dos Planos Diretores, Planos de Mobilidade, Lei de Perímetro Urbano, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei de Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária, a Sedop desenvolve a <i>Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano</i> simultaneamente em várias Regiões de Integração.</p> <p>Para o ano de 2020, a Sedop planejou atender os seguintes municípios da Região Rio Caeté: Augusto Corrêa, Bragança, Capanema, Primavera, Salinópolis, Santa Luzia Do Pará, São João de Pirabas e Tracuateua.</p> <p>Ressaltamos que, para o desenvolvimento desta ação, são necessárias várias visitas técnicas aos municípios, as quais não puderam acontecer devido à pandemia da COVID – 19. No entanto, a Sedop conseguiu desenvolver algumas atividades de monitoramento e controle através de contato telefônico, mensagem eletrônica e grupos de WhatsApp formados por municípios, para cada ação de instrumento urbanístico.</p> <p>É necessário ressaltar que nem todos os municípios programados puderam ser acompanhados através das mídias disponíveis. Exemplo disso são os municípios de Primavera, Salinópolis, Santa Luzia Do Pará, São João de Pirabas e Tracuateua, os quais não puderam ser trabalhados em 2020, portanto serão revistos na programação física e financeira para o ano de 2021.</p> <p>Quanto à execução física, a tabela a seguir sintetiza as atividades desenvolvidas na Região Rio Caeté no decorrer do ano de 2020.</p>					

MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
AUGUSTO CORRÊA	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- TODAS AS ATIVIDADES FORAM CONCLUÍDAS COM ÊXITO E COM A APROVAÇÃO DA MINUTA DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA.	100% DOS PRODUTOS DA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA.
	LEGISLAÇÕES URBANÍSTICAS (Implementação e revisão)	- ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTES A ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTO URBANÍSTICO NO QUE DIZ RESPEITO A LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO E MAPAS TEMÁTICOS PARA ATUALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE BAIROS E CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO – CTM.	30% DOS PRODUTOS REALIZADOS
BRAGANÇA	REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- ORIENTAÇÕES À EQUIPE TÉCNICA DO MUNICÍPIO PARA ANÁLISE E AJUSTES NECESSÁRIOS PARA REVISÃO DO PLANO E ALTERAÇÕES NO PROJETO DE LEI.	30% DOS PRODUTOS REALIZADOS
CAPANEMA	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- ORIENTAÇÕES À EQUIPE TÉCNICA DO MUNICÍPIO PARA ELABORAÇÃO, ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS NAS AUDIÊNCIAS DISTRITAIS E SEDE DO MUNICÍPIO.	30% DOS PRODUTOS REALIZADOS

Com relação à execução financeira, do orçamento programado de R\$ 2.301,00², no primeiro semestre de 2020 houve movimentação financeira de cerca de 83% do valor total, referente a despesas de custeio (diárias). Conforme explicado anteriormente, por conta da pandemia os técnicos da Sedop não puderam dar continuidade ao apoio técnico *in loco* no segundo semestre o que, conseqüentemente, não gerou dispêndios financeiros.

Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* na Região Caeté no exercício de 2020, foi *Abaixo do Esperado*. No entanto, vale ressaltar que, a obtenção do produto desta ação, bem como o alcance da meta física estabelecida não está totalmente na governabilidade da Sedop. Os municípios contemplados têm grande influência para que o desempenho da referida ação seja conforme o programado.

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO - 04/12/2020.

REGIÃO RIO CAPIM					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: AURORA DO PARÁ, BUJARU, CAPITÃO POÇO, CONCÓRDIA DO PARÁ, GARRAFÃO DO NORTE, IRITUIA, MÃE DO RIO, RONDON DO PARÁ, ULIANÓPOLIS.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2020	9 INSTRUMENTOS ELABORADOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020					
<p>Com o objetivo de subsidiar tecnicamente os municípios na elaboração e revisão dos Planos Diretores, Planos de Mobilidade, Lei de Perímetro Urbano, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei de Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária, a Sedop desenvolve a <i>Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano</i> simultaneamente em várias Regiões de Integração.</p> <p>Para o ano de 2020, a Sedop planejou atender os seguintes municípios da Região Rio Capim: Aurora do Pará, Bujaru, Capitão Poço, Concórdia do Pará, Garrafão do Norte, Irituia, Mãe do Rio, Rondon do Pará e Ulianópolis.</p> <p>Ressaltamos que, para o desenvolvimento desta ação, são necessárias várias visitas técnicas aos municípios, as quais não puderam acontecer devido à pandemia da COVID – 19. No entanto, a Sedop conseguiu desenvolver algumas atividades de monitoramento e controle através de contato telefônico, mensagem eletrônica e grupos de WhatsApp formados por municípios, para cada ação de instrumento urbanístico.</p> <p>É necessário ressaltar que nem todos os municípios programados puderam ser acompanhados através das mídias disponíveis. Exemplo disso são os municípios de Aurora do Pará, Capitão Poço, Garrafão do Norte, Irituia e Mãe do Rio, os quais não puderam ser trabalhados em 2020, portanto serão revistos na programação física e financeira para o ano de 2021.</p> <p>Quanto à execução física, na Região Rio Capim, a ação foi desenvolvida tanto nos municípios programados (Bujaru, Concórdia do Pará, Rondon do Pará e Ulianópolis), quanto em município atendido por meio de demanda espontânea, como é o caso do município de Tomé Açu.</p> <p>A tabela abaixo sintetiza as principais atividades desenvolvidas nestes municípios no decorrer do ano de 2020.</p>					

MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
BUJARU	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, PEÇAS TÉCNICAS E INVENTÁRIO PRELIMINAR.	20% DOS PRODUTOS REALIZADOS
	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	- REALIZAÇÃO DE OFICINA METODOLÓGICA DE ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, INVENTÁRIO PRELIMINAR E MAPAS TEMÁTICOS.	20% DOS PRODUTOS REALIZADOS
CONCÓRDIA DO PARÁ	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- TODAS AS ATIVIDADES FORAM CONCLUÍDAS COM ÊXITO E COM A APROVAÇÃO DA MINUTA DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA.	100% DOS PRODUTOS DA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA.
RONDON DO PARÁ	LEGISLAÇÕES URBANÍSTICAS (Implementação e Revisão)	- ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTES A ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTO URBANÍSTICO NO QUE DIZ RESPEITO A LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO E MAPAS TEMÁTICOS PARA ATUALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE BAIRROS E ENQUADRAMENTO CONFORME LEI FEDERAL Nº 13.465/2017.	30% DOS PRODUTOS REALIZADOS
ULIANÓPOLIS	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- ORIENTAÇÕES VISANDO ANÁLISE DAS PEÇAS TÉCNICAS, MAPAS TEMÁTICOS E RELATÓRIOS DE ATIVIDADES CONFORME O PLANO DE TRABALHO.	50% DOS PRODUTOS REALIZADOS
	LEGISLAÇÕES URBANÍSTICAS (Implementação e Revisão)	- ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTES A ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTO URBANÍSTICO NO QUE DIZ RESPEITO A LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO E MAPAS TEMÁTICOS PARA ATUALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE BAIRROS E ENQUADRAMENTO CONFORME LEI FEDERAL Nº 13.465/2017.	30% DOS PRODUTOS REALIZADOS
TOMÉ AÇU (Demanda Espontânea)	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, INVENTÁRIO PRELIMINAR E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS DA PRIMEIRA ETAPA DO PLANO.	20% DOS PRODUTOS REALIZADOS
	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	- REALIZAÇÃO DE OFICINA METODOLÓGICA DE ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, INVENTÁRIO PRELIMINAR E MAPAS TEMÁTICOS.	20% DOS PRODUTOS REALIZADOS

Com relação à execução financeira, no segundo semestre de 2020 houve uma pequena movimentação financeira referente a despesas de custeio (diárias). Conforme explicado anteriormente, por conta da pandemia os técnicos da Sedop não puderam realizar o apoio técnico *in loco* no primeiro semestre o que, conseqüentemente, não gerou dispêndios financeiros.

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* na Região Rio Capim no exercício de 2020, foi *Abaixo do Esperado*. No entanto, vale ressaltar que, a obtenção do produto desta ação, bem como o alcance da meta física estabelecida não está totalmente na governabilidade da Sedop. Os municípios contemplados têm grande influência para que o desempenho da referida ação seja conforme o programado.

REGIÃO TAPAJÓS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ITAITUBA, NOVO PROGRESSO, RURÓPOLIS.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2020	3 INSTRUMENTOS ELABORADOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Com o objetivo de subsidiar tecnicamente os municípios na elaboração e revisão dos Planos Diretores, Planos de Mobilidade, Lei de Perímetro Urbano, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei de Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária, a Sedop desenvolve a *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* simultaneamente em várias Regiões de Integração.

Para o ano de 2020, a Sedop planejou atender os municípios de Itaituba, Novo Progresso e Rurópolis na Região Tapajós. No entanto, não houve demanda para estes municípios no período vigente, o que faz com que a Sedop reveja a programação física e financeira da Região Tapajós para o ano de 2021.

Sendo assim, considerando que não houve desempenho físico e nem financeiro da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* na Região Tapajós no exercício de 2020, o desenvolvimento da mesma foi *Abaixo do Esperado*.

REGIÃO TOCANTINS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ABAETETUBA, ACARÁ, BAIÃO, CAMETÁ, IGARAPÉ-MIRI, LIMOEIRO DO AJURU, MOCAJUBA, MOJU, OEIRAS DO PARÁ, TAILÂNDIA.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2020	10 INSTRUMENTOS ELABORADOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020					
<p>Com o objetivo de subsidiar tecnicamente os municípios na elaboração e revisão dos Planos Diretores, Planos de Mobilidade, Lei de Perímetro Urbano, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei de Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária, a Sedop desenvolve a <i>Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano</i> simultaneamente em várias Regiões de Integração.</p> <p>Para o ano de 2020, a Sedop planejou atender os seguintes municípios da Região Tocantins: Abaetetuba, Acará, Baião, Cametá, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Moju, Oeiras do Pará e Tailândia.</p> <p>Ressaltamos que, para o desenvolvimento desta ação, são necessárias várias visitas técnicas aos municípios, as quais não puderam acontecer devido à pandemia da COVID – 19. No entanto, a Sedop conseguiu desenvolver algumas atividades de monitoramento e controle através de contato telefônico, mensagem eletrônica e grupos de WhatsApp formados por municípios, para cada ação de instrumento urbanístico.</p> <p>É necessário ressaltar que nem todos os municípios programados puderam ser acompanhados através das mídias disponíveis. Exemplo disso são os municípios de Igarapé-Miri, Mocajuba, Moju e Tailândia, os quais não puderam ser trabalhados em 2020, portanto serão revistos na programação física e financeira para o ano de 2021.</p> <p>Quanto à execução física, a tabela abaixo sintetiza as principais atividades desenvolvidas na Região Tocantins no decorrer do ano de 2020.</p>					

MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
ABAETETUBA	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- TODAS AS ATIVIDADES FORAM CONCLUÍDAS COM ÊXITO E COM A APROVAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR DE MOBILIDADE URBANA.	100% DOS PRODUTOS DA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA.
ACARÁ	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, INTERVENÇÕES E ELABORAÇÃO DA MINUTA DO PROJETO DE LEI DA MOBILIDADE.	45% DOS PRODUTOS REALIZADOS
BAIÃO	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, INTERVENÇÕES E ELABORAÇÃO DA MINUTA DO PROJETO DE LEI DA MOBILIDADE.	45% DOS PRODUTOS REALIZADOS
CAMETÁ	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS DA PRIMEIRA ETAPA.	20% DOS PRODUTOS REALIZADOS
	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	- REALIZAÇÃO DE OFICINA METODOLÓGICA COM TÉCNICOS DO MUNICÍPIO PARA AS ORIENTAÇÕES NECESSÁRIAS E ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA REVISÃO DO PDM.	20% DOS PRODUTOS REALIZADOS
LIMOEIRO DO AJURU	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO PRELIMINAR, MAPAS TEMÁTICOS E RELATÓRIOS VIÁRIOS.	25% DOS PRODUTOS REALIZADOS
OEIRAS DO PARÁ	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.	10% DAS ATIVIDADES INICIADAS
	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	- ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DAS ETAPAS DE REVISÃO, PLANO DE AÇÃO E CRONOGRAMA DE TRABALHO.	30% DOS PRODUTOS REALIZADOS

Com relação à execução financeira, Conforme explicado anteriormente, por conta da pandemia os técnicos da Sedop não puderam realizar o apoio técnico *in loco* o que, conseqüentemente, não gerou dispêndios financeiros.

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* na Região Tocantins no exercício de 2020, foi *Abaixo do Esperado*. No entanto, vale ressaltar que, a obtenção do produto desta ação, bem como o alcance da meta física estabelecida não está totalmente na governabilidade da Sedop. Os municípios contemplados têm grande influência para que o desempenho da referida ação seja conforme o programado.

REGIÃO XINGU					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ALTAMIRA, ANAPU, BRASIL NOVO, MEDICILÂNDIA, PACAJÁ, PLACAS, PORTO DE MOZ, SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, URUARÁ.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2020	9 INSTRUMENTOS ELABORADOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020					
<p>Com o objetivo de subsidiar tecnicamente os municípios na elaboração e revisão dos Planos Diretores, Planos de Mobilidade, Lei de Perímetro Urbano, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei de Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária, a Sedop desenvolve a <i>Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano</i> simultaneamente em várias Regiões de Integração.</p> <p>Para o ano de 2020, a Sedop planejou atender os municípios de Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Placas, Porto De Moz, Senador José Porfírio e Uruará na Região Xingu.</p> <p>Ressaltamos que, para o desenvolvimento desta ação, são necessárias várias visitas técnicas aos municípios, as quais iniciaram em janeiro de 2020. Ocorre que com a pandemia da COVID – 19 as visitas foram suspensas e nem todos os municípios programados puderam ser acompanhados através das mídias disponíveis.</p> <p>Acrescenta-se a este cenário o fato de não ter havido demandas para estes município no período vigente, o que faz com que a Sedop reveja a programação física e financeira da Região Xingu para o ano de 2021.</p> <p>Sendo assim, considerando que não houve desempenho físico e o baixo desempenho financeiro da <i>Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano</i> na Região Xingu no exercício de 2020, o desenvolvimento da mesma foi <i>Abaixo do Esperado</i>.</p>					

4.2. PROGRAMA 1508 GOVERNANÇA PÚBLICA

AÇÕES GOVERNAMENTAIS:

7552. CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS ESTADUAIS.

7556. APOIO A CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS DE UTILIZAÇÃO PÚBLICA.

7679. PROMOÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS E INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E SOCIAL.

8233. EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

8238. GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

8887. CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS.

8890. FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL.

4.2.1 AÇÃO 7552. CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS ESTADUAIS

REGIÃO GUAJARÁ					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: BELÉM					
PRODUTO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2020	1

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

O desenvolvimento da *Ação 7552. Construção e Conservação de Imóveis Públicos Estaduais*, busca atender dois objetivos quanto à gestão de imóveis públicos estaduais:

1. Construir edificações públicas a partir das necessidades de prestação de serviços à população;
2. Preservar as edificações públicas para melhor servir a população.

Por se tratar de uma ação comum a vários órgãos e por ser responsabilidade institucional da Sedop “... executar obras e serviços de engenharia e arquitetura do Estado...”, a referida ação tem como característica e execução de obras além das que são de responsabilidade orçamentária da Sedop, através de destaque orçamentário. É importante destacar que esta situação impacta diretamente na execução física e financeira desta ação.

Originalmente, esta ação é programada pela Sedop para atender apenas a Região Guajará, entretanto, no decorrer do ano de 2020, houve dispêndios financeiros relacionados a obras executadas, indenizações e pagamento de reajuste, através de destaque orçamentário, em várias regiões de integração. A tabela abaixo sintetiza as obras executadas além da Região Guajará.

REGIÃO INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA
ARAGUAIA	RIO MARIA	REFORMA E ADAPTAÇÃO DO QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR
CARAJÁS	MARABÁ	CONSTRUÇÃO DO BATALHÃO GRUPO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DA POLÍCIA MILITAR. (OBRA CONCLUÍDA EM 2018 COM PAGAMENTO DE REAJUSTE EM 2020)
		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM. (INDENIZAÇÕES)
TOCANTINS	BARCARENA	REFORMA DO PRÉDIO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER.

FONTE: DIFIS/SEDOP – NOVEMBRO/2020.

Para o ano de 2020, a Sedop programou 01 (uma) construção e reforma de imóvel público no município de Belém. No entanto, no decorrer do ano foram executadas 05 (cinco) obras a mais do que foi planejado para o município de Belém, destas, 02 (duas) foram concluídas:

1. Reforma da Quadra de esportes do 1º Comando Aéreo Regional – CASSAZUM;
2. Reforma e ampliação da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração – SEPLAD.

Com relação à execução financeira, foram investidos cerca de R\$ 1.220.444,39¹ no desenvolvimento de obras, ultrapassando o valor de R\$ 31.500,00² planejado para o ano de 2020. Este descompasso deve-se aos seguintes fatores:

- No momento da elaboração do orçamento para o ano de 2020, não havia demanda de obras para serem executadas nesta ação, por isto, considerando a limitação do teto orçamentário na fonte 0101, associada ao grande número de obras em execução na referida fonte, foi programado um valor representativo para manter esta ação ativa;

- O quantitativo de obras executadas nesta ação foi muito acima do programado (01 obra), sendo isto o principal agente catalisador para que a execução financeira superasse em muito valor estabelecido para o ano de 2020.

No entanto, por mais que a execução financeira da *Ação 7552. Construção e Conservação de Imóveis Públicos Estaduais* tenha excedido em muito o valor programado para o ano de 2020, o fato de a meta física ter sido superada certifica esta ação o status de *Conforme o Programado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

4.2.2.AÇÃO 7556. APOIO A CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS DE UTILIZAÇÃO PÚBLICA

REGIÃO ARAGUAIA					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: ÁGUA AZUL DO NORTE, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, RIO MARIA, SANTANA DO ARAGUAIA, XINGUARA.					
PRODUTO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2020	6

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Através do desenvolvimento da Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização, a Sedop executa obras que valorizam os espaços sociais nos municípios paraenses. Para o ano de 2020, foi programada a execução desta ação em cinco municípios da Região Araguaia: Água Azul do Norte (uma obra), Conceição do Araguaia (duas obras), Rio Maria (uma obra), Santa do Araguaia (uma obra) e Xinguara (uma obra).

Das seis obras, quatro foram proposições para o ano de 2020 atendendo os municípios de Água Azul do Norte, Conceição do Araguaia, Santana do Araguaia e Xinguara. No entanto, conforme já amplamente divulgado em outras ações governamentais executadas pela Sedop, com o cenário pandêmico que se estabeleceu no começo de 2020 e que perdura até os dias atuais, as tratativas para início de novas obras ficaram prejudicadas, principalmente, devido à suspensão das viagens dos técnicos da Sedop, as quais são fundamentais para a caracterização da área do projeto e diagnóstico da situação atual. Ainda assim, a Sedop conseguiu desempenhar o cronograma físico e financeiro na obra *“Construção do Centro Comunitário Cultural Diocese da Santíssima Trindade”*, no município de Conceição do Araguaia.

Os serviços nas obras de *“Construção do Terminal de Transportes Alternativos e Praça de Alimentação”*, seguem conforme cronograma físico e financeiro e com previsão de conclusão para o ano 2021.

No que diz respeito à Região Araguaia, apesar de algumas obras previstas para iniciarem não acontecerem, buscando cumprir sua competência institucional de *“... executar obras e serviços de engenharia e arquitetura do Estado...”*, durante o ano de 2020, a Sedop executou física e financeiramente os serviços nas obras *“Construção de Feira Livre Coberta de Pequeno Porte no Núcleo da Vila Canadá”* e *“Construção da Praça do Paço Municipal”*, ambas no município de Água Azul do Norte, e *“Construção do Prédio da Câmara Municipal”*, no município de Conceição do Araguaia, através de destaque orçamentário.

Faz-se necessário destacar que, como a Sedop é o órgão responsável por receber demandas para execução de obras que vão além das obras que são de sua responsabilidade orçamentária, ressaltamos que a referida ação tem como uma de suas características a execução de um volume significativo de obras através de destaque orçamentário. Esta situação influencia diretamente no desempenho físico e financeiro desta ação, principalmente por evidenciar a divergência entre o que foi planejado como meta física e

financeira, e o que foi executado.

Quanto à execução financeira, para o ano de 2020 o orçamento programado para o desenvolvimento desta ação na Região Araguaia foi de R\$ 645.170,00¹. No entanto, foram utilizados cerca de R\$ 730.793,40², ultrapassando a meta financeira estabelecida para o ano de 2020 em 13%³.

Esta majoração deve-se principalmente pela execução de obras através de destaque orçamentário, o que demandou a necessidade de atualizar a dotação orçamentária inicial em R\$ 85.623,40 (13%).

Por fim, diante do exposto e por não ter atingido a meta física estipulada, o desempenho físico e financeiro da para a *Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização* na Região Araguaia, no exercício de 2020, foi *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

³ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

REGIÃO BAIXO AMAZONAS					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: ALMEIRIM, CURUÁ, JURUTI, MONTE ALEGRE, SANTARÉM					
PRODUTO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2020	6

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020					
<p>Através do desenvolvimento da Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública, a Sedop executa obras que valorizam os espaços sociais nos municípios paraenses. Para o ano de 2020, foi programada a execução desta ação em cinco municípios da Região Baixo Amazonas: Almeirim (uma obra), Curuá (uma obra), Juruti (uma obra), Monte Alegre (uma obra) e Santarém (duas obras).</p> <p>Das seis obras, cinco foram proposições para o ano de 2020 atendendo os municípios supracitados, destas quatro foram previstas para serem executadas com recurso provenientes da Caixa Econômica Federal (CEF). No entanto, conforme já amplamente divulgado em outras ações governamentais executadas pela Sedop, com o cenário pandêmico que se estabeleceu no começo de 2020 e que perdura até os dias atuais, as tratativas para início de novas obras ficaram prejudicadas, principalmente, devido à suspensão das viagens dos técnicos da Sedop, as quais são fundamentais para a caracterização da área do projeto e diagnóstico da situação atual.</p> <p>Entretanto, ainda que a conjuntura social possa ter afetado o avanço de algumas ações, a execução da ação no município de Santarém foi concluída em 2020, através da obra de <i>“Conclusão da Obra do Ginásio Poliesportivo para 5.000 Pessoas”</i>.</p> <p>Outro aspecto importante a ser ressaltado é a execução da ação nos municípios que não foram contemplados nos instrumentos de planejamento do órgão por ser proveniente de emenda parlamentar, como por exemplo: o município de Mojuí dos Campos, com a obra de <i>“Construção da Câmara Municipal”</i>, que teve sua conclusão em 2020, e a obra de <i>“Construção do Estádio Municipal”</i> em Terra Santa, que segue como o cronograma programado e tem 65% de percentual físico executado, com previsão de término para 2021.</p> <p>Faz-se necessário destacar que, como a Sedop é o órgão responsável por receber demandas para execução de obras que vão além das obras que são de sua responsabilidade orçamentária, ressaltamos que a referida ação tem como uma de suas características a execução de um volume significativo de obras através de destaque orçamentário. Esta situação influencia diretamente no desempenho físico e financeiro desta ação, principalmente por evidenciar a divergência entre o que foi planejado como meta física e financeira, e o que foi executado.</p> <p>No que diz respeito à Região Baixo Amazonas, apesar das obras previstas para iniciarem não acontecerem, buscando cumprir sua competência institucional de <i>“... executar obras e serviços de engenharia e arquitetura do Estado...”</i>, durante o ano de 2020, a Sedop executou física e financeiramente à obra <i>“Reforma de Pista de Lazer na Avenida Sérgio Henn”</i>, no município de Santarém, e <i>“Construção de Praça Pública”</i>, no município de Juruti, através de destaque orçamentário. Por fim, diante do exposto e por não ter atingido a meta física estipulada, o desempenho físico e financeiro da para a Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização na Região Baixo Amazonas, no exercício de 2020, foi <i>Abaixo do Esperado</i>.</p>					

REGIÃO CARAJÁS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, SÃO JOÃO DO ARAGUAIA					
PRODUTO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2020	2

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020
<p>Através do desenvolvimento da <i>Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização</i>, a Sedop executa obras que valorizam os espaços sociais nos municípios paraenses. Para o ano de 2020, foi programada a execução desta ação em dois municípios da Região Carajás: São Domingos do Araguaia e São João do Araguaia.</p> <p>As duas obras planejadas foram proposições para o ano de 2020 atendendo os municípios supracitados. No entanto, conforme já amplamente divulgado em outras ações governamentais executadas pela Sedop, com o cenário pandêmico que se estabeleceu no começo de 2020 e que perdura até os dias atuais, as tratativas para início de novas obras ficaram prejudicadas, principalmente, devido à suspensão das viagens dos técnicos da Sedop, as quais são fundamentais para a caracterização da área do projeto e diagnóstico da situação atual.</p> <p>Outro aspecto importante a ser ressaltado é a execução da ação no município Marabá, com o desenvolvimento dos serviços da obra <i>“Iluminação do Campo Parque São Jorge”</i> e que, embora não tenha sido contemplado nos instrumentos de planejamento do órgão por ser proveniente de emenda parlamentar, a Sedop é responsável pela execução financeira através de destaque orçamentário, conforme mencionado anteriormente.</p> <p>Faz-se necessário destacar que, como a Sedop é o órgão responsável por receber demandas para execução de obras que vão além das obras que são de sua responsabilidade orçamentária, ressaltamos que a referida ação tem como uma de suas características a execução de um volume significativo de obras através de destaque orçamentário. Esta situação influencia diretamente no desempenho físico e financeiro desta ação, principalmente por evidenciar a divergência entre o que foi planejado como meta física e financeira, e o que foi executado.</p> <p>Quanto à execução financeira, para o ano de 2020 o orçamento programado para o desenvolvimento desta ação na Região Carajás foi de R\$ 266.666,00¹, sendo utilizados cerca de R\$ 209.115,25², o que equivale à execução financeira de 78%³ do valor total planejado para o ano de 2020.</p> <p>Por fim, diante do exposto e por não ter atingido a meta física estipulada, o desempenho físico e financeiro da para a <i>Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização</i> na Região Carajás, no exercício de 2020, foi <i>Abaixo do Esperado</i>.</p>

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

³ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

REGIÃO GUAJARÁ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ANANINDEUA, BELÉM, SANTA BÁRBARA					
PRODUTO	OBRA	UNIDADE	UN	META 2020	5

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Através do desenvolvimento da *Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização*, a Sedop executa obras que valorizam os espaços sociais nos municípios paraenses. Para o ano de 2020, foi programada a execução desta ação em três municípios da Região Guajará: Ananindeua (três obras), Belém (uma obra) e Santa Bárbara (uma obra).

Das cinco obras, duas foram proposições para o ano de 2020 atendendo os municípios de Belém e Santa Bárbara. No entanto, conforme já amplamente divulgado em outras ações governamentais executadas pela Sedop, com o cenário pandêmico que se estabeleceu no começo de 2020 e que perdura até os dias atuais, as tratativas para início de novas obras ficaram prejudicadas, principalmente, devido à suspensão das viagens dos técnicos da Sedop, as quais são fundamentais para a caracterização da área do projeto e diagnóstico da situação atual. Ainda assim, a Sedop conseguiu desempenhar o cronograma físico e financeiro na obra “Reforma e Revitalização de Praças”, no município de Belém.

Quanto aos serviços na obra de “*Construção do Mercado e Revitalização da Praça das Águas Lindas*”, no município de Ananindeua, seguem conforme cronograma físico e financeiro e com previsão de conclusão para o ano 2021.

No que diz respeito à Região Guajará, apesar das obras previstas para iniciarem não acontecerem, buscando cumprir sua competência institucional de “... *executar obras e serviços de engenharia e arquitetura do Estado...*”, durante o ano de 2020, a Sedop executou física e financeiramente à obra “*Reforma da Praça Tio Carlito*” e contratou empresa para elaboração e execução do projeto de arquitetura e complementares de engenharia para execução da obra de “*Reforma e Ampliação da Câmara Municipal*”, ambas no município de Ananindeua, através de destaque orçamentário.

Faz-se necessário destacar que, como a Sedop é o órgão responsável por receber demandas para execução de obras que vão além das obras que são de sua responsabilidade orçamentária, ressaltamos que a referida ação tem como uma de suas características a execução de um volume significativo de obras através de destaque orçamentário. Esta situação influencia diretamente no desempenho físico e financeiro desta ação, principalmente por evidenciar a divergência entre o que foi planejado como meta física e financeira, e o que foi executado.

Quanto à execução financeira, para o ano de 2020 o orçamento programado para o desenvolvimento desta ação na Região Guajará foi de R\$ 821.360,00¹, sendo utilizados cerca de R\$ 723.022,74², o que equivale à execução financeira de 88%³ do valor total planejado para o ano de 2020.

Por fim, diante do exposto e por não ter atingido a meta física estipulada, o desempenho físico e financeiro da para a *Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização* na Região Guajará, no exercício de 2020, foi *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

³ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

REGIÃO GUAMÁ					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: CASTANHAL, SANTA IZABEL DO PARÁ, SÃO DOMINGOS DO CAPIM					
PRODUTO	OBRA	UNIDADE	UN	META 2020	3

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Através do desenvolvimento da *Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública*, a Sedop executa obras que valorizam os espaços sociais nos municípios paraenses. Para o ano de 2020, foi programada a execução desta ação em três municípios da Região Guamá: Castanhal, Santa Izabel do Pará e São Domingos do Capim.

As três obras planejadas foram proposições para o ano de 2020 atendendo os municípios supracitados. No entanto, conforme já amplamente divulgado em outras ações governamentais executadas pela Sedop, com o cenário pandêmico que se estabeleceu no começo de 2020 e que perdura até os dias atuais, as tratativas para início de novas obras ficaram prejudicadas, principalmente, devido à suspensão das viagens dos técnicos da Sedop, as quais são fundamentais para a caracterização da área do projeto e diagnóstico da situação atual.

No que diz respeito à Região Guamá, apesar das obras previstas para iniciarem não acontecerem, buscando cumprir sua competência institucional de “... executar obras e serviços de engenharia e arquitetura do Estado...”, durante o ano de 2020, a Sedop executou física e financeiramente à obra “*Construção do Galpão Metálico da Sede Paroquial Esporte Clube*” e “*Reforma e Revitalização da Feira CEASA*”, ambas no município de Castanhal, através de destaque orçamentário.

Outro aspecto importante a ser ressaltado é a execução da ação no município Colares, com o desenvolvimento dos serviços da obra “*Urbanização da Orla com a Construção do Palco e Quiosques*” e que, embora não tenha sido contemplado nos instrumentos de planejamento do órgão por ser proveniente de emenda parlamentar, a Sedop é responsável pela execução financeira através de destaque orçamentário, conforme mencionado anteriormente.

Faz-se necessário destacar que, como a Sedop é o órgão responsável por receber demandas para execução de obras que vão além das obras que são de sua responsabilidade orçamentária, ressaltamos que a referida ação tem como uma de suas características a execução de um volume significativo de obras através de destaque orçamentário. Esta situação influencia diretamente no desempenho físico e financeiro desta ação, principalmente por evidenciar a divergência entre o que foi planejado como meta física e financeira, e o que foi executado.

Quanto à execução financeira, para o ano de 2020 o orçamento programado para o desenvolvimento desta ação na Região Guamá foi de R\$ 1.147.125,00¹. No entanto, foram utilizados cerca de R\$ 1.425.724,45², ultrapassando a meta financeira estabelecida para o ano de 2020 em 24%³.

Esta majoração deve-se principalmente pela execução de obras através de destaque orçamentário, o que demandou a necessidade de atualizar a dotação orçamentária inicial em

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

³ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

R\$ 278.599,45 (24%).

Por fim, diante do exposto e por não ter atingido a meta física estipulada, o desempenho físico e financeiro da para a *Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização* na Região Guamá, no exercício de 2020, foi *Abaixo do Esperado*.

REGIÃO MARAJÓ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: AFUÁ, CHAVES, CURRALINHO, MUANÁ, SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA					
PRODUTO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2020	6

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020
<p>Através do desenvolvimento da <i>Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização</i>, a Sedop executa obras que valorizam os espaços sociais nos municípios paraenses. Para o ano de 2020, foi programada a execução desta ação em três municípios da Região Marajó: Afuá, Chaves, Curralinho, Muaná, São Sebastião da Boa Vista.</p> <p>Das seis obras planejadas, três foram proposições para o ano de 2020 atendendo os municípios supracitados. No entanto, conforme já amplamente divulgado em outras ações governamentais executadas pela Sedop, com o cenário pandêmico que se estabeleceu no começo de 2020 e que perdura até os dias atuais, as tratativas para início de novas obras ficaram prejudicadas, principalmente, devido à suspensão das viagens dos técnicos da Sedop, as quais são fundamentais para a caracterização da área do projeto e diagnóstico da situação atual.</p> <p>No que diz respeito à Região Marajó, apesar das obras previstas para iniciarem não acontecerem, buscando cumprir sua competência institucional de “... executar obras e serviços de engenharia e arquitetura do Estado...”, durante o ano de 2020, a Sedop executou física e financeiramente à obra “<i>Construção de Passarela em Concreto Armado</i>”, executada no município de São Sebastião da Boa Vista.</p> <p>Faz-se necessário destacar que, como a Sedop é o órgão responsável por receber demandas para execução de obras que vão além das obras que são de sua responsabilidade orçamentária, ressaltamos que a referida ação tem como uma de suas características a execução de um volume significativo de obras através de destaque orçamentário. Esta situação influencia diretamente no desempenho físico e financeiro desta ação, principalmente por evidenciar a divergência entre o que foi planejado como meta física e financeira, e o que foi executado.</p> <p>Quanto à execução financeira, para o ano de 2020 o orçamento programado para o desenvolvimento desta ação na Região Marajó foi de R\$ 181.605,00¹. No entanto, foram utilizados cerca de R\$ 4.618.484,19².</p> <p>Esta majoração deve-se principalmente pela execução de obras através de destaque orçamentário, o que demandou a necessidade de atualizar a dotação orçamentária inicial em R\$ 4.436.879,19.</p> <p>Por fim, diante do exposto e por não ter atingido a meta física estipulada, o desempenho físico e financeiro da para a <i>Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização</i> na Região Marajó, no exercício de 2020, foi <i>Abaixo do Esperado</i>.</p>

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

RIO CAETÉ					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: CAPANEMA					
PRODUTO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2020	3

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Através do desenvolvimento da *Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização*, a Sedop executa obras que valorizam os espaços sociais nos municípios paraenses. Para o ano de 2020, foi programada a execução desta ação em um município da Região Rio Caeté: Capanema (três obras), destas uma foi proposição para o ano de 2020, *“Execução da Reforma de uma Estação Comercial Pública”*.

Das três obras planejadas para serem executadas no exercício de 2020, a Sedop concluiu os serviços na obra *“Construção da Praça da Bíblia de Capanema”*. Quanto as outras obras previstas, seguem em execução com previsão de conclusão para o ano 2021.

Outro aspecto importante a ser ressaltado é a execução da ação no município Cachoeira do Piriá, com o desenvolvimento dos serviços da obra *“Construção de uma Praça Pública”* e que, embora não tenha sido contemplado nos instrumentos de planejamento do órgão, a Sedop é responsável pela execução financeira através de destaque orçamentário.

Faz-se necessário destacar que, como a Sedop é o órgão responsável por receber demandas para execução de obras que vão além das obras que são de sua responsabilidade orçamentária, ressaltamos que a referida ação tem como uma de suas características a execução de um volume significativo de obras através de destaque orçamentário. Esta situação influencia diretamente no desempenho físico e financeiro desta ação, principalmente por evidenciar a divergência entre o que foi planejado como meta física e financeira, e o que foi executado.

Quanto à execução financeira, para o ano de 2020 o orçamento programado para o desenvolvimento desta ação na Região Rio Caeté foi de R\$ 2.760.020,00¹, foram utilizados cerca de R\$ 2.556.519,75², o que equivale à execução financeira de 93%³ do valor total planejado para o ano de 2020.

Por fim, diante do exposto e por não ter atingido a meta física estipulada, o desempenho físico e financeiro da para a *Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização* na Região Rio Caeté, no exercício de 2020, foi *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

³ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

REGIÃO RIO CAPIM					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: DOM ELISEU, GARRAFÃO DO NORTE, MÃE DO RIO, NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, RONDON DO PARÁ					
PRODUTO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2020	7

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020
<p>Através do desenvolvimento da <i>Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública</i>, a Sedop executa obras que valorizam os espaços sociais nos municípios paraenses. Para o ano de 2020, foi programada a execução desta ação em cinco municípios da Região Rio Capim: Dom Eliseu, Garrafão do Norte, Mãe do Rio, Nova Esperança do Piriá e Rondon do Pará.</p> <p>Das sete obras planejadas, seis foram proposições para o ano de 2020 atendendo os municípios supracitados. No entanto, conforme já amplamente divulgado em outras ações governamentais executadas pela Sedop, com o cenário pandêmico que se estabeleceu no começo de 2020 e que perdura até os dias atuais, as tratativas para início de novas obras ficaram prejudicadas, principalmente, devido à suspensão das viagens dos técnicos da Sedop, as quais são fundamentais para a caracterização da área do projeto e diagnóstico da situação atual.</p> <p>No que diz respeito à Região Rio Capim, apesar das obras previstas para iniciarem não acontecerem, buscando cumprir sua competência institucional de “... executar obras e serviços de engenharia e arquitetura do Estado...”, durante o ano de 2020, a Sedop executou física e financeiramente à obra “<i>Construção de uma Praça na Comunidade Fundo de Pote</i>” e “<i>Construção da Feira Coberta</i>”, ambas no município de Garrafão do Norte, através de destaque orçamentário.</p> <p>Outro aspecto importante a ser ressaltado é a execução da ação nos municípios de Aurora do Pará, com o desenvolvimento dos serviços da obra “<i>Revitalização das Praça Juscelino Kubistchek</i>”, Capitão Poço, com os serviços na obra “<i>Construção de Feira Coberta</i>”, Paragominas, com a execução da obra “<i>Construção do Muro Frontal do Cemitério Público</i>” e Ourém nas obras “<i>Construção de um Centro de Convivência para Idosos, Vila Arraial do Caeté</i>” e a obra “<i>Construção de Uma Arena Esportiva, Vila Rio Vermelho</i>”. Embora não tenha sido contemplado nos instrumentos de planejamento do órgão por ser proveniente de emenda parlamentar, a Sedop é responsável pela execução financeira através de destaque orçamentário, conforme mencionado anteriormente.</p> <p>Faz-se necessário destacar que, como a Sedop é o órgão responsável por receber demandas para execução de obras que vão além das obras que são de sua responsabilidade orçamentária, ressaltamos que a referida ação tem como uma de suas características a execução de um volume significativo de obras através de destaque orçamentário. Esta situação influencia diretamente no desempenho físico e financeiro desta ação, principalmente por evidenciar a divergência entre o que foi planejado como meta física e financeira, e o que foi executado.</p>

Quanto à execução financeira, para o ano de 2020 o orçamento programado para o desenvolvimento desta ação na Região Rio Capim foi de R\$ 809.177,00¹. No entanto, foram utilizados cerca de R\$ 1.839.408,20², ultrapassando a meta financeira estabelecida para o ano de 2020. Esta majoração deve-se principalmente pela execução de obras através de destaque orçamentário, o que demandou a necessidade de atualizar a dotação orçamentária inicial em R\$ 505.231,20.

Por fim, diante do exposto e por não ter atingido a meta física estipulada, o desempenho físico e financeiro da para a *Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização* na Região Rio Capim, no exercício de 2020, foi *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

REGIÃO TAPAJÓS					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: ITAITUBA					
PRODUTO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2020	1

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020					
<p>Através do desenvolvimento da <i>Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública</i>, a Sedop executa obras que valorizam os espaços sociais nos municípios paraenses. Para o ano de 2020, foi programada a execução desta ação em um município da Região Tapajós: Itaituba.</p> <p>Um aspecto importante a ser ressaltado é a execução da ação nos municípios que não foram contemplados nos instrumentos de planejamento do órgão por ser proveniente de emenda parlamentar, como por exemplo: o município de Rurópolis, com a obra de <i>“Execução das Obras de Construção de Praça”</i> e a obra de <i>“Construção de Praça”</i> em Trairão, ambas concluídas e entregues em 2020.</p> <p>Faz-se necessário destacar que, como a Sedop é o órgão responsável por receber demandas para execução de obras que vão além das obras que são de sua responsabilidade orçamentária, ressaltamos que a referida ação tem como uma de suas características a execução de um volume significativo de obras através de destaque orçamentário. Esta situação influencia diretamente no desempenho físico e financeiro desta ação, principalmente por evidenciar a divergência entre o que foi planejado como meta física e financeira, e o que foi executado.</p> <p>No que diz respeito à Região Tapajós, buscando cumprir sua competência institucional de <i>“... executar obras e serviços de engenharia e arquitetura do Estado...”</i>, durante o ano de 2020, a Sedop executou física e financeiramente, no município de Itaituba, a obra <i>“Construção de Praça no Distrito de Miritituba”</i>, obra concluída e entregue em 2020. A <i>“Construção de Abrigo Infantil”</i>, apresentando execução de acordo como programado no cronograma, com previsão de término para 2021.</p> <p>Quanto à execução financeira, para o ano de 2020 o orçamento programado para o desenvolvimento desta ação na Região Tapajós foi de R\$ 197.080,00¹, sendo utilizados cerca de R\$ 801.360,73².</p> <p>Esta majoração deve-se principalmente pela execução de obras através de destaque orçamentário, o que demandou a necessidade de atualizar a dotação orçamentária inicial.</p> <p>Por fim, diante do exposto e por não ter atingido a meta física estipulada, o desempenho físico e financeiro da para a <i>Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização</i> na Região Tapajós, no exercício de 2020, foi <i>Conforme Programado</i>.</p>					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

REGIÃO TOCANTINS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: LIMOEIRO DO AJURU, MOJU					
PRODUTO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2020	3

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Através do desenvolvimento da *Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública*, a Sedop executa obras que valorizam os espaços sociais nos municípios paraenses. Para o ano de 2020, foi programada a execução desta ação em cinco municípios da Região Tocantins: Limoeiro do Ajuru (uma obra) e Moju (duas obras).

As obras foram proposições para o ano de 2020 atendendo os municípios supracitados. No entanto, conforme já amplamente divulgado em outras ações governamentais executadas pela Sedop, com o cenário pandêmico que se estabeleceu no começo de 2020 e que perdura até os dias atuais, as tratativas para início de novas obras ficaram prejudicadas, principalmente, devido à suspensão das viagens dos técnicos da Sedop, as quais são fundamentais para a caracterização da área do projeto e diagnóstico da situação atual.

Outro aspecto importante a ser ressaltado é a execução da ação nos municípios que não foram contemplados nos instrumentos de planejamento do órgão por ser proveniente de emenda parlamentar, como por exemplo: o município de Acará, através do desenvolvimento dos serviços nas obras *“Drenagem e Revitalização do Parque da Cidade”* e *“Revitalização da Praça da Bíblia e Construção da Praça de Alimentação”*, que seguem como o cronograma programado e previsão de conclusão para 2021. Assim como, a execução da ação em Barcarena, com a obra *“Construção de Gabião e Colchão Reno na Orla da Praia Sirituba, na Ilha de Trambioca”*, que segue conforme cronograma planejado e previsão de conclusão para 2021

Faz-se necessário destacar que, como a Sedop é o órgão responsável por receber demandas para execução de obras que vão além das obras que são de sua responsabilidade orçamentária, ressaltamos que a referida ação tem como uma de suas características a execução de um volume significativo de obras através de destaque orçamentário. Esta situação influencia diretamente no desempenho físico e financeiro desta ação, principalmente por evidenciar a divergência entre o que foi planejado como meta física e financeira, e o que foi executado.

No que diz respeito à Região Tocantins, apesar de algumas obras previstas para iniciarem não acontecerem, buscando cumprir sua competência institucional de *“... executar obras e serviços de engenharia e arquitetura do Estado...”*, durante o ano de 2020, a Sedop executou física e financeiramente os serviços na obra *“Construção de uma Escola em Alvenaria com 06 Salas de Aula, na Zona Rural”*, no município de Limoeiro do Ajuru, através de destaque orçamentário.

Quanto à execução financeira, para o ano de 2020 o orçamento programado para o desenvolvimento desta ação na Região Tocantins foi de R\$ 20.688,00¹. No entanto, foram utilizados cerca de R\$ 852.261,81², ultrapassando a meta financeira estabelecida para o ano de 2020.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

Esta majoração deve-se principalmente pela execução de obras através de destaque orçamentário, o que demandou a necessidade de atualizar a dotação orçamentária inicial.

Por fim, diante do exposto e por não ter atingido a meta física estipulada, o desempenho físico e financeiro da para a *Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização* na Região Tocantins, no exercício de 2020, foi *Abaixo do Esperado*.

REGIÃO XINGU					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: PLACAS					
PRODUTO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2020	1

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020					
<p>Através do desenvolvimento da <i>Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública</i>, a Sedop executa obras que valorizam os espaços sociais nos municípios paraenses. Para o ano de 2020, foi programada a execução desta ação no município de Placas, na Região Xingu.</p> <p>Ainda que a conjuntura social possa ter afetado o avanço de algumas ações, a execução da ação no município de Placas, através da obra de <i>“Construção de uma Quadra Poliesportiva, Rua Antônio R. Gomes com a Travessa Boa Esperança”</i>, apresenta execução dos serviços de acordo como programado no cronograma, com previsão de término para 2021.</p> <p>Um aspecto importante a ser ressaltado é a execução da ação nos municípios que não foram contemplados nos instrumentos de planejamento do órgão por ser proveniente de emenda parlamentar, como por exemplo: o município de Pacajá, com a obra de <i>“Construção de 03 Pontes em Concreto, na Zona Urbana”</i> e a obra de <i>“Reforma e Revitalização da Feira do Agricultor na Sede do Município”</i> em Senador José Porfírio, ambas seguem com a execução dos serviços como o cronograma programado, com previsão de término para 2021.</p> <p>Faz-se necessário destacar que, como a Sedop é o órgão responsável por receber demandas para execução de obras que vão além das obras que são de sua responsabilidade orçamentária, ressaltamos que a referida ação tem como uma de suas características a execução de um volume significativo de obras através de destaque orçamentário. Esta situação influencia diretamente no desempenho físico e financeiro desta ação, principalmente por evidenciar a divergência entre o que foi planejado como meta física e financeira, e o que foi executado.</p> <p>No que diz respeito à Região Xingu e, buscando cumprir sua competência institucional de <i>“... executar obras e serviços de engenharia e arquitetura do Estado...”</i>, durante o ano de 2020, a Sedop executou física e financeiramente a obra <i>“Construção de uma Praça”</i>, no município de Placas, através de destaque orçamentário.</p> <p>Quanto à execução financeira, para o ano de 2020 o orçamento programado para o desenvolvimento desta ação na Região Xingu foi de R\$ 203.992,00¹, foram utilizados cerca de R\$ 673.158,64².</p> <p>Esta majoração deve-se principalmente pela execução de obras através de destaque orçamentário, o que demandou a necessidade de atualizar a dotação orçamentária inicial.</p> <p>Por fim, diante do exposto e por não ter atingido a meta física estipulada, o desempenho físico e financeiro da para a <i>Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização</i> na Região Xingu, no exercício de 2020, foi <i>Abaixo do Esperado</i>.</p>					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

4.2.3. AÇÃO 8233. EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

REGIÃO GUAJARÁ					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO:					
PRODUTO	ATO PUBLICADO	UNIDADE	UN	META 2020	1.100 ATOS PUBLICADOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020
<p>Com objetivo de contribuir com o fortalecimento da gestão e da governança com transparência, a Ação 8233. Edição e Publicação de Atos da Administração Pública integra o conjunto de ações que cooperam com um dos objetivos do Programa Governança Pública que é de <i>“Prover A Governabilidade Do Poder Executivo”</i>.</p> <p>Na ação Edição e Publicação de atos Administrativos, esta secretaria editou e publicou, até início de dezembro de 2020, 13931 atos no Diário Oficial do Estado, com média/mês de, aproximadamente, 126 atos (Portarias), gerando um custo, até o momento, de R\$ 94.365,50, conforme limites orçamentários e financeiros programados, respeitando ao Princípio da Publicidade na Administração Pública, assim como a transparência à sociedade.</p> <p>Ressaltamos que em decorrência da Pandemia Covid-19 minimizamos o fluxo de viagens aos servidores, preservando-os sua saúde e qualidade de vida, conseqüentemente, diminuindo a quantidade de publicações referentes às diárias, porém, fazemos destaques para a diminuição de custos com publicações, não havendo prejuízos aos resultados planejados.</p> <p>Por fim, a Sedop informa que o desempenho físico e financeiro da ação está Conforme o Programado.</p>

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO - 04/12/2020.

4.2.4. AÇÃO 8238. GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

REGIÃO GUAJARÁ					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: BELÉM					
PRODUTO	SERVIÇO REALIZADO	UNIDADE	UN	META 2020	1 SERVIÇO REALIZADO

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

A ação Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação tem em sua essência a função principal de prover a Sedop infraestrutura computacional de alta disponibilidade e soluções de tecnologia de informação e comunicação para a implementação e a gestão dos programas finalísticos.

Em 2020, a Sedop manteve o contrato de transmissão de dados com a PRODEPA bem como adquiriu licenças de software.

Com relação à execução financeira, para o ano de 2020 foi programado o valor de R\$ 303.000,00¹, entretanto foram utilizados R\$ 486.030,56. O valor excedido corresponde a aquisição de 12 licenças do software Architecture Engineering & Construction Collection - Single User pelo período de 36 meses da fabricante AUTODESK.

Por fim, ressaltamos que o desempenho físico e financeiro da *Ação 8238. Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação* na Região Guajará durante o ano de 2020 foi *Conforme o Programado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO EM 04/12/2020

4.2.5.AÇÃO 8887. CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS

REGIÃO BAIXO AMAZONAS					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: SANTARÉM					
PRODUTO	AGENTE CAPACITADO	UNIDADE	UN	META 2020	3 AGENTES CAPACITADOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Reconhecendo a importância de capacitação dos servidores lotados nos núcleos regionais da Sedop, a *Ação 8887. Capacitação de Agentes Públicos* visa oportunizar o acesso ao aperfeiçoamento e, por conseguinte, maior eficiência no desenvolvimento das ações institucionais.

Com orçamento de R\$550,00¹ previsto para o ano de 2020 e tendo como meta a capacitação de 03 agentes públicos, esta ação não realizou o programado para 2020, considerando os Decretos Governamentais de medidas de enfrentamento a pandemia de Covid-19 e possui status *Abaixo do Esperado*.

Entretanto, ressaltamos o compromisso em reverter este cenário assim que possível, uma vez que a atual gestão reconhece a relevância de promover ações de capacitação para que os servidores possam atender com qualidade os diferentes setores da sociedade.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020.

REGIÃO CARAJÁS					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: MARABÁ					
PRODUTO	AGENTE CAPACITDO	UNIDADE	UN	META 2020	3 AGENTES CAPACITADOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Reconhecendo a importância de capacitação dos servidores lotados nos núcleos regionais da Sedop, a *Ação 8887. Capacitação de Agentes Públicos* visa oportunizar o acesso ao aperfeiçoamento e, por conseguinte, maior eficiência no desenvolvimento das ações institucionais.

Com orçamento de R\$550,00¹ previsto para o ano de 2020 e tendo como meta a capacitação de 03 agentes públicos, esta ação não realizou o programado para 2020, considerando os Decretos Governamentais de medidas de enfrentamento a pandemia de Covid-19 e possui status *Abaixo do Esperado*.

Entretanto, ressaltamos o compromisso em reverter este cenário assim que possível, uma vez que a atual gestão reconhece a relevância de promover ações de capacitação para que os servidores possam atender com qualidade os diferentes setores da sociedade.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020.

REGIÃO GUAJARÁ					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: BELÉM					
PRODUTO	AGENTES CAPACITADOS	UNIDADE	UN	META 2020	233 AGENTES CAPACITADOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Reconhecendo a importância de capacitação dos servidores lotados nos núcleos regionais da Sedop, a *Ação 8887. Capacitação de Agentes Públicos* visa oportunizar o acesso ao aperfeiçoamento e, por conseguinte, maior eficiência no desenvolvimento das ações institucionais.

Em 2020, a Sedop realizou Palestras referentes à prevenção de saúde e qualidade de vida dos servidores, incluindo campanhas de vacinas tipo Tríplice Viral, H1N1, Sarampo, assim como testes para Covid-19. Foram capacitados 128 (cento e vinte e oito) servidores, com evidência para 01 (uma) Pós Graduação Latu Sensu em Gestão Pública e Governança, em Andamento. Desta forma, tivemos uma representação de 54,93% dentro da ação de Capacitação de Agentes Públicos, ficando prejudicada a meta estabelecida devido a Pandemia Covid-19, respeitando os Decretos Governamentais.

Com orçamento de R\$1.400,00¹ previsto para o ano de 2020 e tendo como meta a capacitação de 233 agentes públicos, esta ação não realizou o total programado para 2020, considerando os Decretos Governamentais de medidas de enfrentamento a pandemia de Covid-19 e possui status *Abaixo do Esperado*.

Entretanto, ressaltamos o compromisso em reverter este cenário assim que possível, uma vez que a atual gestão reconhece a importância de promover ações de capacitação para que os servidores possam atender com qualidade os diferentes setores da sociedade

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020.

4.2.6.AÇÃO 8890. FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL

REGIÃO ARAGUAIA					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: ÁGUA AZUL DO NORTE					
PRODUTO	MUNICÍPIO ATENDIDO	UNIDADE	UN	META 2020	1

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Para o ano de 2020, foi programado no PPA 2020/2023 a execução da *Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal* apenas no Município de Água Azul do Norte, na Região Araguaia. O município supracitado foi contemplado com recurso do Fundo para o Desenvolvimento Regional com Recursos da Desestatização - FRD II para a aquisição de equipamentos.

No entanto, o desenvolvimento da ação no município ficou impossibilitado não só devido à morosidade no atendimento das pendências de ordem técnica e documental identificadas no processo fora do tempo hábil, por parte do Município, mas principalmente, porque no primeiro semestre de 2020 o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, gestor do recurso, suspendeu a aprovação e liberação de novos projetos.

Quanto à execução financeira, para o ano de 2020 o orçamento programado para o desenvolvimento desta ação na Região Araguaia foi de R\$ 1.400.000,00¹. Porém, não houve execução física e financeira, conforme exposto anteriormente.

Finalizando, considerando que a execução física e financeira da *Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal* na Região do Araguaia não aconteceu conforme o programado nos instrumentos de Planejamento Público (PPA 2020/2023 e LOA 2020), o desempenho físico e financeiro desta ação durante o ano de 2020 foi *Abaixo do Esperado*.

¹FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

REGIÃO CARAJÁS					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: MARABÁ E PARAUPEBAS					
PRODUTO	MUNICÍPIO ATENDIDO	UNIDADE	UN	META 2020	2

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Para o ano de 2020, foi programado no PPA 2020/2023 a execução da *Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal* nos Municípios de Marabá e Parauapebas, na Região Carajás.

Os municípios supracitados foram contemplados com recurso do Fundo para o Desenvolvimento Regional com Recursos da Desestatização - FRD II para a aquisição de equipamentos.

Para o Município de Marabá estava prevista a aquisição de cinco caminhões compactadores de lixo, no valor total de R\$ 1.768.495,00, sendo R\$ 368.495,00 de contrapartida municipal. A compra e doação dos bens ao município foi concluída no primeiro semestre de 2020.

Entretanto, o desenvolvimento da ação no Município de Parauapebas foi impossibilitado devido à ausência de solução das pendências de ordem técnica e documental identificadas no processo, por parte do Município.

Quanto à execução financeira, para o ano de 2020 o orçamento programado para o desenvolvimento desta ação na Região Carajás foi de R\$ 927.500,00¹. No entanto, foram utilizados cerca de R\$ 1.771.997,56².

Finalizando, considerando que a execução física e financeira da *Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal* na Região do Carajás não aconteceu conforme o programado nos instrumentos de Planejamento Público (PPA 2020/2023 e LOA 2020), o desempenho físico e financeiro desta ação durante o ano de 2020 finalizou com status de *Merece Atenção*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

REGIÃO GUAJARÁ					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: BELÉM					
PRODUTO	MUNICÍPIO ATENDIDO	UNIDADE	UN	META 2020	1

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Em 2020, foi programado no PPA 2020/2023 a execução da *Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal* no município de Belém, na Região Guajará.

Para o Município de Belém estava prevista a realização de Limpeza Urbana em Canais de Vias Públicas da região Metropolitana com o objetivo de reduzir os alagamentos e prejuízos causados pelas fortes chuvas que atingiram a capital paraense nos primeiros meses do ano. As equipes limpam uma área equivalente a quase 40 quilômetros de canais, superando a previsão inicial, que era de 32,6 quilômetros. Foram retiradas dos canais cerca de 4.500 caçambas de entulhos e resíduos

Quanto à execução financeira, para o ano de 2020 o orçamento programado para o desenvolvimento desta ação na Região Guajará foi de R\$ 58.000,00¹. No entanto, houve a necessidade de atualizar a dotação inicial em R\$ 23.856.395,02² de modo a garantir que os serviços citados anteriormente pudessem ser executados. Ressaltamos que, parte da divergência *orçamento programado X orçamento executado* deve-se a limitação do teto orçamentário disponibilizado para a Sedop no momento da elaboração do orçamento.

Finalizando, considerando que a execução física da *Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal* na Região do Guajará aconteceu conforme o programado nos instrumentos de Planejamento Público (PPA 2020/2023 e OGE 2020), o desempenho desta ação durante o ano de 2020 foi *Conforme Programado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO -04/12/2020

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO -04/12/2020

REGIÃO RIO CAPIM					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: ABEL FIGUEIREDO					
PRODUTO	MUNICÍPIO ATENDIDO	UNIDADE	UN	META 2020	1

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Para o ano de 2020, foi programado no PPA 2020/2023 a execução da *Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal* apenas no Município de Abel Figueiredo, na Região Rio Capim.

O município supracitado foi contemplado com recurso do Fundo para o Desenvolvimento Regional com Recursos da Desestatização - FRD II para a aquisição de equipamentos.

No entanto, o desenvolvimento da ação no município ficou impossibilitado não só devido à morosidade no atendimento das pendências de ordem técnica e documental identificadas no processo fora do tempo hábil, por parte do Município, mas principalmente, porque no primeiro semestre de 2020 o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, gestor do recurso, suspendeu a aprovação e liberação de novos projetos.

Quanto à execução financeira, para o ano de 2020 o orçamento programado para o desenvolvimento desta ação na Região Rio Capim foi de R\$ 1.239.000,00¹. No entanto, foram utilizados cerca de R\$ 534,00², com diárias para fiscalização de obras na região.

Finalizando, considerando que a execução física e financeira da *Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal* na Região Rio Capim não aconteceu conforme o programado nos instrumentos de Planejamento Público (PPA 2020/2023 e OGE 2020), o desempenho físico e financeiro desta ação durante o ano de 2020 foi *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

4.3. PROGRAMA 1498

INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO

AÇÕES GOVERNAMENTAIS:

7658. IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS.

4.3.1. 7658. IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS

REGIÃO RIO CAETÉ					
AÇÃO 7658: IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: BRAGANÇA E SALINÓPOLIS					
PRODUTO	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2020	2

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Ciente da importância do Turismo como agente transformador de economias e sociedades, o Governo do Estado do Pará, criou no PPA 2020/2023 o Programa Governamental Indústria, Comércio, Serviços e Turismo o qual tem como um dos seus objetivos “Promover o Turismo Como Atividade Econômica”.

A Sedop contribui com o Governo do Estado no alcance deste objetivo, por meio do desenvolvimento da Ação 7658. *Implantação de Equipamentos Turísticos*, a qual tem como foco de atuação a execução de obras direcionadas para a Requalificação de Orlas e Praias de Interesse Turístico.

Para o ano de 2020, na Região Rio Caeté, foi previsto a execução desta ação nos municípios de Bragança e Salinópolis. Com relação ao município de Bragança, o planejamento da Sedop era de que fossem iniciadas as tratativas necessárias para implementação da ação. Acontece que, com a pandemia da COVID - 19 estas tratativas foram prejudicadas, principalmente, devido à suspensão das viagens dos técnicos da Sedop, as quais são fundamentais para a caracterização da área do projeto e diagnóstico da situação atual.

Quanto ao município de Salinópolis, foi dada continuidade na obra de Requalificação da Orla da Praia do Atalaia, cujo propósito é implantar um projeto urbanístico que proporcione além da melhoria na infraestrutura de serviços, a redução da poluição e contaminação da água pelos esgotos lançados diretamente na praia.

Para o ano de 2020, foi programada a execução de serviços pertinentes a Estação de Tratamento de Água (ETA) e Sistema de Esgotamento Sanitário (SES). Com relação à obra de Sistema de Abastecimento de Água, a mesma deverá ser concluída em dezembro de 2020.

Através de 2.835 metros de ramais de ligação, o sistema vai conectar 78 barracas, que hoje existem na orla, a uma Estação de Tratamento. Todas as barracas receberão água potável e terão hidrômetros para medição do consumo. A Estação de Tratamento de Água, com três quilômetros de rede de distribuição, terá capacidade para fornecer 70 metros cúbicos de água por hora.

Com relação à obra de Sistema de Esgotamento Sanitário, os serviços já iniciaram, estando na fase de aquisição da licença ambiental para continuidade dos serviços. A referida obra contará com uma rede de coleta e tratamento de esgoto de aproximadamente 3 mil metros de linhas de recalque para o transporte das substâncias à estação.

No que diz respeito à execução financeira, do valor de R\$ 10.210.237,00¹ programado para atender a Região Rio Caeté, foram utilizados R\$ 3.510.610,69², cerca de 34% do valor total. Parte desta divergência *orçamento planejado X orçamento executado*, deve-se aos desafios de variadas ordens que a Sedop encontrou em manter a continuidade dos serviços em meio à pandemia.

Diante do exposto, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos* na Região Rio Caeté, no decorrer do ano de 2020, foi *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO: 04/12/2020

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO: 04/12/2020

REGIÃO TOCANTINS					
AÇÃO 7658: IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: BARCARENA					
PRODUTO	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2020	1

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020					
<p>Ciente da importância do Turismo como agente transformador de economias e sociedades, o Governo do Estado do Pará, criou no PPA 2020/2023 o Programa Governamental Indústria, Comércio, Serviços e Turismo o qual tem como um dos seus objetivos “Promover o Turismo Como Atividade Econômica”.</p> <p>A Sedop contribui com o Governo do Estado no alcance deste objetivo, por meio do desenvolvimento da <i>Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos</i>, a qual tem como foco de atuação a execução de obras direcionadas para a Requalificação de Orlas e Praias de Interesse Turístico.</p> <p>Em 2020, a Sedop fez a proposição de desenvolver a <i>Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos</i>, no município de Barcarena. O planejamento da Sedop era de que fossem iniciadas as tratativas necessárias para implementação da ação. Acontece que, com a pandemia da COVID - 19 estas tratativas foram prejudicadas, principalmente, devido à suspensão das viagens dos técnicos da Sedop, as quais são fundamentais para a caracterização da área do projeto e diagnóstico da situação atual.</p> <p>Quanto à meta física acordada para esta ação, é necessário lembrar que a proposta da Sedop consiste no equipamento implantado na vigência do PPA atual, ou seja, até o ano de 2023. Ocorre que, no momento da alimentação dos sistemas de planejamento público (SIGPLAN – MÓDULOS PPA E OGE) os mesmos não permitem a inserção do número zero no quantitativo anual, gerando a interpretação equivocada de que em cada ano do PPA haverá 1 Equipamento Implantado.</p> <p>No caso da execução financeira, embora a <i>Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos</i> tenha recebido um aporte orçamentário de R\$ 111.500,00¹, assim como não houve execução física pelos motivos acima apresentados, também não houve execução financeira, conferindo ao desempenho desta ação na Região Tocantins o status de <i>Abaixo do Esperado</i>.</p>					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020.

4.4. PROGRAMA 1297 MANUTENÇÃO DA GESTÃO

AÇÕES GOVERNAMENTAIS:

4668. ABASTECIMENTO DE UNIDADES MÓVEIS.

8311. CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO.

8312. CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE.

8338. OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.

8339. OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE RECURSOS HUMANOS.

4.4.1.AÇÃO 4668. ABASTECIMENTO DE UNIDADES MÓVEIS

REGIÃO GUAJARÁ					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: BELÉM					
PRODUTO	UNIDADE ABASTECIDA	UNIDADE	UN	META 2020	17

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Com objetivo de reduzir os gastos das unidades de abastecimento móveis, atender com qualidade, conforto e segurança os servidores, a Sedop desenvolve a ação 4668. Abastecimento de Unidades Móveis. A execução eficiente desta ação contribui diretamente para o alcance do objetivo estabelecido pelo Governo do Estado que é de *Viabilizar a Gestão Administrativa do Estado*.

Quanto ao desempenho desta ação durante o ano de 2020 na Região do Guajará, a Sedop apresenta as seguintes considerações:

- Com relação a meta física: Foi planejado atender o Município de Belém com a meta física de 17 Unidades Abastecidas, quantitativo estabelecido no contrato da Sedop para manutenção da frota, no entanto 09 veículos atendem as necessidades da Sedop na Região do Guajará.
- Com relação a meta financeira: Para o ano de 2020, foi planejado atender esta ação com o valor de R\$ 200.000,00¹. Entretanto, por mais que na execução financeira da Região do Guajará esteja concentrado a execução financeira das Regiões do Baixo Amazonas e do Carajás, foram utilizados até 31/10/2020, o valor de R\$ 109.748,00, ficando a média mensal o valor de R\$ 10.974,80. Levando em conta o valor médio de consumo, o ano de 2020 terá um total de R\$ 131.697,60 gerando uma economia de R\$ 68.302,40, o que corresponde a 65,8% do orçamento planejado.

Feitas as considerações acima, a Sedop informa que, no decorrer do ano de 2020 o desenvolvimento da ação 4668. Abastecimento de Unidades Móveis na Região do Guajará, teve o desempenho físico e financeiro *Conforme o Programado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2019

REGIÃO BAIXO AMAZONAS**MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: SANTARÉM.**

PRODUTO	UNIDADE ABASTECIDA	UNIDADE	UN	META 2020	2
---------	--------------------	---------	----	-----------	---

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Com objetivo de reduzir os gastos das unidades de abastecimento móveis, atender com qualidade, conforto e segurança os servidores, a Sedop desenvolve a ação 4668. Abastecimento de Unidades Móveis. A execução eficiente desta ação contribui diretamente para o alcance do objetivo estabelecido pelo Governo do Estado que é de *Viabilizar a Gestão Administrativa do Estado*.

Quanto ao desempenho desta ação durante o ano de 2020 na Região do Baixo Amazonas, a Sedop apresenta as seguintes considerações:

- Com relação a meta física: Foi planejado atender o Município de Santarém com a meta física de 02(duas) Unidades Abastecidas. Meta esta que foi devidamente cumprida pela Sedop no ano de 2020.
- Com relação a meta financeira: Para o ano de 2020, foi planejado atender esta ação com o valor de R\$ 4.000,00¹. Entretanto, os Sistemas de Gestão do Orçamento não estão parametrizados por Regiões de Integração, motivando que a execução financeira dessa ação concentre-se na Região do Guajará, apesar da Sedop possuir em sua estrutura organizacional 06 Núcleos Regionais.

Feitas as considerações acima, por mais que esta ação não tenha tido execução financeira durante o ano de 2020 na Região do Baixo Amazonas, a obtenção da meta física estabelecida, confere a ação o status de *Conforme o Programado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2019

REGIÃO CARAJÁS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: MARABÁ					
PRODUTO	UNIDADE ABASTECIDA	UNIDADE	UN	META 2020	1

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Com objetivo de reduzir os gastos das unidades de abastecimento móveis, atender com qualidade, conforto e segurança os servidores, a Sedop desenvolve a ação 4668. Abastecimento de Unidades Móveis. A execução eficiente desta ação contribui diretamente para o alcance do objetivo estabelecido pelo Governo do Estado que é de *Viabilizar a Gestão Administrativa do Estado*.

Quanto ao desempenho desta ação durante o ano de 2020 na Região do Carajás, a Sedop apresenta as seguintes considerações:

- Com relação a meta física: Foi planejado atender o Município de Marabá com a meta física de 01 Unidade Abastecida. Meta esta que foi devidamente cumprida pela Sedop no ano de 2020.
- Com relação a meta financeira: Para o ano de 2020, foi planejado atender esta ação com o valor de R\$ 4.000,00¹. Entretanto, os Sistemas de Gestão do Orçamento não estão parametrizados por Regiões de Integração, motivando que a execução financeira dessa ação concentre-se na Região do Guajará, apesar da Sedop possuir em sua estrutura organizacional 06 Núcleos Regionais.

Feitas as considerações acima, por mais que esta ação não tenha tido execução financeira durante o ano de 2020 na Região do Carajás, a obtenção da meta física estabelecida, confere a ação o status de *Conforme o Programado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2019

4.4.2.AÇÃO 8311. CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

REGIÃO BAIXO AMAZONAS					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: SANTARÉM					
PRODUTO	SERVIDOR BENEFICIADO	UNIDADE	UN	META 2020	3

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Com o objetivo da viabilização da gestão administrativa do Estado, especificamente a Gestão de Pessoas desta Secretaria, a *Ação 8311. Concessão de Auxílio Alimentação* contemplou em média 2 servidores/mês no Núcleo Regional de Santarém, atingindo a meta física estabelecida para essa região.

Em relação ao desempenho financeiro, foi executado o valor anual de R\$ 14.400,00, equivalente à média mensal de R\$ 1.200,00. Justificamos a meta não alcançada em virtude da não realização do concurso público, conforme previsto, por motivos orçamentários, financeiros e ainda os protocolos referentes à pandemia Covid-19, tendo em vista o corte orçamentário conforme estimativa no PPA vigente.

REGIÃO CARAJÁS**MUNICÍPIO CONTEMPLADO:** MARABÁ

PRODUTO	SERVIDOR BENEFICIADO	UNIDADE	UN	META 2020	3
----------------	-----------------------------	----------------	-----------	------------------	----------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Com o objetivo da viabilização da gestão administrativa do Estado, especificamente a Gestão de Pessoas desta Secretaria, a *Ação 8311. Concessão de Auxílio Alimentação* contemplou em média 3 servidores/mês no Núcleo Regional de Marabá, atingindo a meta física estabelecida para essa região.

Em relação ao desempenho financeiro, foi executado o valor anual de R\$ 21.600,00 equivalente a média mensal de R\$ 1.800,00. Justificamos a meta não alcançada em virtude da não realização do concurso público, conforme previsto, por motivos orçamentários, financeiros e ainda os protocolos referentes à pandemia Covid-19, tendo em vista o corte orçamentário conforme estimativa no PPA vigente.

REGIÃO GUAJARÁ**MUNICÍPIO CONTEMPLADO:** BELÉM

PRODUTO	SERVIDOR BENEFICIADO	UNIDADE	UN	META 2020	248
----------------	-----------------------------	----------------	-----------	------------------	------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Com o objetivo da viabilização da gestão administrativa do Estado, especificamente a Gestão de Pessoas desta Secretaria, a *Ação 8311. Concessão de Auxílio Alimentação* contemplou em média 155 servidores/mês em Belém, atingindo a meta física estabelecida para essa região.

Em relação ao desempenho financeiro, foi executado o valor anual de R\$ 1.116.000,00 equivalente a média mensal de R\$ 93.000,00. Justificamos a meta não alcançada em virtude da não realização do concurso público, conforme previsto, por motivos orçamentários, financeiros e ainda os protocolos referentes à pandemia Covid-19, tendo em vista o corte orçamentário conforme estimativa no PPA.

4.4.3.AÇÃO 8312. CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE

REGIÃO DO BAIXO AMAZONAS					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: SANTARÉM					
PRODUTO	SERVIDOR BENEFICIADO	UNIDADE	UN	META 2020	3

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Com o objetivo da viabilização da gestão administrativa do Estado, especificamente a Gestão de Pessoas desta Sedop, essa ação **Concessão de Auxílio Transporte** contemplou, em média/mês, 1 servidor no Núcleo Regional de Santarém, representando um valor anual de, aproximadamente, R\$ 480,00, equivalente a média mensal de R\$ 40,00.

Justificamos a meta não alcançada em virtude da não realização do concurso público, conforme previsto, por motivos orçamentários, financeiros e ainda os protocolos referentes à pandemia da Covid-19, tendo em vista o corte orçamentário conforme estimativa em PPA, porém houve o equilíbrio financeiro, no que tange a manutenção da gestão, não havendo, portanto acréscimo financeiro com pagamento de transporte.

Ressaltamos, nesse caso, o pagamento de Auxílio transporte para 1 servidor, em decorrência da lotação em Belém, porém com remoção para o Núcleo de Santarém, além do sistema SIGIRH não está parametrizado por região de integração.

REGIÃO RIO CARAJÁS**MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: MARABÁ**

PRODUTO	SERVIDOR BENEFICIADO	UNIDADE	UN	META 2020	3
----------------	-----------------------------	----------------	-----------	------------------	----------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Com o objetivo da viabilização da gestão administrativa do Estado, especificamente a Gestão de Pessoas desta Sedop, essa ação **Concessão de Auxílio Transporte** contemplou, em média/mês, 1 servidor no Núcleo Regional de Marabá, representando um valor anual de, aproximadamente, R\$ 888,00, equivalente a média mensal de R\$ 74,00.

Justificamos a meta não alcançada em virtude da não realização do concurso público, conforme previsto, por motivos orçamentários, financeiros e ainda os protocolos referentes à pandemia da Covid-19, tendo em vista o corte orçamentário conforme estimativa em PPA, porém houve o equilíbrio financeiro, no que tange a manutenção da gestão, não havendo, portanto acréscimo financeiro com pagamento de transporte.

Ressaltamos, nesse caso, o pagamento de Auxílio transporte para 1 servidor, em decorrência da lotação em Belém, porém com remoção para o Núcleo de Santarém, além do sistema SIGIRH não está parametrizado por região de integração.

REGIÃO GUAJARÁ**MUNICÍPIO CONTEMPLADO: BELÉM**

PRODUTO	SERVIDOR BENEFICIADO	UNIDADE	UN	META 2020	248
----------------	-----------------------------	----------------	-----------	------------------	------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Com o objetivo da viabilização da gestão administrativa do Estado, especificamente a Gestão de Pessoas desta Sedop, essa ação **Concessão de Auxílio Transporte** contemplou, em média/mês, 132 servidores na Sede Belém, representando um valor anual de, aproximadamente, R\$ 220.325,54, equivalente à média mensal de, aproximadamente, R\$ 18.360,46.

Justificamos a meta não alcançada em virtude da não realização do concurso público, conforme previsto, por motivos orçamentários, financeiros e ainda os protocolos referentes à pandemia da Covid-19, tendo em vista o corte orçamentário conforme estimativa no PPA vigente, porém houve o equilíbrio financeiro, no que tange a manutenção da gestão, não havendo, portanto, acréscimo financeiro com pagamento de transporte.

4.4.4.AÇÃO 8338. OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

REGIÃO BAIXO AMAZONAS					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: SANTARÉM					
PRODUTO	CONTRATO MANTIDO	UNIDADE	UN	META 2020	1

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020
<p>Representando a Sedop na Região Baixo Amazonas, é mantido o Núcleo Regional no Município de Santarém com o objetivo de coordenar e executar ações setoriais no âmbito de obras públicas e do Desenvolvimento Urbano. A presença do Núcleo Regional da Sedop no Município de Santarém tem como finalidade principal garantir maior eficiência e eficácia no desenvolvimento, acompanhamento e avaliação das ações governamentais que estão sob a responsabilidade da Sedop.</p> <p>Através da ação Operacionalização das Ações Administrativas, a Sedop contribui com o Governo do Estado na viabilização da gestão administrativa, com a manutenção de contratos administrativos, os quais tem como função principal, prover os meios administrativos para implementação e a gestão dos programas finalísticos.</p> <p>Quanto a execução da meta física, no exercício de 2020, os contratos mantidos com as empresas prestadora dos serviços de energia elétrica, água encanada, telefonia fixa, passaram a ser executada no centro de custo da Região do Baixo Amazonas, perfazendo um total de 3 contratos mantidos.</p> <p>Com relação à meta financeira para o ano de 2020, foi planejado atender esta ação com o valor de R\$ 2.500,00¹, no entanto, esse valor superou em R\$ 21.226,29. Esta divergência <i>orçamento planejado x orçamento executado</i> deu-se, em grande parte, devido o valor estabelecido no teto orçamentário disponibilizado para a Sedop ser insuficiente para a real necessidade de manutenção dos contratos e também, devido à meta física ter aumentado em duas unidades além do planejado.</p> <p>Feitas as considerações acima, e levando em conta a atualização do sistema SIGPLAN –Módulo Monitoramento para encerramento do exercício, a Sedop considera que a Ação 8338. Operacionalização das Ações Administrativas na Região Baixo Amazonas teve o desempenho físico e financeiro <i>Conforme o Programado</i>.</p>

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 05/12/2019

REGIÃO CARAJÁS					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: MARABÁ					
PRODUTO	CONTRATO MANTIDO	UNIDADE	UN	META 2020	1

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Representando a Sedop na Região do Carajás, é mantido o Núcleo Regional no Município de Marabá com o objetivo de coordenar e executar ações setoriais no âmbito de obras públicas e do Desenvolvimento Urbano. A presença do Núcleo Regional da Sedop no Município de Santarém tem como finalidade principal garantir maior eficiência e eficácia no desenvolvimento, acompanhamento e avaliação das ações governamentais que estão sob a responsabilidade da Sedop.

Através da ação Operacionalização das Ações Administrativas, a Sedop contribui com o Governo do Estado na viabilização da gestão administrativa, com a manutenção de contratos administrativos, os quais tem como função principal, prover os meios administrativos para implementação e a gestão dos programas finalísticos.

Quanto a execução da meta física, no exercício de 2020, o contrato mantido com a empresa prestadora dos serviços telefonia fixa, passaram a ser executada no centro de custo da Região do Carajás, perfazendo um total de 1 contrato mantido.

Com relação à meta financeira para o ano de 2020, foi planejado atender esta ação com o valor de R\$ 2.500,00¹, no entanto, esse valor está em R\$ 3.592,68. Esta divergência *orçamento planejado x orçamento executado* deu-se, em grande parte, devido o valor estabelecido no teto orçamentário disponibilizado para a Sedop ser insuficiente para a real necessidade de manutenção dos contratos.

Feitas as considerações acima, e levando em conta a atualização do sistema SIGPLAN –Módulo Monitoramento para encerramento do exercício, a Sedop considera que a Ação 8338. Operacionalização das Ações Administrativas na Região Carajás teve o desempenho físico e financeiro *Conforme o Programado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 05/12/2019

REGIÃO GUAJARÁ					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: BELÉM					
PRODUTO	CONTRATO MANTIDO	UNIDADE	UN	META 2020	43

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Através da ação Operacionalização das Ações Administrativas, a Sedop contribui com o Governo do Estado na viabilização da gestão administrativa, com a manutenção de contratos administrativos, os quais tem como função principal, prover os meios administrativos para implementação e a gestão dos programas finalísticos.

Quanto à execução da meta física, no exercício de 2020, esta secretaria possui 19 contratos mantidos com as empresas prestadoras dos serviços.

Com relação à meta financeira para o ano de 2020, foi planejado atender esta ação com o valor de R\$ 1.525.000,00¹, no entanto, esse valor está em R\$ 2.019.285,65. Esta divergência *orçamento planejado x orçamento executado* deu-se, em grande parte, devido o valor estabelecido no teto orçamentário disponibilizado para a Sedop ser insuficiente para a real necessidade de manutenção dos contratos e aumento de preços e salários de serviços contratados devido à conjuntura econômica.

Feitas as considerações acima, e levando em conta a atualização do sistema SIGPLAN –Módulo Monitoramento para encerramento do exercício, a Sedop informa que a Ação 8338. Operacionalização das Ações Administrativas na Região do Guajará tem o desempenho físico e financeiro com status *merece atenção*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – 04/12/2020

4.4.5.AÇÃO 8339. OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE RECURSOS HUMANOS

REGIÃO BAIXO AMAZONAS

MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: SANTARÉM

PRODUTO	SERVIDOR REMUNERADO	UNIDADE	UN	META 2020	3
---------	---------------------	---------	----	-----------	---

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020

Considerando que a elaboração do PPA 2020-2023 teve como premissa o enfoque regional e que esta condição se estendeu a elaboração das metas financeiras, coube a Sedop fazer a previsão orçamentária da *Ação 8339. Operacionalização das Ações de Recursos Humanos* para o município de Santarém, na Região Baixo Amazonas, uma vez que possui 02 servidores lotados no referido núcleo regional.

No entanto, informamos que o Sistema de Gestão Integrada de Recursos Humanos – SIGIRH não está parametrizado por Regiões de Integração e a referida ação concentra-se na Região do Guajará, tanto a Operacionalização de Recursos Humanos quanto as Outras Despesas Correntes – ODC. Por isso, a execução financeira referente à remuneração dos servidores é efetivada na região de integração do Guajará, sendo este o motivo de não haver movimentação financeira na região do Baixo Amazonas durante o ano de 2020. Ressaltamos que a regularização desta situação está além da governabilidade da Sedop.

Diante deste cenário, para o ano de 2020, o desempenho físico e financeiro desta ação apresenta o status *Merece Atenção*.

REGIÃO CARAJÁS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: MARABÁ					
PRODUTO	SERVIDOR REMUNERADO	UNIDADE	UN	META 2020	3

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020
<p>Considerando que a elaboração do PPA 2020-2023 teve como premissa o enfoque regional e que esta condição se estendeu a elaboração das metas financeiras, coube a Sedop fazer a previsão orçamentária da <i>Ação 8339. Operacionalização das Ações de Recursos Humanos</i> para o município de Santarém, na Região Carajás, uma vez que possui 03 servidores lotados no referido núcleo regional.</p> <p>No entanto, informamos que o Sistema de Gestão Integrada de Recursos Humanos – SIGIRH não está parametrizado por Regiões de Integração e a referida ação concentra-se na Região do Guajará, tanto a Operacionalização de Recursos Humanos quanto as Outras Despesas Correntes – ODC. Por isso, a execução financeira referente à remuneração dos servidores é efetivada na região de integração do Guajará, sendo este o motivo de não haver movimentação financeira na região do Carajás durante o ano de 2020. Ressaltamos que a regularização desta situação está além da governabilidade da Sedop.</p> <p>No entanto, ainda diante deste cenário, no ano de 2020, o desempenho físico e financeiro desta ação apresenta o status <i>Conforme Programado</i>.</p>

REGIÃO GUAJARÁ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: BELÉM					
PRODUTO	SERVIDOR REMUNERADO	UNIDADE	UN	META 2020	248

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020					
<p>Nessa ação, a Secretaria monitorou o alcance das metas institucionais, indicando possíveis ajustes e garantindo a mais eficiente locação dos recursos financeiros e humanos para alcançar o melhor desempenho da gestão de governança do órgão, em cumprimento à missão institucional.</p> <p>Ressaltamos que o Sistema de Gestão Integrada de Recursos Humanos – SIGIRH não está parametrizado por Regiões de Integração e a referida ação concentra-se nesta Região. Portanto, tivemos em média/mês 194 servidores remunerados, representando um custo anual, até a presente data, de R\$ 9.197.238,93¹ e uma média mensal de R\$ 833.263,92. Considerando que esta ação centraliza em uma única folha de pagamento, vale lembrar que este valor já deduz as ações referentes à alimentação e transporte.</p> <p>Informamos ainda, que apesar dos reajustes financeiros em decorrência da equiparação salarial dos servidores, pagamentos retroativos referentes ao abono de permanência e a liberação de folhas de desligados do ano de 2020, mantivemos o equilíbrio orçamentário e financeiro da <i>Ação 8339. Operacionalização de Recursos Humanos</i> que apresenta status <i>Conforme Programado</i>.</p>					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO - 04/12/2020
