

Secretaria de
Desenvolvimento Urbano
e Obras Públicas



RELATÓRIO DE GESTÃO

Secretaria de
Desenvolvimento Urbano
e Obras Públicas

2021

BELÉM, PARÁ
NOVEMBRO, 2021

SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
BENEDITO RUY SANTOS CABRAL

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
Valdir Parry Acatauassu

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO E OBRAS PÚBLICAS
Arnaldo Dopazo Antônio José

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
Cínthia dos Santos Figueiredo

NÚCLEO DE CONTROLE JURÍDICO
José Augusto Freire Figueiredo

NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO
Matheus da Rocha Freitas

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
Maria Samara Lima Ramos

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Ângelo do Nascimento Gonçalves

DIRETORIA FINANCEIRA
Victória Germano Silva

DIRETORIA TÉCNICA
José Henrique Tavares da Silva

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
Cristina de Farias Guedes Vieira

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS E CONFORMIDADE
Lázaro César da Silva Lima Junior

DIRETORIA DE POLÍTICA SETORIAL
Alexandre José Almeida de Alencar

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E GESTÃO TERRITORIAL
Janete do Socorro Batista de Lima

DIRETORIA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS
Vanessa Catete Blois

ELABORAÇÃO

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

Maria Samara Lima Ramos

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ORÇAMENTÁRIO

Ellen Né da Silva

Eliamara Sousa Silva

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	06
CAPÍTULO I – PRINCIPAIS DESTAQUES E ENTREGAS DA SEDOP.....	07
1.1. PRINCIPAIS DESTAQUES – ANO 2019.....	08
1.1.1. Sistema de Abastecimento de Água.....	08
1.1.2. Pavimentação de Vias Urbanas.....	09
1.2. PRINCIPAIS DESTAQUES – ANO 2020.....	10
1.2.1. Sistema de Abastecimento de Água.....	10
1.2.2. Pavimentação de Vias Urbanas.....	11
1.2.3. Instrumentos Elaborados.....	12
1.2.4. Obras Civas.....	13
1.2.5. Equipamentos Entregues.....	14
1.3. PRINCIPAIS DESTAQUES – ANO 2021.....	15
1.3.1. Sistema de Abastecimento de Água.....	15
1.3.2. Pavimentação de Vias Urbanas.....	16
1.3.3. Instrumentos Elaborados.....	17
1.3.4. Obras Civas.....	18
1.3.5. Equipamentos Entregues.....	19
CAPÍTULO II – COMPROMISSOS REGIONAIS.....	20
2.1. Ação 7480. Macro drenagem da Bacia do Tucunduba.....	21
2.2. Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água.....	28
2.3. Ação 7642. Oferta de Unidade Habitacional.....	29
CAPÍTULO III – O QUE FIZEMOS EM 2021?.....	32
3.1. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DA SEDOP.....	33
CAPÍTULO IV – O QUE IREMOS FAZER?.....	35
4.1. PERSPECTIVAS DE PROJETOS.....	36
CAPÍTULO V – AÇÕES REALIZADAS EM 2021 QUE CONTRIBUEM COM AS METAS DOS ODS?..	40
5.1. ALINHAMENTO AÇÕES SEDOP X METAS ODS.....	41
CAPÍTULO VI – DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO PPA 2020/2023.....	46

6.1.	PROGRAMA 1489: DESENVOLVIMENTO URBANO – HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MOBILIDADE.....	47
6.1.1.	Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água.....	48
6.1.2.	Ação 7568. Realização de Obras de Esgotamento Sanitário.....	66
6.1.3.	Ação 7608. Construção de Parques Urbanos.....	74
6.1.4.	Ação 7644. Implantação de Aterros Sanitários.....	78
6.1.5.	Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas.....	84
6.1.6.	Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana.....	106
6.1.7.	Ação 8463. Apoio às Ações do Concidades.....	111
6.1.8.	Ação 8692. Apoio à Implementação da Política Estadual de Saneamento Básico..	113
6.1.9.	Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano.....	126
6.2.	PROGRAMA 1498: INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO.....	143
6.2.1.	Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos.....	144
6.3.	PROGRAMA 1499: ESPORTE E LAZER.....	149
6.3.1.	Ação 7659. Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer.....	150
6.4.	PROGRAMA 1508: GOVERNANÇA PÚBLICA.....	154
6.4.1.	Ação 7552. Construção e Conservação de Imóveis Públicos Estaduais.....	155
6.4.2.	Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública....	157
6.4.3.	Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal.....	168
6.4.4.	Ação 8887. Capacitação de Agentes Públicos.....	173
6.4.5.	Ação 8233. Edição e Publicação de Atos da Administração Pública.....	176
6.4.6.	Ação 8238. Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação.....	177
6.5.	PROGRAMA 1297: MANUTENÇÃO DA GESTÃO.....	178
6.5.1.	Ação 4668. Abastecimento de Unidades Móveis.....	179
6.5.2.	Ação 8311. Concessão de Auxílio Alimentação.....	182
6.5.3.	Ação 8312. Concessão de Auxílio Transporte.....	185
6.5.4.	Ação 8338. Operacionalização das Ações Administrativas.....	188
6.5.5.	Ação 8339. Operacionalização das Ações de Recursos Humanos.....	191



Apresentação

O presente documento constitui peça relevante ao cumprimento da obrigação constitucional do governador, em encaminhar a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) a Mensagem de Governo como instrumento de prestação de contas do exercício de 2021.

Ciente desta responsabilidade, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop) apresenta as principais realizações com destaque aos principais produtos entregues a sociedade durante o ano de 2021. No decorrer do ano, através do desenvolvimento de suas Ações Governamentais, a Sedop pôde estar presente nas 12 Regiões de Integração do Estado do Pará.

O Relatório de Gestão é estruturado de acordo com as orientações estabelecidas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) e atende às diretrizes estabelecidas no PPA 2020/2023, conforme detalhado a seguir:

- Capítulo I – Principais Destaques da Sedop – 2019 a 2021;
- Capítulo II – Compromissos Regionais;
- Capítulo III - O que Fizemos em 2021?
- Capítulo IV – O que iremos fazer?
- Capítulo V – Ações Realizadas em 2021 que contribuem com as Metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS);
- Capítulo VI – Desempenho Físico e Financeiro das Ações Governamentais da Sedop por Região de Integração.

Por fim, a Sedop ratifica que a elaboração deste Relatório de Gestão prezou pela objetividade, clareza e fidedignidade na demonstração das informações solicitadas. Buscou – se, da melhor forma possível, apresentar os esforços e desempenho da gestão da Sedop no exercício de 2021.

CAPÍTULO I

PRINCIPAIS DESTAQUES E ENTREGAS DA SEDOP

1.1. Principais Destaques – Ano 2019

1.1.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PRINCIPAIS ENTREGAS - 2019

Nº DE OBRAS CONCLUÍDAS	05
Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	04
Nº DE PESSOAS ATENDIDAS	36.264
Nº DE LIGAÇÕES DOMICILIARES REALIZADAS	6.002
Nº DE REGIÕES DE INTEGRAÇÃO COM OBRAS CONCLUÍDAS	04
INVESTIMENTO REALIZADO ¹	R\$ 14.532.958,93

Foto 01: Sistema de Desinfecção com Cloradores
Município de Concórdia do Pará



Foto 02: Reservatório Elevado de 500m³
Município de Vigia

¹ FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO – INVESTIMENTOS REALIZADOS E REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO – NOVEMBRO/2021.

1.1.2. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

PRINCIPAIS ENTREGAS - 2019

Nº DE OBRAS EXECUTADAS	04
Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	02
Nº DE KM EXECUTADOS	4,522
Nº DE REGIÕES DE INTEGRAÇÃO ATENDIDAS	02
INVESTIMENTO REALIZADO ¹	R\$ 49.876.358,72

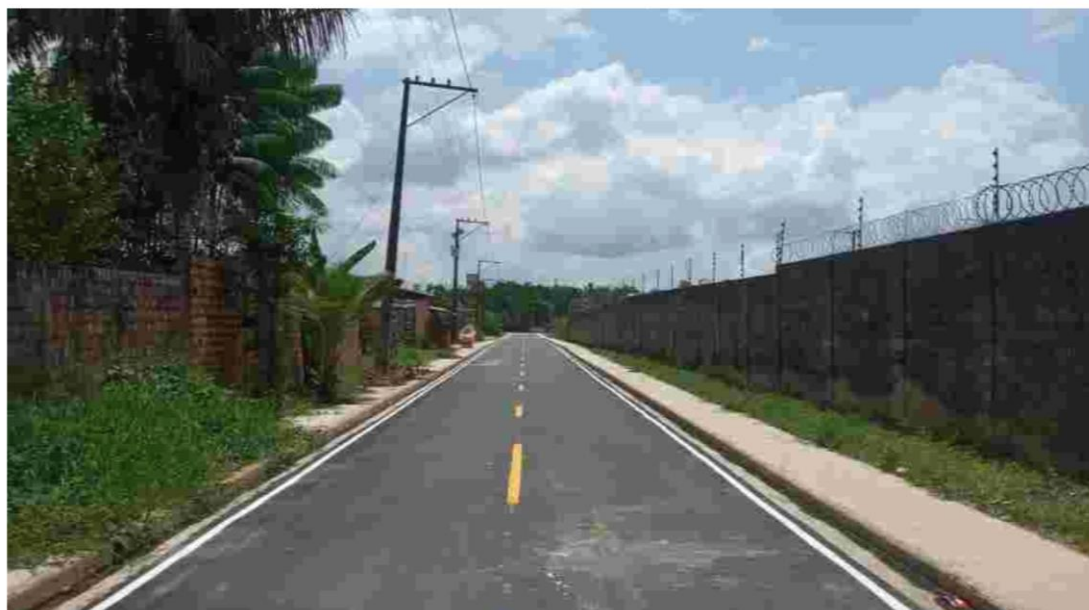


Foto 03: Pavimentação e Drenagem
Município de Ananindeua

¹ FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO – INVESTIMENTOS REALIZADOS E REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO – NOVEMBRO/2021.

1.2. Principais Destaques – Ano 2020

1.2.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PRINCIPAIS ENTREGAS - 2020

Nº DE OBRAS CONCLUÍDAS	04
Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	04
Nº DE PESSOAS ATENDIDAS	33.201
Nº DE LIGAÇÕES DOMICILIARES REALIZADAS	4.372
Nº DE REGIÕES DE INTEGRAÇÃO COM OBRAS CONCLUÍDAS	03
INVESTIMENTO REALIZADO ¹	R\$ 27.249.807,84

Foto 04: Casa de Bomba
Município de São Caetano de Odivelas



Foto 05: Reservatório Elevado
Município de Tracuateua

¹ FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO – INVESTIMENTOS REALIZADOS E REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO – NOVEMBRO/2021

1.2.2. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

PRINCIPAIS ENTREGAS - 2020

Nº DE OBRAS EXECUTADAS	108
Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	93
Nº DE KM EXECUTADOS	709
Nº DE REGIÕES DE INTEGRAÇÃO ATENDIDAS	12
INVESTIMENTO REALIZADO ¹	R\$690.692.929,20

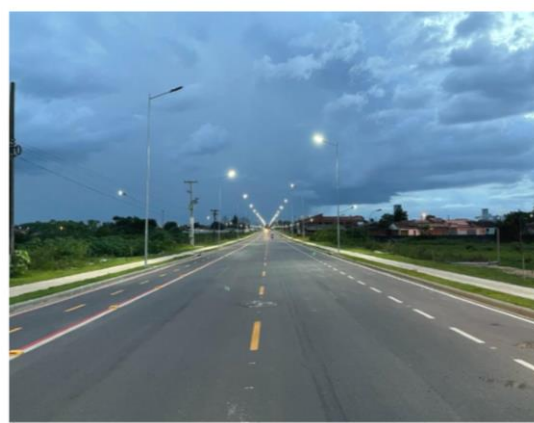
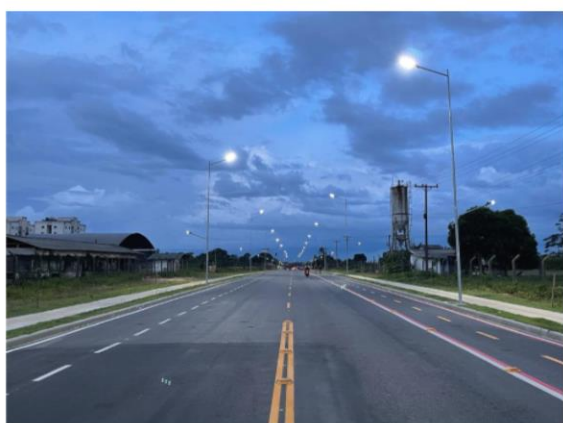


Foto 06 e 07: Pavimentação, Drenagem, Urbanização e Iluminação Pública da Avenida Brasil
Município de Castanhal



Foto 08: Pavimentação e Drenagem
de vias
Município de Portel

¹ FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO – INVESTIMENTOS REALIZADOS E REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO – NOVEMBRO/2021

1.2.3. INSTRUMENTOS ELABORADOS

PRINCIPAIS ENTREGAS - 2020

Nº DE INSTRUMENTOS ELABORADOS	08
Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	08
Nº DE REGIÕES DE INTEGRAÇÃO ATENDIDAS	06
INVESTIMENTO REALIZADO ¹	R\$ 1.491.344,24



Foto 09: Audiência Pública do Plano Municipal de Mobilidade Urbana
Município de Xinguara



Foto 10: Entrega do Plano Municipal de Mobilidade Urbana
Município de Oriximiná



Foto 11 e 12: Audiência Pública do Plano Municipal de Mobilidade Urbana
Município de Concórdia do Pará

¹ FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO – INVESTIMENTOS REALIZADOS E REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO – NOVEMBRO/2021

1.2.4. OBRAS CIVIS

PRINCIPAIS ENTREGAS - 2020

Nº DE OBRAS CONCLUÍDAS	13
Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	10
Nº DE REGIÕES DE INTEGRAÇÃO ATENDIDAS	07
INVESTIMENTO REALIZADO ¹	R\$ 59.851.190,16

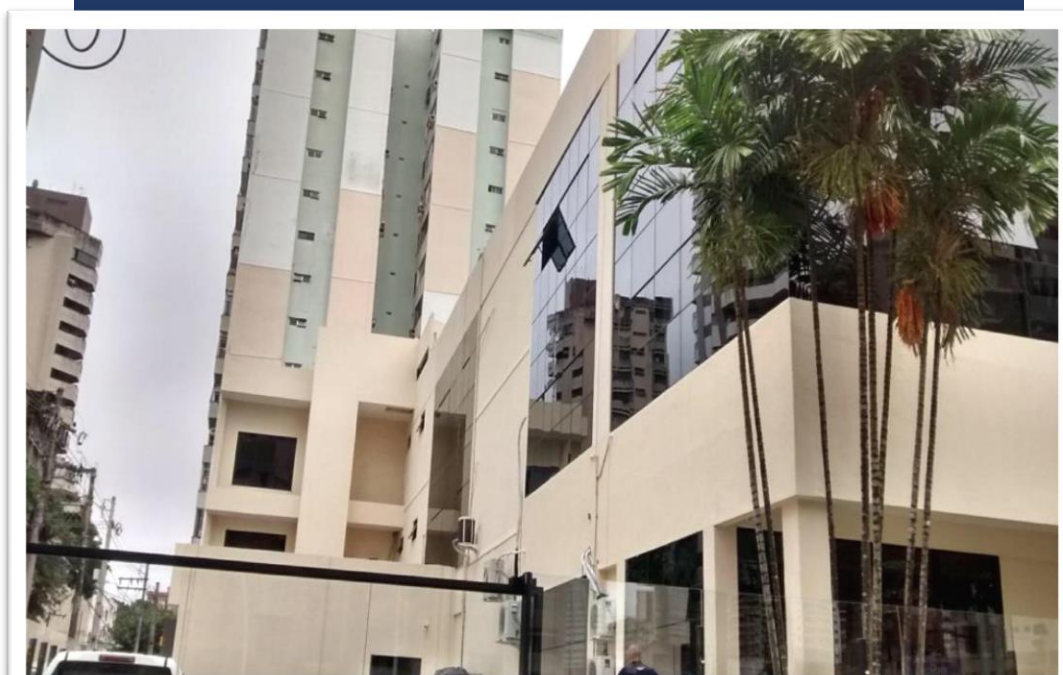


Foto 13: Conclusão da Reforma do prédio da Seplad – Vista Lateral
Município de Belém

¹ FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO – INVESTIMENTOS REALIZADOS E REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO – NOVEMBRO/2021

1.2.5. EQUIPAMENTOS ENTREGUES

PRINCIPAIS ENTREGAS - 2020

Nº DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES	05
Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	01
Nº DE REGIÕES DE INTEGRAÇÃO ATENDIDAS	01
INVESTIMENTO REALIZADO ¹	R\$ 1.768.495,00



Foto 14 e 15: Entrega dos Caminhões Coletores Compactadores de Lixo
Município de Marabá

¹ FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO – INVESTIMENTOS REALIZADOS E REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO – NOVEMBRO/2021

1.3. Principais Destaques – Ano 2021

1.3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PRINCIPAIS ENTREGAS - 2021

Nº DE OBRAS CONCLUÍDAS	05
Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	05
Nº DE PESSOAS ATENDIDAS	44.723
Nº DE LIGAÇÕES DOMICILIARES REALIZADAS	4.910
Nº DE REGIÕES DE INTEGRAÇÃO COM OBRAS CONCLUÍDAS	04
INVESTIMENTO REALIZADO ¹	R\$ 11.134.409,98

Foto 16: Sistema de Abastecimento de Água
Município de Ourém



Foto 17: Estação de Tratamento
Município de Ourém

¹ FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO – INVESTIMENTOS REALIZADOS E REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO – NOVEMBRO/2021

1.3.2. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

PRINCIPAIS ENTREGAS - 2021

Nº DE OBRAS EXECUTADAS	109
Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	100
Nº DE KM EXECUTADOS	914,10
Nº DE REGIÕES DE INTEGRAÇÃO ATENDIDAS	12
INVESTIMENTO REALIZADO ¹	R\$ 329.518.667,51



Foto 18: Drenagem e Pavimentação
Município de Bannach



Foto 19: Drenagem e Pavimentação
Município de Curionópolis

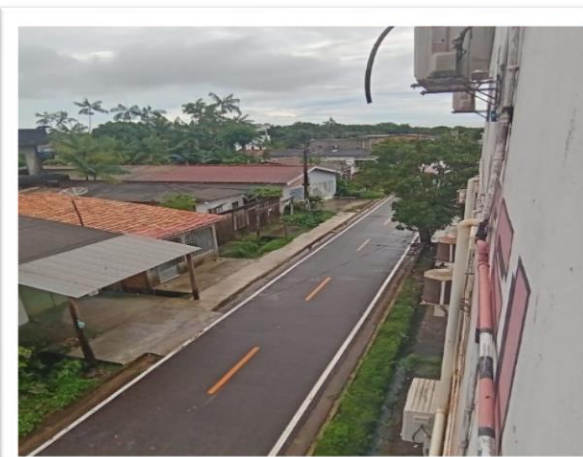


Foto 20: Pavimentação e Drenagem de vias
Município de Curralinho

¹ FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO – INVESTIMENTOS REALIZADOS E REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO – NOVEMBRO/2021

1.3.3. INSTRUMENTOS ELABORADOS

PRINCIPAIS ENTREGAS - 2021

Nº DE INSTRUMENTOS ELABORADOS	07
Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	07
Nº DE REGIÕES DE INTEGRAÇÃO ATENDIDAS	05
INVESTIMENTO REALIZADO ¹	R\$ 555.123,96



Foto 21 e 22: Reunião Técnica para Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana
Município de Juruti



Foto 23 e 24: Audiência Pública de Revisão do Plano Diretor
Município de Marapanim

¹ FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO – INVESTIMENTOS REALIZADOS E REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO – NOVEMBRO/2021

1.3.4. OBRAS CIVIS

PRINCIPAIS ENTREGAS - 2021

Nº DE OBRAS CONCLUÍDAS	24
Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	20
Nº DE REGIÕES DE INTEGRAÇÃO ATENDIDAS	11
INVESTIMENTO REALIZADO ¹	R\$ 113.624.004,61

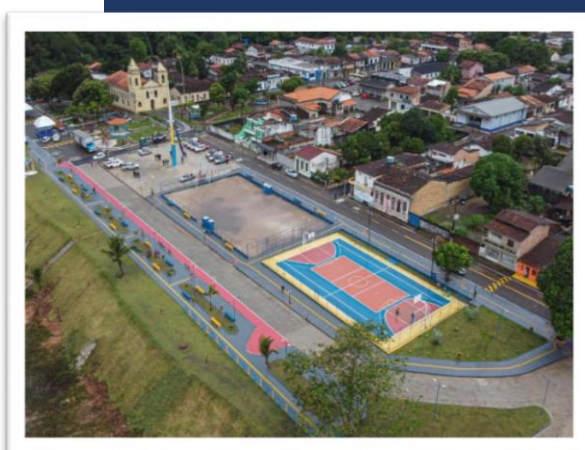


Foto 25 e 26: Execução da Revitalização da Orla
Município de Curuçá



Foto 27: Reforma do Complexo Rodoviário
Município de Capanema



Foto 28: Construção do Shopping Popular
Município de Capanema

¹ FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO – INVESTIMENTOS REALIZADOS E REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO – NOVEMBRO/2021.

1.3.5. EQUIPAMENTOS ENTREGUES

PRINCIPAIS ENTREGAS - 2021	
Nº DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES	02
Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	01
Nº DE REGIÕES DE INTEGRAÇÃO ATENDIDAS	01
INVESTIMENTO REALIZADO ¹	R\$ 539.000,00



Foto 29 e 30: Entrega de 02 Ônibus Escolares
Município de Abel Figueiredo

¹ FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO – INVESTIMENTOS REALIZADOS E REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO – NOVEMBRO/2021

CAPÍTULO II

COMPROMISSOS REGIONAIS DA SEDOP



2.1. Ação 7480. Macro drenagem da Bacia do Tucunduba

Concluir a Macro drenagem da Bacia do Tucunduba até 2023 é um dos Compromissos Regionais assumidos pelo Governo do Estado do Pará no PPA 2020/2023. Ciente desta responsabilidade e para cumprir este compromisso, a Sedop estabeleceu nos instrumentos de Planejamento e Orçamento Público (PPA 2020/2023 e OGE 2021) previstos para o ano de 2021, que o desempenho físico da obra de Macro drenagem da Bacia do Tucunduba obtivesse o percentual de execução física de 86% até dezembro de 2021.

Sendo assim, a Sedop empenhou-se em fazer com que a obra tivesse a celeridade necessária para alcançar a meta física estabelecida para o exercício de 2021. Vários foram os serviços executados ao longo do ano de 2021 que corroboraram para alcançar a meta física estabelecida, podendo ser destacado os seguintes:

- Entrega dos dois primeiros trechos do Projeto de Macro drenagem da Bacia do Tucunduba, que compreende o perímetro entre a Rua São Domingos e a Passagem 2 de Junho, no Bairro da Terra Firme;
- Avanço das obras de macro drenagem do terceiro trecho da Bacia do Tucunduba, que vai da Rua 2 de Junho à Travessa Vileta, que englobam todo o sistema viário, de drenagem, de esgoto e água, de conformação do talude do canal (plano de terreno inclinado que limita um aterro para garantir estabilidade), além da construção de pontes e passarelas.
- Conclusão das obras na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Riacho Doce, localizada na Avenida Tucunduba, que faz parte do primeiro trecho da segunda etapa de serviços. Esta ETE foi uma obra integrada à obra de Macro drenagem do Tucunduba para garantir viabilidade técnica na parte do esgoto.
- Substituição da ponte localizada na Rua Jabatiteua, no terceiro trecho, que compreende o perímetro entre a Rua Dois de Junho até a Travessa Vileta, por outra ponte, mais larga, toda em concreto, objetivando o alargamento do canal e evitar o represamento das águas.

Parte determinante para que a obra de Macro drenagem da Bacia do Tucunduba pudesse ter o desempenho físico conforme o planejado foi o investimento financeiro assegurado pelo Governo do Estado no valor de R\$ 102.187.495,80¹ para a execução de serviços relativos à 2ª Etapa do Projeto de Saneamento Integrado da Bacia do Tucunduba, realizados no trecho correspondente a Rua São Domingos até a Travessa Vileta, possuindo 2.175,73 metros de extensão sendo sua divisão realizada em três trechos².

Faz-se necessário ressaltar que o montante investido refere-se tanto a execução física da obra, quanto ao desenvolvimento de atividades relacionadas ao Projeto Trabalho Social desenvolvido pela Sedop na área de abrangência do Projeto.

Quanto à evolução física da obra, os mesmos poderão ser conferidos na tabela abaixo, que apresenta de maneira consolidada os serviços realizados no decorrer do ano de 2021 nos três trechos e, na sequência, através do Registro Fotográfico.

¹ FONTE: SIGPLAN – MÓDULO MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² - TRECHO 01: Corresponde a Rua São Domingos até a Rua dos Mundurucus - 814,00 metros; TRECHO 02: Corresponde a Rua dos Mundurucus até a Rua 02 de Junho - 680,00 metros; TRECHO 03: Corresponde a Rua 02 de Junho até a Travessa Vileta - 681,73 metros.

TABELA 01: MACRODRENAGEM DA BACIA DO TUCUNDUBA - EVOLUÇÃO DA OBRA

1. RETIFICAÇÃO DO IGARAPÉ

- Abertura e retificação de 2.176,50 metros de canal;
- Revestimento em grama do talude.

2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

- Implantação de 6.366 metros de tubulação, sendo 2.224 metros no 1º trecho (Rua São Domingos a Rua dos Mundurucus) e 1.790 metros no 3º trecho (Rua 02 de Junho a Trav. Vileta).

3. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

- Rede Coletora de Esgoto: ao total foram implantados 12.325,34 metros, sendo 2.209,34 metros no 2º trecho (Rua dos Mundurucus a Rua 02 de Junho) e 10.116 metros no 3º trecho (Rua 02 de Junho a Trav. Vileta);
- Estação de Tratamento de Esgoto: Reforço Estrutural concluído e iniciando a aquisição e instalação dos equipamentos da ETE.

4. SISTEMA VIÁRIO

- Execução de 2.176,50 metros de terraplanagem;
- Serviços de Pavimentação: 2.335,15 metros de imprimação, pintura de ligação e pavimentação em CBUQ;
- Serviços Complementares: execução de 2.645,55 metros de meio fio de concreto pré-moldado, 4.369,20 m² de calçadas, 2.645,55 metros de sarjeta em concreto, 3.299,68 metros de guarda corpo em concreto.

5. PONTES

- Passagem Santa Helena, Canal Caraparú, Celso Malcher, Rua dos Mundurucus, Passagem Brasília, Rua 02 de Junho, Passagem Vilhena, Passagem Orquídea, Roso Danin, Passagem Leal Martins, Rua Jabatiteua, Travessa Vileta (Vão de 8,0 metros): Execução de Muro de contenção, execução de laje de transição, execução de laje alveolar, execução de barreira new Jersey e placas pré-moldadas de passeio.

6. PASSARELAS

- Passagem Maranhão, Passagem 27 de dezembro: Fornecimento e cravação de 234 metros de estacas pré-moldadas de concreto secção (0,30 x 0,30), execução de blocos de coroamento, execução do piso em concreto, fornecimento e montagem de estrutura metálica.

7. SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL

- Assentamento de 1.891,70 metros de tubulação, sendo: 919 metros de Ø400mm, 591 metros de Ø600mm, 293,70 metros de Ø800mm, 53 metros Ø1000mm e 35 metros de Ø1.200mm;
- Execução de 55 poços de visita;
- Execução de 119 alas de lançamento;
- Rede de Drenagem Auxiliar: assentamento de 3.673,66 metros de tubulação, sendo: 1.109,50 metros Ø100mm, 1.249,69 metros Ø150mm e 1.314,47 metros Ø200mm.

FONTE: DIFIS/SEDOP – NOVEMBRO/2021

REGISTRO FOTOGRÁFICO
SANEAMENTO INTEGRADO DA BACIA DO TUCUNDUBA

2ª ETAPA DO 1º TRECHO



Foto 31:

Sistema Viário e
Macro drenagem
concluídos.

Foto 32:
Estação de
Tratamento de Esgoto
em fase de conclusão.





Foto 33:

Sistema Viário e
Macro drenagem
concluídas.

Foto 34:
Recomposição do
Canal da Gentil.





Foto 35:
Conclusão da Ponte
da Passagem
Orquídea.



Foto 36:
Execução da parte
urbanística.

Além do avanço dos serviços relacionados a execução física da obra de Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba, o componente social, o qual é inerente a todas as obras de grande impacto, também teve um desempenho de acordo com o programado durante o ano de 2021, ocorrendo de maneira sincronizada com a realização da obra física, garantindo desta forma a participação e protagonismo social dos beneficiários da área de influência do projeto.

Prova disto é que, do montante de R\$ 102.187.495,80³ investidos na execução da obra de Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba, cerca de R\$ 2.267.873,91⁴ foram destinados ao desenvolvimento de programas e ações que envolvem a comunidade residente na área de influência do projeto, principalmente no que diz respeito a oferecer suporte e apoio às intervenções físicas, sobretudo nas ações de remanejamento e reassentamento das famílias por ocasião da obra.

Dentre as atividades técnicas e sociais realizadas, a implementação do Programa Aterro de Quintais – PAQUIN, previsto em todas as fases do processo, teve seu desenvolvimento dentro do programado para o ano de 2021. Com o objetivo de possibilitar a melhoria das condições sanitárias e ambientais, o programa fornece material arenoso para os moradores que possuem suas casas localizadas em quadras com cotas muito abaixo das vias, e que por este motivo, transformaram-se em grandes bolsões de alagamentos sob os imóveis atingidos. Em 2021, foram entregues à população 79.880,64 m³ de material arenoso distribuídos em sete Quadras, o que corresponde a 70% do previsto em planilha.

No que diz respeito às ações voltadas para a implementação do Projeto de Trabalho Social (PTS), as principais atividades desenvolvidas, bem como os produtos alcançados durante o ano de 2021, podem ser conferidos de maneira sintetizada na tabela abaixo. Vale ressaltar que, em virtude da pandemia da COVID – 19 algumas atividades programadas tiveram que ser reduzidas, de modo a evitar aglomerações.

TABELA 2: PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS)	
1	Atividades de mobilização, sensibilização e organização da comunidade;
2	Plantão Social para realizar atendimentos aos moradores sobre suas reais necessidades, orientando-os a buscar soluções para os problemas apresentados;
3	Visita da Comissão de Acompanhamento de Obra (CAO) para acompanhar o andamento da obra;
4	Visita técnica na área do Projeto de Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba;
5	Atendimento a demanda espontânea das famílias que fazem parte do Projeto de Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba;
6	Acompanhamento na área do Projeto junto a empresa terceirizada;
7	Negociação de 60 famílias a serem desapropriadas em função da 3ª fase do projeto;
8	Remanejamento de 99 benfeitorias consideradas frentes de trabalho da 3ª fase do projeto;
9	Aproximadamente 1.000 famílias atendidas pelo Programa Aterro de Quintal – PAQUIN;

³ FONTE: SIGPLAN – MÓDULO MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

⁴ FONTE: SIGPLAN – MÓDULO MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

TABELA 2: PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS)	
10	Aproximadamente 900 famílias beneficiadas com o Auxílio Moradia enquanto aguardam unidades habitacionais do Residencial Liberdade Curtume Santo Antônio.
11	Reprogramação do Projeto de Trabalho Social – PTS referente ao 3º trecho da obra;
12	Realização de levantamento para identificação das famílias ocupantes da área do Curtume Santo Antônio;
13	Desenvolvimento de ação para plantio no talude do canal do Tucunduba;
14	Desenvolvimento de ação de educação ambiental na área do projeto.

FONTE: RELATÓRIO INSTITUCIONAL DIMAC/SEDOP – NOVEMBRO 2021.

Com relação ao alcance da meta física estabelecida de 86% de obra executada para o ano de 2021, ressaltamos que os serviços realizados nos três trechos no decorrer do ano chegou ao percentual geral de 91,58% , ultrapassando a meta estabelecida em cerca de 5,58%, o que demonstra eficiência no desempenho físico desta ação durante o ano de 2021.

Ainda com relação ao desempenho físico dessa Ação, esclarecemos que a alimentação da *Ação 7480. Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba* no sistema, no decorrer do ano de 2021, ficou desatualizada, sendo assim, informamos que para o encerramento do exercício de 2021, o sistema SigPlan- Monitoramento será devidamente atualizado, de modo a garantir a unidade da informação.

Quanto ao desempenho financeiro, da dotação inicial de R\$ 17.659.453,00⁵ programado para atender esta ação durante o ano de 2021, foi necessário atualizar o valor com acréscimo de R\$ 84.528.042,80. Esta majoração deve-se, dentre outras situações, principalmente, a limitação do teto orçamentário disponibilizado para a Sedop, o qual ficou aquém da real necessidade para execução da obra.

Neste sentido, considerando que a obra de Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba é uma das obras prioritárias para o Governo do Estado do Pará e que, sua conclusão, irá melhorar a qualidade de vida de cerca de quase 250 mil pessoas que vivem na área de abrangência do projeto, além de contribuir significativamente para a melhoria dos índices de saneamento básico do Estado do Pará, o fato da execução orçamentária ter ultrapassado a meta financeira estabelecida para o exercício de 2021, justifica-se pela necessidade de cumprir o cronograma físico em vigor, mantendo o ritmo adequado de execução da obra de modo a garantir o cumprimento do Compromisso Regional assumido pelo Governo do Estado do Pará de *Concluir a Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba* na vigência do PPA 2020/2023.

Diante do exposto, para o ano de 2021, o desempenho físico e financeiro da Ação 7480. Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba confere-lhe o status de *Conforme Programado*.

⁵ FONTE: SIGPLAN – MÓDULO MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.



2.2. Ação 7657. Realização de Obras de Abastecimento de Água

Conforme consta no Relatório de Gestão da Sedop – Ano Base 2020, com o advento da pandemia, várias condicionantes impactaram diretamente no não desenvolvimento do Compromisso Regional estabelecido para a Região Carajás - Construção de Sistema de Abastecimento de Água no Município de Marabá. Dentre elas, pode-se destacar:

1. Impossibilidade de definir a área onde o projeto poderia ser executado, bem como, a impossibilidade de realizar o diagnóstico da situação atual devido a suspensão das viagens dos técnicos da Sedop;
2. A vulnerabilidade, evidenciada pelo cenário pandêmico, de municípios com índices de saneamento básico bem menores que os índices do município de Marabá.

Com este cenário e considerando a Revisão do PPA 2020/2023, a área técnica da Sedop, fundamentada nos principais estudos e pesquisas disponíveis no âmbito do Saneamento Básico e tendo como referência os índices de atendimento com rede de abastecimento de água no Estado do Pará, revisou todas as obras de Sistema de Abastecimento de Água (SAA) propostas para serem iniciadas no PPA 2020/2023, inclusive a obra proposta como Compromisso Regional no município de Marabá.

Como resultado desta análise, o direcionamento utilizado para manter ou alterar municípios inclusos nos instrumentos de planejamento público (PPA 2020/2023 e LOA/OGE 2022) foi o de priorizar os municípios com os maiores índices de vulnerabilidade social e, considerando este critério, o município de Marabá não consta entre estes municípios.

Diante do exposto, a Sedop no momento da Revisão do PPA 2020/2023 em que foram realizadas as Oficinas Estratégicas para debater o desempenho dos Compromissos Regionais pactuados, solicitou a EXCLUSÃO da obra *Construção de Sistema de Abastecimento de Água no município de Marabá* como Compromisso Regional estabelecido para a Região Carajás, sob a responsabilidade da Sedop.



2.3. Ação 7642. Oferta de Unidade Habitacional

Levando em consideração que ter moradia digna é um direito humano e que para ser assegurado, necessita da existência de políticas públicas que amplie o acesso à moradia, mas que também garanta qualidade de vida, diminuição das desigualdades e melhora na mobilidade urbana, o Governo do Estado do Pará, estabeleceu como um dos objetivos do Programa Desenvolvimento Urbano – Habitação, Saneamento e Mobilidade, “Melhorar as *Condições de Habitabilidade de Famílias com Renda, Prioritariamente, até 03 Salários Mínimos*”.

A Sedop é um dos órgãos que contribuem para o alcance deste objetivo através do desenvolvimento da *Ação 7642. Oferta de Unidade Habitacional*, na qual é executada a obra “Construção de 340 Unidades Habitacionais”, localizada no trecho compreendido entre o Terminal Rodoviário da UFPA e a entrada do Hospital Betina Ferro, no município de Belém.

Faz-se necessário ressaltar que, após levantamento e atualização do projeto inicial, o quantitativo de Unidades Habitacionais foi acrescido com mais 28 Unidades Habitacionais, totalizando em 368 Unidades Habitacionais, distribuídas da seguinte forma:

- Riacho Doce I – 16 Unidades Habitacionais;
- Riacho Doce II – 240 Unidades Habitacionais;
- Riacho Doce III – 112 Unidades Habitacionais.

Identificada como *Compromisso Regional*, a referida obra é considerada um investimento estruturante capaz de oferecer moradias com qualidade às famílias de baixa renda, proporcionando segurança, habitabilidade e saúde aos seus moradores. Prevista para ser finalizada no ano de 2020, por conta da pandemia da Covid – 19, a obra não pôde seguir o cronograma físico planejado, adiando desta forma, a entrega das Unidades Habitacionais para o ano de 2021.

Com relação à evolução física da obra, a tabela abaixo apresenta de maneira consolidada os serviços realizados no decorrer do ano de 2021 e, tendo na sequência, o Registro Fotográfico.

TABELA 03: CONSTRUÇÃO DE 368 UNIDADES HABITACIONAIS- EVOLUÇÃO DA OBRA	
RIACHO DOCE I – (BLOCO 8)	RIACHO DOCE II - (BLOCOS NOVOS: 20, 21, 22, 23, 24 E 25)
- Instalações de rede de combate e prevenção a incêndios; - Instalação de placas de identificação e sinalização; - Serviços de Urbanização; - Serviços de Limpeza; - Checklist nos apartamentos.	- Revestimento cerâmico; - Instalação de Esquadrias; - Instalações Elétricas; - Execução de contrapiso. - Instalação de louças, metais e acessórios; - Pintura PVA; - Checklist nos apartamentos.
RIACHO DOCE II (BLOCOS REMANESCENTES: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 E 19)	RIACHO DOCE III – (BLOCOS 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 E 36)
- Instalação de esquadrias; - Instalações elétricas; - Instalação de forro em PVC; - Assentamento de cerâmica de parede e piso; - Instalação de louças, metais e acessórios; - Pintura PVA; - Checklist nos apartamentos.	- Instalação de Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica - SPDA; - Instalações elétricas; - Instalação de Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica – SPDA; - Assentamento de cerâmica de parede e piso com rodapé; - Pintura externa; - Serviço de Limpeza; - Checklist nos apartamentos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
368 UNIDADES HABITACIONAIS

EVOLUÇÃO DA OBRA



Foto 37:

Conclusão das
Unidades
Habitacionais do
Riacho Doce II.



Foto 38:

Conclusão das
Unidades
Habitacionais do
Riacho Doce II.

No que diz respeito a meta física estabelecida para esta ação, a conclusão da obra em dezembro de 2021 beneficiando cerca de 1.800 pessoas, garante que a mesma foi 100% alcançada, reconhecendo desta forma que o desempenho físico da ação no decorrer do ano de 2021 aconteceu com eficiência e eficácia.

Quanto ao desempenho financeiro, do orçamento de R\$ 5.001.500,00⁶ programado para atender esta ação durante o ano de 2021, foram acrescidos R\$ 4.710.870,04, totalizando uma execução financeira de R\$ 9.712.370,04⁷. Esta majoração deve-se a limitação do teto orçamentário disponibilizado para a Sedop, o qual ficou aquém da real necessidade para execução da obra.

Mais uma vez ressaltamos que a atualização da dotação orçamentária foi fundamental para que a Sedop pudesse dar a celeridade necessária para o desenvolvimento da obra e contribuindo efetivamente para a conclusão da obra *“Construção de 368 Unidades Habitacionais”* na vigência do PPA 2020/2023.

Diante do exposto, certificamos que a *Ação 7642. Oferta de Unidade Habitacional* teve o desempenho *Conforme o Programado* no exercício de 2021.

⁶ FONTE: SIGPLAN – MÓDULO MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

⁷ FONTE: SIGPLAN – MÓDULO MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

CAPÍTULO III

O QUE FIZEMOS EM 2021?

3.1. Principais Realizações da Sedop em 2021

Marcado pelas consequências do primeiro ano da pandemia da Covid – 19, o ano de 2021 exigiu dos Gestores da Sedop habilidade para conduzir as situações adversas impostas pela crise epidemiológica instalada no cenário mundial.

O panorama exposto por este cenário exigia que em 2021, a Sedop apresentasse à sociedade respostas eficientes e eficazes de maneira a minimizar os impactos sociais e econômicos, causados pelas paralizações e/ou não conclusão de obras e ações sob a responsabilidade da Sedop.

Com esta perspectiva, no exercício de 2021, a Sedop buscou assegurar no Planejamento de seus instrumentos públicos (PPA e LOA), as condições necessárias para a continuidade de execução das obras, objetivando sanar ou reduzir os efeitos negativos causados pela pandemia, além de possibilitar a entrega de produtos à sociedade, relacionados ao desenvolvimento das Ações Governamentais.

No âmbito do Saneamento Básico, a Sedop empreendeu esforços no desenvolvimento de 07 (sete) ações que contribuem com o objetivo do governo do Estado de *“Promover e Disponibilizar aos Usuários o Acesso a Serviço Público de Saneamento Básico”*. São elas:

Ação 7480. Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba;

Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água;

Ação 7568. Realização de Obras de Esgotamento Sanitário;

Ação 7642. Oferta de Unidade Habitacional;

Ação 7644. Implantação de Aterros Sanitários;

Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas;

Ação 8692. Apoio à Implementação da Política Estadual de Saneamento Básico.

Ação 8694. Apoio Técnico – Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano.

Na execução destas ações, a SEDOP busca atender tanto as necessidades da população relacionadas a serviços de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, habitação, como também a necessidade de ampliar e intensificar a Política de Saneamento em todo território paraense.

Para o desenvolvimento destas ações, durante o ano de 2021, a SEDOP investiu cerca de **RS 440.488.807,08¹**, sendo que do valor total, **R\$ 102.187.495,80²** foram destinados a ação de Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba, a qual, além da sua importância na melhoria dos índices de saneamento básico, destaca-se como uma proposta de intervenção urbanística pautada no desenvolvimento econômico local e na gestão ambiental urbana, priorizando a recuperação de áreas degradadas, localizadas na periferia da cidade de Belém³.

Com estas ações, a Sedop contribuiu no exercício de 2021 com o Governo do Estado na melhoria dos serviços de saneamento básico nos municípios paraenses, dos índices de saneamento básico no Estado do Pará e da qualidade de vida da população, além de ser um dos órgãos executores que mais contribuem para o alcance do objetivo do programa, que está focado na promoção e disponibilização à sociedade ao saneamento básico.

¹ FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO – INVESTIMENTOS REALIZADOS E REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO – INVESTIMENTOS REALIZADOS E REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO – NOVEMBRO/2021.

³ BARBOSA, Maria José de Souza – 2003.

Outra ação que merece destaque por seu desempenho durante o ano de 2021 é a *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas*. Com o objetivo de melhorar o sistema viário urbano dos municípios paraenses por meio de obras de pavimentação e urbanização, foram investidos cerca de **R\$ 329.518.667,51**⁴ em **914,10Km**, beneficiando 100 municípios das 12 (doze) Regiões de Integração.

É importante ressaltar que a implementação desta ação, possibilita à Sedop contribuir de maneira eficaz no combate aos desafios que o Governo do Estado enfrenta na busca de um sistema de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano mais adequado para a população paraense.

Além do âmbito do saneamento básico, a Sedop desenvolveu no decorrer do ano de 2021, outras ações com vistas à condução das Políticas Públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade, são elas:

Ação 7659. Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer;

Ação 7556. Apoio a Construção e adequação de Espaços de Utilização Pública;

Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal;

Ação 7552. Construção e Conservação de Imóveis Públicos Estaduais;

Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos.

Foram investidos cerca de **R\$ 98.320.858,31**⁵ no desenvolvimento destas ações. Do valor total, cerca de **R\$ 51.430.783,11** foram utilizados no desenvolvimento das ações que contem obras prioritárias como a 7659. Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer e 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos.

Neste contexto, também merece destaque a *Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública*, que tem como objetivo *Ampliar o Investimento de Obras e Espaços Sociais nos Municípios Paraenses* e esteve presente em todas as doze Regiões de Integração do Estado do Pará, recebeu investimento na ordem de **R\$ 14.586.626,69**⁶ durante o ano de 2021.

A importância do desenvolvimento destas ações dá-se por contribuir com o Governo do Estado, na promoção do desenvolvimento econômico e do bem-estar da população paraense, através da execução de obras que valorizam o espaço social, respeitando às necessidades sociais dos municípios, como também ajuda a fomentar o turismo no Estado do Pará.

Por fim, reafirmamos o compromisso da Sedop no ano de 2021 em colaborar com o Governo do Estado na obtenção dos objetivos estabelecidos para os Programa Governamentais na implementação de obras de grande importância na condução de políticas públicas, uma vez que, *considera-se que governança pública compreende tudo o que uma instituição pública faz para assegurar que sua ação esteja direcionada para objetivos alinhados aos interesses da sociedade.*⁷

No Capítulo VI deste Relatório encontra-se a avaliação do desempenho de cada uma das ações programadas no PPA 2020/2023, considerando o percentual de execução da meta física e financeira e as devidas justificativas para o não alcance das metas.

⁴ FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO – INVESTIMENTOS REALIZADOS E REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO – NOVEMBRO/2021.

⁵ FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO – INVESTIMENTOS REALIZADOS E REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO – NOVEMBRO/2021.

⁶ FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO – INVESTIMENTOS REALIZADOS E REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO – NOVEMBRO/2021.

⁷ GUIA DA POLÍTICA DE GOVERNANÇA PÚBLICA / CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA – BRASÍLIA : CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2018.

CAPÍTULO IV

O QUE IREMOS FAZER?

4.1. Perspectivas de Projetos

Mesmo diante de um cenário cheio de desafios advindos com a pandemia da Covid – 19 e que trouxe impacto direto sobre o desenvolvimento das ações governamentais sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Obras Públicas (Sedop), as perspectivas para desenvolvimento de novos projetos par os próximos anos são mais otimistas, principalmente no que diz respeito a obras de infraestrutura urbana.

Com a responsabilidade de planejar, acompanhar e, na maioria das vezes, executar, obras e serviços de engenharia e arquitetura, não só no âmbito de atuação da Sedop, mas de todo o Estado do Pará, a Sedop apresenta tabela, por Região de Integração, dos principais projetos a serem desenvolvidos a partir do ano de 2022. Ao todo, são **62 projetos** distribuídos em **45 municípios** das **12 Regiões de Integração** do Estado do Pará.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Nº PROJETOS
ARAGUAIA	BANNACH	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED.	01
TOTAL OBRAS ARAGUAIA			01
BAIXO AMAZONAS	ALENQUER	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA AUGUSTO CÉZAR DE SOUSA QUARESMA – BAIRRO CENTRO.	01
		CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA–BAIRRO NOVA ESPERANÇA.	02
	CURUÁ	CONSTRUÇÃO DE 100 METROS DE MURO DE ARRIMO.	03
	JURUTI	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPORTE E LAZER.	04
	MOJUÍ DOS CAMPOS	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO.	05
		CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE PIRANHA.	06
	ÓBIDOS	RECUPERAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL.	07
	TERRA SANTA	CONSTRUÇÃO DE AEROPORTUÁRIO DE ESTRUTURA BÁSICA PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO AEROPORTO.	08
		REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO ESTÁDIO.	09
TOTAL PROJETOS BAIXO AMAZONAS			09
CARAJÁS	BOM JESUS DO TOCANTINS	CONSTRUÇÃO DE QUADRA SOCIETY.	01
	MARABÁ	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO NA AVENIDA DO AEROPORTO.	02
TOTAL PROJETOS CARAJÁS			02

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Nº PROJETOS
GUAMÁ	CASTANHAL	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO DA PORPIRA.	01
		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO BAIRRO JADERLÂNDIA.	02
	CURUÇÁ	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE.	03
	IGARAPÉ-AÇU	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO PEQUENO AGRICULTOR.	04
	MAGALHÃES BARATA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL.	05
	MARAPANIM	CONSTRUÇÃO DOS TRAPICHES E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA BEIRA MAR.	06
	SÃO CAETANO DE ODIVELAS	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO PESQUEIRO E TURÍSTICO.	07
TOTAL PROJETOS GUAMÁ			07
GUAJARÁ	BELÉM	REFORMA DO PRÉDIO DO COMANDO DO GAP.	01
		REFORMA E ADEQUAÇÃO DA DIREÇÃO E DAS DIVISÕES ADMINISTRATIVAS MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE BELÉM.	02
		REFORMA DA COBERTURA DA ALA CENTRAL E DOS SETORES CENTRO CIRÚRGICO E UTI NO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE BELÉM.	03
	BENEVIDES	PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE BENEVIDES.	04
		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL.	05
TOTAL PROJETOS GUAJARÁ			05
LAGO DE TUCURUÍ	BREU BRANCO	REVITALIZAÇÃO DA ORLA.	01
	GOIANÉSIA	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA VILA PORTO NOVO.	02
		REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALMIR GABRIEL.	03
	JACUNDÁ	REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL.	04
	TUCURUÍ	REFORMA, AMPLIAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL.	05
	NOVO REPARTIMENTO	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL.	06
TOTAL PROJETOS LAGO DE TUCURUÍ			06
MARAJÓ	MUANÁ	CONSTRUÇÃO DA ORLA NA VILA SÃO MIGUEL.	01
	PONTA DE PEDRAS	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL.	02
	SANTA CRUZ DO ARARI	REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL.	03
TOTAL PROJETOS MARAJÓ			03

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Nº PROJETOS
RIO CAETÉ	AUGUSTO CORRÊA	CONSTRUÇÃO DE ARENA ESPORTIVA.	01
	CACHOEIRA DO PIRIÁ	ASFALTO EM VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	02
	SANTA LUZIA DO PARÁ	CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA.	03
	SANTARÉM NOVO	CONSTRUÇÃODO ESTÁDIO MUNICIPAL.	04
	TRACUATEUA	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BOSQUE.	05
TOTAL PROJETOS RIO CAETÉ			05
RIO CAPIM	AURORA DO PARÁ	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL.	01
		REFORMA DA QUADRA DA VILA APARECIDA.	02
		CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA VILA FÁTIMA.	03
		CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DA ORLA DO RIO CAETÉ.	04
	BUJARU	CONSTRUÇÃO DA ORLA (1ª ETAPA).	05
	CAPITÃO POÇO	CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL.	06
	DOM ELISEU	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO.	07
		URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MARECHAL RONDON.	08
	IPIXUNA DO PARÁ	REFORMA DO GALPÃO DO AGRICULTOR.	09
	NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL.	10
TOTAL PROJETOS RIO CAPIM			10
TAPAJÓS	ITAITUBA	REFORMA DO TERMINAL HIDROVIÁRIO.	01
TOTAL PROJETOS TAPAJÓS			01
TOCANTINS	ACARÁ	CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ORLA DA CIDADE.	01
	BARCARENA	CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA COMUNIDADE UTINGA – AÇU.	02
	CAMETÁ	REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA.	03
		REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL REGIONAL.	04
	IGARAPÉ-MIRI	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO RODOVIÁRIA.	05
		URBANIZAÇÃO DA ORLA.	06
TOTAL PROJETOS TOCANTINS			06

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Nº PROJETOS
XINGU	ALTAMIRA	POLICLÍNICA DE ALTAMIRA.	01
	ANAPU	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA.	02
		REFORMA DA PRAÇA SÃO LUIS, COM PLAYGROUND, ACADEMIA AO AR LIVRE E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO.	03
		PRAÇA COM PLAYGROUND, ACADEMIA AO AR LIVRE E DOIS QUIOSQUES NA VILA BELO MONTE.	04
		CONSTRUÇÃO DA SEDE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACS.	05
	BRASIL NOVO	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA SANTOSDUMONT NA VICINAL 19.	06
	MEDICILÂNDIA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA.	07
TOTAL PROJETOS XINGU			07
TOTAL GERAL PROJETOS SEDOP			62

CAPÍTULO V

AÇÕES REALIZADAS EM 2021 QUE CONTRIBUEM COM AS METAS DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEIS (ODS)

5.1. Alinhamento Ações Sedop X Metas ODS

Considerando que o processo de elaboração do PPA 2020/2023 teve como direcionamento a institucionalização da Agenda 2030¹, ou seja, a adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) como um dos parâmetros para elaboração dos Programas e Ações Governamentais, a Sedop participa deste processo com o desenvolvimento de 14 Ações Governamentais que contribuem para o alcance de 10 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 23 metas dos ODS.

É importante ressaltar que, dos 10 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) impactados pelas ações da Sedop, 03 alinham-se diretamente com as ações voltadas para implementação de Políticas Públicas desenvolvidas pelo Governo do Estado do Pará. A tabela abaixo, que teve como fonte o *Relatório Local Voluntário sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Estado do Pará – 2021*, relaciona estes ODS com as respectivas Ações Governamentais.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)	AÇÕES GOVERNAMENTAIS
OBJETIVO 1: ACABAR COM A POBREZA EM TODAS AS SUAS FORMAS, EM TODOS OS LUGARES.	Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas;
OBJETIVO 6: ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE E GESTÃO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA E SANEAMENTO PARA TODAS E TODOS.	Ação 7480. Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba;
	Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água;
	Ação 7568. Realização de Obras de Esgotamento Sanitário;
	Ação 7642. Oferta de Unidade Habitacional;
	Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico;
OBJETIVO 11. TORNAR AS CIDADES E OS ASSENTAMENTOS HUMANOS INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES E SUSTENTÁVEIS.	Ação 8694. Apoio Técnico-institucional da Elaboração e implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano;
	Ação 7644. Implantação de Aterros Sanitários;
	Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico;
	Ação 8694. Apoio Técnico-institucional da Elaboração e implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano;
	Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas;
	8463. Apoio às Ações do Concidades.

¹ A Agenda 2030 é um compromisso global assumido em 2015 por 193 países, incluindo o Brasil. A agenda é coordenada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e propõe a ação de governos, instituições, empresas e a sociedade em geral para o enfrentamento dos maiores desafios do mundo contemporâneo. (Fonte: www.agenda2030.com.br).

Reconhecendo a importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) e motivada para contribuir com a implementação da Agenda 2030 no Estado do Pará, em 2021, a Sedop investiu cerca de **R\$ 440.488.807,08** em obras de Saneamento Básico, Infraestrutura Urbana e em ações voltadas para implementação da Política Estadual de Saneamento Básico e elaboração de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano. Estas ações alcançaram as 12 Regiões de Integração, envolvendo 104 municípios.

Para melhor entendimento, são apresentadas a seguir, tabelas que consolidam as principais realizações da Sedop no exercício de 2021 que contribuíram diretamente para o alcance dos ODS, bem como, das metas correspondentes. Finalizando, ao final deste capítulo encontra-se o *Glossário* das Metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) descrevendo de maneira sintetizada a conceituação das metas correspondentes.

PROGRAMA 1489. DESENVOLVIMENTO URBANO – HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MOBILIDADE

OBJETIVO 2: PROMOVER E DISPONIBILIZAR AOS USUÁRIOS O ACESSO AO SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO.

AÇÃO	PRINCIPAIS REALIZAÇÕES	OBJETIVO ODS	META ODS CORRESPONDENTE
7567. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	4.910 LIGAÇÕES DOMICILIARES REALIZADAS.	1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA; 3. SAÚDE E BEM-ESTAR; 6. ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO; 9. INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA.	1.4, 1.5, 3.3, 3.9, 6.1, 6.2 e 6.3
8692. APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO.	02 INSTRUMENTOS ELABORADOS.	6. ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO; 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS.	6.b, 11.3 e 11.a

OBJETIVO 3: DISPONIBILIZAR O ACESSO AOS SERVIÇOS URBANOS DE MOBILIDADE E ORDENAMENTO TERRITORIAL

AÇÃO	PRINCIPAIS REALIZAÇÕES	OBJETIVO ODS	META ODS CORRESPONDENTE
7645. PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS	914,10 KM DE VIAS PAVIMENTADAS	1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA; 3. SAÚDE E BEM-ESTAR; 10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES; 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS.	1.4, 3.6 e 11.2
8694. APOIO TÉCNICO-INSTITUCIONAL NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO.	05 INSTRUMENTOS ELABORADOS.	6. ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO; 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS.	10.3, 11.2 e 11.3.

PROGRAMA 1508. GOVERNANÇA PÚBLICA

OBJETIVO 3: PROMOVER A GESTÃO REGIONALIZADA

AÇÃO	PRINCIPAIS REALIZAÇÕES	OBJETIVO ODS	META ODS CORRESPONDENTE
7556. APOIO A CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS DE UTILIZAÇÃO PÚBLICA.	18 OBRAS REALIZADAS.	8. TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO; 9. INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA; 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS.	11.7
8890. FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL.	01 MUNICÍPIO ATENDIDO.	8. TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO; 9. INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA; 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS.	8.3, 9.1, 11.7, 11.a, 11.B, 17.7.

OBJETIVO 4: PROVER A GOVERNABILIDADE DO PODER EXECUTIVO

AÇÃO	PRINCIPAIS REALIZAÇÕES	OBJETIVO ODS	META ODS CORRESPONDENTE
7552. CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS ESTADUAIS.	03 OBRAS REALIZADAS.	16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES.	16.6

GLOSSÁRIO

Meta 1.4 (Brasil): Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade, tenham acesso a serviços sociais, infraestrutura básica, novas tecnologias e meios para produção, tecnologias de informação e comunicação, serviços financeiros e segurança no acesso equitativo à terra e aos recursos naturais.

Meta 1.5 (Nações Unidas): Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais.

Meta 3.3 (Brasil): Até 2030 acabar, como problema de saúde pública, com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária, hepatites virais, doenças negligenciadas, doenças transmitidas pela água, arboviroses transmitidas pelo *aedes aegypti* e outras doenças transmissíveis.

Meta 3.6 (Brasil): Até 2030, reduzir pela metade as mortes e lesões por acidentes no trânsito.

Meta 3.9 (Nações Unidas): Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos, contaminação e poluição do ar e água e do solo.

Meta 5.a (Brasil): Garantir igualdade de direitos, de acesso e de controle dos recursos econômicos, da terra e de outras formas de propriedade, de serviços financeiros, de herança e de recursos naturais de forma sustentável, por meio de políticas de crédito, capacitação, assistência técnica, reforma agrária e habitação, entre outras, em especial para as mulheres do campo, da floresta, das águas e das periferias urbanas.

Meta 6.1 (Brasil): Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água para consumo humano, segura e acessível para todas e todos.

Meta 6.2 (Nações Unidas): Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade.

Meta 6.3 (Brasil): Até 2030, melhorar a qualidade da água nos corpos hídricos, reduzindo a poluição, eliminando despejos e minimizando o lançamento de materiais e substâncias perigosas, reduzindo pela metade a proporção do lançamento de efluentes não tratados e aumentando substancialmente o reciclo e reuso seguro localmente.

Meta 6.b (Brasil): Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, priorizando o controle social para melhorar a gestão da água e do saneamento.

Meta 8.3 (Brasil): Promover o desenvolvimento com a geração de trabalho digno; a formalização; o crescimento das micro, pequenas e médias empresas; o empreendedorismo e a inovação.

Meta 9.1 (Brasil): Aprimorar o sistema viário do País, com foco em sustentabilidade e segurança no trânsito e transporte, equalizando as desigualdades regionais, promovendo a integração regional e

transfronteiriça, na busca de menor custo, para o transporte de passageiros e de cargas, evitando perdas, com maior participação dos modos de alta capacidade como ferroviário, aquaviário e dutoviário, tornando-o acessível e proporcionando bem-estar a todos.

Meta 9.3 (Brasil): Aumentar e desburocratizar o acesso das micro e pequenas empresas a todos os serviços financeiros, garantindo crédito em condições adequadas à realidade dessas empresas, inclusive por meio de soluções tecnológicas inovadoras, para propiciar sua integração em cadeias de valor e mercados.

Meta 10.2 (Brasil): Incentivar cooperação internacional para o desenvolvimento, incluindo o investimento externo direto, para os Estados onde a necessidade é maior, em particular os países de menor desenvolvimento relativo, os países africanos, os pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países em desenvolvimento sem litoral, de acordo com seus planos e programas nacionais.

Meta 10.3 (Nações Unidas): Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultado, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e promover legislação, políticas e ações adequadas a este respeito.

Meta 11.1 (Brasil): Até 2030, garantir o acesso de todos a moradia digna, adequada e a preço acessível; aos serviços básicos e urbanizar os assentamentos precários de acordo com as metas assumidas no Plano Nacional de Habitação, com especial atenção para grupos em situação de vulnerabilidade.

Meta 11.2 (Brasil): Até 2030, melhorar a segurança viária e o acesso à cidade por meio de sistemas de mobilidade urbana mais sustentáveis, inclusivos, eficientes e justos, priorizando o transporte público de massa e o transporte ativo, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, como aquelas com deficiência e com mobilidade reduzida, mulheres, crianças e pessoas idosas.

Meta 11.3 (Brasil): Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, aprimorar as capacidades para o planejamento, para o controle social e para a gestão participativa, integrada e sustentável dos assentamentos humanos, em todas as unidades da federação.

Meta 11.7 (Brasil): Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em particular para as mulheres, crianças e adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência, e demais grupos em situação de vulnerabilidade.

Meta 11.a (Brasil): Apoiar a integração econômica, social e ambiental em áreas metropolitanas e entre áreas urbanas, periurbanas, rurais e cidades gêmeas, considerando territórios de povos e comunidades tradicionais, por meio da cooperação interfederativa, reforçando o planejamento nacional, regional e local de desenvolvimento.

Meta 16.6 (Brasil): Ampliar a transparência, a *accountability* e a efetividade das instituições, em todos os níveis.

CAPÍTULO VI

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO PPA 2020/2023

-ANO 2021-

6.1. PROGRAMA 1489:

DESENVOLVIMENTO URBANO – HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MOBILIDADE

AÇÕES GOVERNAMENTAIS:

- 7567.** REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
 - 7568.** REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
 - 7608.** CONSTRUÇÃO DE PARQUES URBANOS.
 - 7644.** IMPLANTAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS.
 - 7645.** PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS.
 - 7646.** IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GOVERNANÇA.
 - 8463.** APOIO ÀS AÇÕES DO CONCIDADES.
 - 8692.** APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO.
 - 8694.** APOIO TÉCNICO-INSTITUCIONAL NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO.
-

6.1.1. Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água

REGIÃO ARAGUAIA					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ÁGUA AZUL DO NORTE, FLORESTA DO ARAGUAIA, SANTA MARIA DAS BARREIRAS E SÃO FÉLIX DO XINGU.					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2021	NÃO FOI PREVISTO CONCLUSÃO DE OBRA EM 2021.

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021

Para o ano de 2021, foi programada a execução da *Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água* em quatro municípios da Região Araguaia: Água Azul do Norte, Floresta do Araguaia, Santa Maria das Barreiras e São Félix do Xingu.

Com relação as obras previstas para iniciarem em 2020 nos municípios de *Floresta do Araguaia, Santa Maria das Barreiras e São Félix do Xingu* e que teriam continuidade no ano de 2021, ressaltamos que as mesmas não puderam iniciar conforme o planejado, considerando que o ano de 2020 foi marcado pelo início da pandemia da Covid-19, onde uma das consequências ocasionadas por este cenário, foi a impossibilidade de avançar nas tratativas relacionadas ao início de novas obras.

Sendo assim, levando em conta que o cenário pandêmico evidenciou a vulnerabilidade social dos Municípios Paraenses com os menores índices de atendimento com rede de abastecimento de água e que o advento da Revisão do PPA 2020/2023 – Biênio 2022/2023 possibilitou que a Sedop revisasse todas as obras de Sistema de Abastecimento de Água (SAA) com status de NOVA, a área técnica propôs a manutenção ou alterações (inclusão/exclusão) dos municípios contemplados nos instrumentos de planejamento da Sedop (PPA 2020/2023, LOA/OGE 2022), fundamentada nos principais estudos e pesquisas disponíveis no âmbito do Saneamento Básico e tendo como referência os índices de atendimento com rede de abastecimento de água no Estado do Pará.

Com esta lógica de priorizar os municípios com os maiores índices de vulnerabilidade social, e considerando que a Sedop precisa delimitar seu campo de atuação para melhor cumprimento das metas estabelecidas para Região de Integração Araguaia, o município de Santa Maria das Barreiras será contemplado pela Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água em outro momento, mantendo-se a proposta de iniciar a “Construção de Sistema de Abastecimento de Água” nos municípios de Floresta do Araguaia e São Félix do Xingu no exercício de 2022.

Quanto a obra executada no município de Água Azul do Norte (*Perfuração de 2 poços com 90 metros e 8"cada*), a qual trata-se de uma complementação necessária para que o sistema de abastecimento de água já existente nos município possa funcionar com eficiência e eficácia, a mesma foi concluída em Agosto de 2021, beneficiando cerca de 750 pessoas.

Faz-se necessário esclarecer que o fato de não haver meta física estabelecida para a Região Araguaia no ano de 2021, deve-se a não previsão de conclusão de obras para esta região no ano em questão, elucidando que o produto *Ligação Domiciliar Realizada* e consequentemente a meta física só poderá ser obtida com a conclusão das obras.

Sendo assim, é preciso ressaltar que o desempenho insatisfatório desta ação no exercício de 2021 está diretamente ligado a baixa ou nenhuma evolução das obras nesta região e não

diretamente a obtenção de meta física, uma vez que as mesmas não foram programadas para o ano de 2021.

Com relação ao desempenho financeiro, como as obras previstas não puderam ser iniciadas em 2021 e a obra referente ao município de Água Azul do Norte já estava em processo de conclusão desde o segundo semestre de 2020, o percentual físico da obra foi 100% executado, enquanto o percentual financeiro ainda encontra-se com pendências.

Por fim, considerando que a execução física e financeira da *Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água* na Região Araguaia não aconteceu conforme o programado nos instrumentos de Planejamento Público (PPA 2020/2023 e LOA 2020) e que esta situação impactou diretamente no baixo desempenho físico e financeiro desta ação, o conceito conferida a mesma para o ano de 2021 foi de *Abaixo do Esperado*.

REGIÃO BAIXO AMAZONAS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: BELTERRA, FARO, ÓBIDOS, PRAINHA.					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2021	3.700 LIGAÇÕES
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Dos quatro municípios programados para serem atendidos pela <i>Ação 7567. Realização de Obras de Sistema de Abastecimento de Água</i> no exercício de 2021, o único que não possui obra iniciada, é o município de Belterra, o qual foi contemplado com recursos oriundo da operação de crédito FINISA 2 para execução de obra de sistema de abastecimento de água. Atualmente o processo encontra-se na fase de início de elaboração do projeto básico e executivo, aguardando assinatura da ordem de serviço. Com relação as obras que estavam previstas para serem concluídas em 2020 nos municípios de <i>Faro e Prainha</i> mas que, por conta do cenário pandêmico da Covid – 19 não puderam seguir o cronograma físico e financeiro proposto para a finalização das mesmas, ainda em 2021 as consequências geradas por quase dois anos de pandemia mantiveram o status de paralisadas nas obras em questão, devido a não finalização do processo licitatório para posterior retomada das obras. Quanto a obra que estava em execução no município de Óbidos, foi finalizado o processo licitatório e celebrado contrato para “<i>Conclusão do Sistema de Abastecimento de Água</i>” no município. A conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2022 e beneficiará cerca de 31 mil habitantes do município. Com este cenário, infelizmente, a meta de 3.700 ligações domiciliares previstas para Região Baixo Amazonas no ano de 2021 não foi alcançada, uma vez que a conclusão das respectivas obras passa a ser meta convencionada para o ano de 2022. Com relação à execução financeira, embora as obras dos municípios planejados para terem desembolso financeiro durante o ano de 2021 não tenham tido execução física, do orçamento programado de R\$ 2.612.779,00¹ para o desenvolvimento desta ação na Região Baixo Amazonas, foram utilizados cerca de R\$ 3.853,58², referente a visita técnica para avaliar os danos causados pelo desabamento do Reservatório Elevado no município de Almeirim, no segundo semestre de 2020. Sendo assim, frente ao cenário apresentado em que a <i>Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água</i> não teve o desempenho físico e financeiro em consonância com o que foi programado para a Região Baixo Amazonas no ano de 2022, e consequentemente, não alcançou a meta estipulada para a Região, o desenvolvimento desta ação no decorrer do ano de 2021 foi <i>Abaixo do Esperado</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO CARAJÁS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ELDORADO DOS CARAJÁS, PALESTINA DO PARÁ, PIÇARRA E SÃO JOÃO DO ARAGUAIA.					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2021	1.051 LIGAÇÕES
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Em 2021, a <i>Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água</i> na Região Carajás abrangeu os municípios de <i>Eldorado dos Carajás, Palestina do Pará, Piçarra e São João do Araguaia</i>. Nos municípios de Eldorado dos Carajás e São João do Araguaia, todos com obras previstas para iniciarem em 2020 com continuidade em 2021, como consequência do cenário pandêmico, não houve possibilidade de avançar nas tratativas relacionadas ao início de novas obras. Quanto ao município de Piçarra, com o processo licitatório concluído, no segundo semestre de 2021 foi celebrado contrato para “Implantação de Sistema de Abastecimento de Água” no município. A obra tem previsão de conclusão para o segundo semestre de 2022 e beneficiará o município com 1.051 Ligações Domiciliares. Com relação a obra em desenvolvimento no município de Palestina do Pará, após a empresa responsável pela execução da obra ter sido notificada pela Sedop em 2020 sobre o não cumprimento do cronograma físico da obra, em julho de 2021 o contrato foi rescindido unilateralmente pela Sedop. Espera-se que no primeiro semestre de 2022 a obra seja retomada. Faz-se necessário esclarecer que o alcance da meta física estabelecida para a Região Carajás no ano de 2021 (1.051 Ligações Domiciliares) está diretamente relacionada a conclusão da obra no município de Piçarra, a qual, conforme apresentado anteriormente não pôde ser concluída e atribuindo desta forma um desempenho físico para esta ação na Região Carajás de <i>Abaixo do Esperado</i>. No que diz respeito ao desempenho financeiro, para o ano de 2021 foram programados R\$ 310.166,00¹ para o atendimento das obras planejadas para a Região Carajás, sendo utilizado apenas R\$ 296,76² referente a visita técnica na região. O baixo desempenho financeiro nada mais é do que um reflexo do ritmo da obra que está em descompasso com o cronograma físico e financeiro estabelecido para as obras. Por fim, levando em conta o contexto apresentado, o desempenho físico e financeiro da <i>Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água</i> na Região Carajás no exercício de 2021 apresenta o status de <i>Abaixo do Esperado</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO GUAJARÁ					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: BELÉM					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2021	24.830 LIGAÇÕES
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Em 2021, a atuação da Sedop na Região Guajará referente a Ação 7567. <i>Realização de Obras de Abastecimento de Água</i> continuou na busca da finalização das seguintes obras em execução no município de Belém: 1. A continuidade da obra “<i>Construção de Sistema de Abastecimento de Água - Ampliação do 4º Setor</i>”. 2. Início das obras de Sistema de Abastecimento de Água atendendo a população das ilhas do Combu, Murucutum e Ilha Grande. Com relação a primeira obra, cujo objeto passou a ser “<i>Reabilitação do Sistema de Abastecimento de Água no Município de Belém - 4º SETOR</i>” ao invés de “<i>Construção</i>” devido o serviço a ser realizado neste no projeto referir-se a substituição de 285 metros de rede de distribuição existente em fibrocimento para PVC/PBA com previsão de 145 ligações domiciliares (Relatório de Gestão 2020 – pág.59). É importante esclarecer que a informação da redução no número de ligações domiciliares chegou ao conhecimento da Diretoria de Planejamento no momento da elaboração do Relatório de Gestão 2020, ou seja, no final do ano de 2020, momento em que o planejamento orçamentário para o ano de 2021 já estava finalizado e com as respectivas metas físicas apresentadas pelas áreas que executam as ações governamentais inseridas no sistema, não sendo possível, a atualização da mesma para 145 ligações domiciliares. Quanto a execução da obra, em 2021, houve finalização do processo licitatório no primeiro semestre de 2021, com posterior celebração de contrato com a empresa vencedora. Entretanto, a Cosanpa através do seu “<i>Projeto de Controle e Redução de Perdas</i>” realizou a substituição das redes de distribuição existentes, bem como as ligações domiciliares, não sendo mais necessário a execução desta rede no mesmo local. Com este novo cenário, a Sedop está verificando junto a Cosanpa a existência de outra área onde o projeto possa ser implementado. Quanto à segunda obra, a qual envolve a construção de sistema de abastecimento de água que beneficie a população residente nas ilhas do Combu, Murucutum e Ilha Grande, foi celebrado contrato com empresa para elaboração dos projetos básicos e executivos para Implantação dos Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário das Ilhas, para posterior licitação da obra. A expectativa é que a obra seja entregue em 2022. Outro município da Região Guajará que, embora não tenha sido inserido nos instrumentos de planejamento, teve execução de obra em 2021 foi Ananindeua. Licitada em 2020, o contrato celebrado prevê a “<i>Recuperação de Rede de Água Danificada na Avenida Independência – Setor PAA</i>” e tem previsão de conclusão para o primeiro semestre de 2022. Com relação à execução financeira, do valor programado de R\$ 3.189.283,00¹ para atender a região, foram utilizados R\$3.866.973,07², ultrapassando em cerca de 22% do valor orçamentário planejado. O montante ultrapassado é justificado pelo pagamento do Contrato que a Sedop tem com a Empresa que presta serviços técnicos de Consultoria e Assessoria Técnica para Gerenciamento, Supervisão, Fiscalização e Acompanhamento de Ações, Contratos e Obras sob a responsabilidade da Sedop. Este pagamento está programado para					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

ser atendido por esta ação, na natureza de despesa 449035 – *Serviços de Consultoria* por ser considerado uma despesa necessária para a realização das obras de saneamento básico.

Por fim, levando em consideração todos os fatores apresentados, o desempenho da *Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água* na Região Guajará em 2021 foi *Abaixo do Esperado*.

REGIÃO GUAMÁ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: MARACANÃ, SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ, SÃO FRANCISCO DO PARÁ.					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2021	7.829 LIGAÇÕES
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Para o ano de 2021, foi planejado o desenvolvimento da <i>Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água</i> nos seguintes municípios da Região Guamá: <i>Maracanã, Santo Antônio do Tauá e São Francisco do Pará.</i> Com relação as obras desenvolvidas nos municípios de Maracanã e São Francisco do Pará, cujas obras são executadas através de convênio celebrado entre o Governo do Estado do Pará e a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, os embargos que impedem a continuidade destas obras ainda não foram sanados, o que impactou diretamente na não continuidade das obras no decorrer de 2021. É importante ressaltar que a resolutividade destes embargos não está exclusivamente sob a governabilidade da Sedop e que, por mais empenho que tenha, sozinha não garante que as obras sejam retomadas. Quanto a obra em execução no município de Santo Antônio do Tauá, embora tenha tido execução física no ano de 2021, a evolução da mesma está abaixo do cronograma físico e financeiro programado, não garantindo sua conclusão em 2021, adiando desta forma a entrega das 4.884 Ligações Domiciliares para o ano de 2022. Para a implementação desta ação na Região Guamá durante o ano de 2021, foi programado orçamento no valor de R\$ 3.084.983,00¹, sendo utilizado cerca de R\$ 921.138,20², o que corresponde a 30% do valor programado. Do valor utilizado, R\$ 737.965,15 foram destinados a execução de serviços complementares referentes a obras concluídas no ano de 2020. Por fim, por todos os fatores apresentados que impossibilitaram a obtenção da meta física estabelecida para o ano de 2021, assim como a baixa execução da meta financeira, garantiram a Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água na Região Guamá um desempenho físico e financeiro <i>Abaixo do Esperado.</i>					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO LAGO DE TUCURUÍ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: BREU BRANCO, GOIANÉSIA DO PARÁ, JACUNDÁ					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2021	15.416 LIGAÇÕES
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Adotando os mesmos critérios do ano anterior para a Região Lago de Tucuruí, em 2021 a Sedop considerou no planejamento de suas ações governamentais a continuidade das obras de Sistema de Abastecimento de Água nos municípios de <i>Breu Branco, Goianésia do Pará e Jacundá</i>. Como os municípios em questão são atendidos com recursos oriundos da Funasa, a premissa estabelecida pela Sedop desde o ano de 2019 foi de realizar levantamento minucioso para identificar todas as pendências, sejam elas de ordem técnica, documental ou financeira, de maneira a comprovar a real situação das obras da Funasa para posterior tomada de decisão. Com relação a obra referente ao município de Breu Branco, a mesma continua com o mesmo status do ano anterior, ou seja, paralisada e aguardando início de um novo processo licitatório. Mais uma vez ressaltamos que a resolutividade dos embargos que impedem a continuidade das obras não está exclusivamente sob a governabilidade da Sedop. Já a obra relacionada ao município de Goianésia do Pará, o processo licitatório foi finalizado, celebrado contrato com a empresa vencedora e Ordem de Serviço assinada em outubro de 2021, com previsão de conclusão da obra para o ano de 2022. Quanto a obra relacionada ao município de Jacundá, em 2021, por maior que tenha sido o empenho da Sedop para a finalização da mesma, não houve o avanço esperado para que a mesma pudesse ser concluída. Sendo assim, os esforços da Sedop é que a mesma seja concluída em 2022. Com relação ao desempenho financeiro, o orçamento programado para o desenvolvimento desta ação na Região Lago de Tucuruí foi de R\$ 2.656.485,00¹, entretanto devido às obras estarem paralisadas, houve dispêndio financeiro de apenas R\$ 1.483,59² referente a visitas técnicas realizadas na região. Neste sentido, pelos motivos apresentados e pela não obtenção da meta física, no exercício de 2021 a <i>Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água</i> apresentou desempenho físico e financeiro <i>Abaixo do Esperado</i> na Região Lago de Tucuruí.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO MARAJÓ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ANAJÁS, BAGRE, BREVES, CHAVES, GURUPÁ, MELGAÇO, PORTEL, SALVATERRA.					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2021	6.106 LIGAÇÕES

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021

Para a Região do Marajó, em 2021 a Sedop programou a atendimento de 08 (oito) municípios com obras de sistema de abastecimento de água. São eles: *Anajás, Bagre, Breves, Chaves, Gurupá, Melgaço, Portel, Salvaterra.*

Com relação as obras previstas para iniciarem em 2020 nos municípios de Bagre, Chaves, Gurupá, Melgaço, Portel e Salvaterra e que teriam continuidade no ano de 2021, ressaltamos que as mesmas não puderam iniciar conforme o planejado, considerando que o ano de 2020 foi marcado pelo início da pandemia da Covid-19, onde uma das consequências ocasionadas por este cenário, foi a impossibilidade de avançar nas tratativas relacionadas ao início de novas obras.

Sendo assim, levando em conta que o cenário pandêmico evidenciou a vulnerabilidade social dos Municípios Paraenses com os menores índices de atendimento com rede de abastecimento de água e que o advento da Revisão do PPA 2020/2023 – Biênio 2022/2023 possibilitou que a Sedop revisasse todas as obras de Sistema de Abastecimento de Água (SAA) com status de NOVA, a área técnica propôs a manutenção ou alterações (inclusão/exclusão) dos municípios contemplados nos instrumentos de planejamento da Sedop (PPA 2020/2023, LOA/OGE 2022), fundamentada nos principais estudos e pesquisas disponíveis no âmbito do Saneamento Básico e tendo como referência os índices de atendimento com rede de abastecimento de água no Estado do Pará.

Com esta lógica de priorizar os municípios com os maiores índices de vulnerabilidade social, e considerando que a Sedop precisa delimitar seu campo de atuação para melhor cumprimento das metas estabelecidas para Região de Integração Marajó, os municípios de Chaves, Gurupá e Melgaço, serão contemplados pela Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água em outro momento, mantendo-se a proposta de iniciar as obras de “Construção de Sistema de Abastecimento de Água” nos municípios de Bagre, Portel e Salvaterra no exercício de 2022.

Com relação a obra no município de Anajás, trata-se de obra financiada com recurso do PAC Funasa, a qual, depois da conclusão de novo processo licitatório, foi retomada em 2021. Encontra-se em execução tendo conclusão prevista para 2º semestre de 2022.

Quanto a obra que envolve a Construção de Sistema de Abastecimento de Água no município de Salvaterra, em 2021, foi celebrado contrato com empresa para elaboração dos projetos básicos e executivos para Implantação dos Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário no município, para posterior licitação da obra. A expectativa é que a obra seja entregue em 2022.

Outros municípios da Região Marajó que, embora não tenham sido inserido nos instrumentos de planejamento, mesmo assim, tiveram execução de obra em 2021 foram Breves e Ponta de Pedras. No município de Breves, trata-se de um repasse para Prefeitura Municipal para Construção de Sistema de Abastecimento de Água no Bairro Parque Universitário – Etapa I.

Já no município de Ponta de Pedras, a Sedop atendeu demanda do município para Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água através de execução direta, concluindo a obra em 2021, beneficiando a população com 105 Ligações Domiciliares.

Com relação à execução financeira, do valor de R\$ 2.200.000,00¹ programado para o ano de 2021, foram utilizados R\$ 2.193.544,17² o que corresponde a 99,71% do orçamento planejado, entretanto não reflete necessariamente dispêndio com a execução de obras nos municípios previstos para o ano de 2021. Cerca de R\$ 845.007,01 está relacionado às tentativas de regularizar as pendências existentes em obras executadas com recursos da FUNASA na Região Marajó, seja concentrando esforços para finalizar obras previstas para encerrar no exercício passado, como no caso de Curralinho, São Sebastião da Boa Vista, seja através da devolução de saldo do convênio para FUNASA.

Sendo assim, considerando às circunstâncias apresentadas, no decorrer do ano de 2021, a *Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água* na Região Marajó apresentou o desempenho físico e financeiro *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO RIO CAETÉ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: QUATIPURU					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2021	1.335 LIGAÇÕES
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
A atuação da Sedop na Região Rio Caeté durante o ano de 2021 concentrou-se na conclusão da obra de sistema de abastecimento de água no município de Quatipuru, contemplado com recurso proveniente do PAC FUNASA. Depois de um longo tempo paralisada, ainda em 2020, a Sedop deu prosseguimento a obra de “Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água” no município de Quatipuru. Entretanto, faz-se necessário destacar que, mesmo a obra apresentando evolução física no decorrer do ano de 2021, a execução manteve-se abaixo do programado no cronograma físico e financeiro, interferindo diretamente no fato da obra não ter sido concluída e, consequentemente, o município não ter sido beneficiado com 1.335 Ligações Domiciliares. Com relação à execução financeira, do valor programado de R\$ 250.000,00¹ para atender a Região Rio Caeté, foram utilizados R\$ 1.054.997,83², ultrapassando o valor orçamentário planejado em cerca de R\$ 804.997,83. Esta divergência ocorre principalmente devido a limitação do teto orçamentário disponibilizado para a Sedop, o qual não traduz a real necessidade para execução da obra. Por fim, considerando que a meta física acordada para a região não foi alcançada, e que esta situação influencia diretamente no baixo desempenho físico e financeiro da Ação 7567. <i>Realização de Obras de Abastecimento de Água</i> na Região Rio Caeté, o status obtido na referida região foi de <i>Abaixo do Esperado</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO RIO CAPIM					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: IRITUIA, NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2021	1.677 LIGAÇÕES
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Para o ano de 2021, a atuação da Sedop na Região Rio Capim através da <i>Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água</i> esteve concentrada no desenvolvimento das obras nos Municípios de Irituia e Nova Esperança do Piriá. A obra no município de Irituia faz parte do conjunto de obras da FUNASA que tiveram que passar por minucioso levantamento (técnico, documental, financeiro...) durante o ano de 2019 e que, depois de identificadas e sanadas todas as pendências, houve necessidade de realizar um novo processo licitatório, situação em que a obra se encontra atualmente. A Obra de Nova Esperança do Piriá é executada através de Contrato de Repasse com a Caixa Econômica Federal – CEF, e após ter passado por um novo processo licitatório no ano de 2020, em 2021, apesar da obra ter apresentado evolução física abaixo do planejado no cronograma físico e financeiro, mantém-se a previsão de conclusão para o ano de 2022. Embora nos instrumentos de planejamento da Sedop, em 2021 tenham sido programados o desenvolvimento desta ação em apenas dois municípios da Região Rio Capim, devido a impossibilidade de conclusão da obra de sistema de abastecimento de água no município de Ourém em 2020, no decorrer de 2021 a Sedop seguiu com a premissa de dar continuidade e concluir em Ourém. No segundo semestre de 2021, a referida obra foi concluída com capacidade para atender 9 mil pessoas, com mais de 19 quilômetros de redes novas. A captação da água é feita no Rio Guamá e o tratamento de água possui floculador, decantador e filtro. Além de reservatório apoiado com volume para reservar 500m³ de água e reservatório elevado com capacidade para 100 m³ de água. Quanto a meta física estabelecida para a Região Rio Capim, embora a mesma esteja diretamente relacionada a previsão de conclusão da obra no município de Irituia, a finalização da obra em Ourém, possibilita que a Região seja contemplada com sistema de abastecimento de água com capacidade para 1.020 ligações domiciliares, atingindo cerca de 60,82% da meta estabelecida para a região. Com relação ao desempenho financeiro, do valor de R\$ 1.532.500,00¹ programado para atender esta região durante o ano de 2021, foram utilizados cerca de R\$ 950.712,55², utilizando 62% da meta financeira estabelecida. Finalizando, considerando as informações acima expostas, informamos que o desempenho físico e financeiro da <i>Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água</i> durante o ano de 2021 <i>Merece Atenção</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO TAPAJÓS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: AVEIRO, ITAITUBA, JACAREACANGA, TRAIRÃO					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2021	720 LIGAÇÕES

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021

Para o ano de 2021, na Região Tapajós, a Sedop programou atender os municípios de Aveiro, Itaituba, Jacareacanga e Trairão através da *Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água*. Com exceção do município de Jacareacanga, os demais municípios constam no PPA 2020/2023 como proposições de obras novas de sistema de abastecimento de água para a Região Tapajós, as quais tinham previsão de serem iniciadas em 2020.

No que diz respeito as obras previstas para os municípios de Aveiro, Itaituba e Trairão, as mesmas fazem parte do Contrato 87/2020 – Lote 1 Região Tapajós cujo objeto do instrumento é a “*Construção de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água*”. A tabela abaixo, apresenta a evolução das obras nos respectivos municípios:

MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	SITUAÇÃO ATUAL
AVEIRO	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, VILA BRASÍLIA LEGAL, CAUÁ SU Ê PÁ, MONTE CARMELO E SANTA CRUZ, LOTE 01.	Prevista para iniciar em 2021, houve atraso no início da obra devido à dificuldade de transporte, obtenção e entrega dos insumos, situação estas imposta pela pandemia da covid – 19. Outro aspecto relevante que impactou diretamente a progressão da obra, foi o difícil acesso às regiões isoladas e longínquas, uma vez que, devido ao período de fortes chuvas na região, as estradas vicinais ficaram intratáveis. Todavia, cabe ressaltar que a obra segue em execução com previsão de conclusão para o ano de 2022.
ITAITUBA	IMPLANTAÇÃO DE MICROSSISTEMA DE ÁGUA, NAS COMUNIDADES DE MORAES DE ALMEIDA E NOVA UNIÃO - LOTE 1	A obra segue seu fluxo conforme o acordado em seu cronograma físico - financeiro, onde já foi concluída a perfuração do poço e atualmente segue na execução da estrutura do reservatório. O Microsistema beneficiará duas comunidades no município de Itaituba.
TRAIRÃO	IMPLANTAÇÃO DE MICROSSISTEMA SIMPLIFICADO DE ÁGUA, NAS COMUNIDADES DE TRÊS BOEIRAS E VILA PLANALTO - LOTE 1.	A obra segue seu fluxo conforme o acordado em seu cronograma físico - financeiro, onde já foi concluída a perfuração do poço e atualmente segue na execução da estrutura do reservatório. O Microsistema beneficiará duas comunidades no município de Trairão.

Quanto o município de Jacareacanga, a elaboração do novo projeto básico ainda não foi finalizado, impossibilitando desta forma o início do processo licitatório para posterior continuidade e conclusão da obra. Sendo assim, em 2021, a obra continuou com o status de paralisada.

Com relação ao desempenho financeiro, do valor de R\$ 570.000,00¹ programado para atender esta região durante o ano de 2021, foram utilizados cerca de R\$ 587.716,78², ultrapassando em 3% a meta financeira estabelecida, o que justifica-se pela limitação do teto

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

orçamentário disponibilizado à Sedop no momento da elaboração do orçamento para o ano de 2021.

Neste sentido, mesmo considerando que embora as obras tenham tido os avanços acima relatados nos municípios planejados, a meta física de 720 ligações domiciliares não foi obtida o que configura que o desempenho da *Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água* na Região Tapajós foi *Abaixo do Esperado*.

REGIÃO TOCANTINS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ACARÁ, BARCARENA, TAILÂNDIA					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2021	16.829 LIGAÇÕES
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Em 2021, a Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água foi programada para atender os municípios de Acará, Barcarena e Tailândia na Região Tocantins. Com relação as obras previstas para iniciarem em 2020 nos municípios de Acará e Barcarena e que teriam continuidade no ano de 2021, ressaltamos que as mesmas não puderam iniciar conforme o planejado, considerando que o ano de 2020 foi marcado pelo início da pandemia da Covid-19, onde uma das consequências ocasionadas por este cenário, foi a impossibilidade de avançar nas tratativas relacionadas ao início de novas obras. Sendo assim, levando em conta que o cenário pandêmico evidenciou a vulnerabilidade social dos Municípios Paraenses com os menores índices de atendimento com rede de abastecimento de água e que o advento da Revisão do PPA 2020/2023 – Biênio 2022/2023 possibilitou que a Sedop revisasse todas as obras de Sistema de Abastecimento de Água (SAA) com status de NOVA, a área técnica propôs a manutenção ou alterações (inclusão/exclusão) dos municípios contemplados nos instrumentos de planejamento da Sedop (PPA 2020/2023, LOA/OGE 2022), fundamentada nos principais estudos e pesquisas disponíveis no âmbito do Saneamento Básico e tendo como referência os índices de atendimento com rede de abastecimento de água no Estado do Pará. Com esta lógica de priorizar os municípios com os maiores índices de vulnerabilidade social, e considerando que a Sedop precisa delimitar seu campo de atuação para melhor cumprimento das metas estabelecidas para Região de Integração Tocantins, os municípios de Acará e Barcarena serão contemplados pela Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água em outro momento. Quanto o município de Tailândia, o mesmo é atendido com duas obras de Sistema de Abastecimento de Água. Uma financiada com recursos da Funasa (área rural) e outra com recursos da Caixa Econômica Federal. Com relação a obra financiada pela Funasa, embora durante o ano de 2021 tenha apresentado evolução física, sua execução ainda está em desacordo com o cronograma físico e financeiro estabelecido para a obra. Quanto a obra financiada com recursos da CAIXA, após ter passado por um novo processo licitatório, em 2021 foram realizados serviços referentes a instalação do canteiro de obras, limpeza do terreno, impermeabilização e lastro do reservatório apoiado. Outro município da Região Tocantins que, mesmo não tendo sido programado, teve execução de obra de sistema de abastecimento de água foi Oeiras do Pará. Trata-se de obra financiada com recurso Pac Funasa a qual estava prevista para ser concluída em 2020, no entanto, neste mesmo ano, o contrato com a empresa que executava a obra foi rescindido e iniciado um novo processo licitatório e adiando a conclusão da obra para 2022. Quanto ao desempenho físico desta ação na Região Tocantins, a baixa evolução física das obras de sistema de abastecimento de água dos municípios planejados impactaram diretamente no não atingimento da meta estabelecida para região, uma vez que a obtenção da mesma é consequência da conclusão destas obras.					

Com relação à execução financeira, do valor de R\$ 1.028.663,00¹ programado para atender a Região Tocantins no decorrer do ano de 2021, houve movimentação orçamentária no valor de R\$ 609.867,15² para pagamento de serviços relacionados a execução das obras.

Neste sentido, mesmo considerando que embora as obras tenham tido os avanços acima relatados, a meta física estabelecida para o ano de 2021 não foi obtida, o que configura que o desempenho da *Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água* na Região Tocantins foi *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO XINGU					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ALTAMIRA, ANAPU, BRASIL NOVO, MEDICILÂNDIA, PACAJÁ, PLACAS, URUARÁ, VITÓRIA DO XINGU					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2021	8.106 LIGAÇÕES

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021

Para a Região de Integração Xingu, foram mantidos os mesmos municípios atendidos em 2020: Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Placas, Uruará e Vitória do Xingu.

Conforme pode ser constatado no Relatório de Gestão do ano de 2020, com exceção do município de Placas, todos os outros municípios foram incluídos no PPA 2020/2023 com a perspectiva de serem iniciadas novas obras de sistema de abastecimento de água. No entanto, apenas os municípios de Altamira e Uruará tiveram obras iniciadas.

No que diz respeito as obras previstas para os municípios de Altamira, Anapu e Uruará, as mesmas fazem parte do Contrato 88/2020 – Lote 2 Região Xingu cujo objeto do instrumento é a *“Construção de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água”*. Em Altamira, a obra está sendo executada na Travessa da Nove e Agrovila Quatro Bocas apesar do atraso imposto pela pandemia da covid-19 para início da obra e do difícil acesso devido ao período de fortes chuvas, o qual tornou as estradas vicinais intrafegáveis. Entretanto, cabe ressaltar que a obra segue em execução com previsão de conclusão para o ano de 2022.

Em Anapu, foi concluída a obra de *“Implantação de Microssistema de Abastecimento de Água no Bairro Alto Bonito”* com capacidade para atender 3.877 pessoas e disponibilizando 280 Ligações Domiciliares.

No município de Uruará, trata-se de *“Construção de sistema simplificado de água, Vila Brasil, Vila dos Imigrantes, Vila Bonita, Vila Bela Vista, Vila Monte Sinai, Vila Burificação e Vila Canaã”*. A obra foi concluída no primeiro semestre de 2021, com instalações que englobam a captação, adução, tratamento e distribuição de água potável para atender uma população de Uruará e suas agrovilas, beneficiando os indivíduos destas regiões com 385 Ligações Domiciliares.

Quanto aos demais municípios (Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá e Vitória do Xingu) previstos para iniciarem as obras em 2020, ressaltamos que as mesmas não puderam iniciar conforme o planejado, considerando que o ano de 2020 foi marcado pelo início da pandemia da Covid-19, onde uma das consequências ocasionadas por este cenário, foi a impossibilidade de avançar nas tratativas relacionadas ao início de novas obras.

Sendo assim, levando em conta que o cenário pandêmico evidenciou a vulnerabilidade social dos Municípios Paraenses com os menores índices de atendimento com rede de abastecimento de água e que o advento da Revisão do PPA 2020/2023 – Biênio 2022/2023 possibilitou que a Sedop revisasse todas as obras de Sistema de Abastecimento de Água (SAA) com status de NOVA, a área técnica propôs a manutenção ou alterações (inclusão/exclusão) dos municípios contemplados nos instrumentos de planejamento da Sedop (PPA 2020/2023, LOA/OGE 2022), fundamentada nos principais estudos e pesquisas disponíveis no âmbito do Saneamento Básico e tendo como referência os índices de atendimento com rede de abastecimento de água no Estado do Pará.

Com esta lógica de priorizar os municípios com os maiores índices de vulnerabilidade social, e considerando que a Sedop precisa delimitar seu campo de atuação para melhor

cumprimento das metas estabelecidas para Região de Integração Xingu, os já referidos municípios serão contemplados pela Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água em outro momento.

Com relação ao município de Placas, o mesmo faz parte dos municípios que foram beneficiados com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com financiamento oriundo da FUNASA e, embora no ano de 2021 a obra tenha apresentado evolução física, sua execução ainda está em desacordo com o cronograma físico e financeiro não sendo possível sua conclusão em 2021.

Ainda em relação ao município de Placas, o município também está sendo atendido pelo Contrato 88/2020 – Lote 2 Região Xingu com a *“Construção de sistema simplificado de água, Vila Seca e Vila da Palha”* e que, apesar do atraso imposto pela pandemia da covid-19 para início da obra e do difícil acesso devido ao período de fortes chuvas, o qual tornou as estradas vicinais intrafegáveis, segue em execução com previsão de conclusão para o ano de 2022.

Quanto à execução financeira, do valor de R\$ 751.924,00¹ programado para atender a Região Xingu no decorrer do ano de 2021, houve movimentação orçamentária no valor de R\$ 941.162,72², ultrapassando o valor planejado em cerca de 25%, o que justifica-se pela limitação do teto orçamentário disponibilizado à Sedop no momento da elaboração do orçamento para o ano de 2021.

Finalizando, diante do cenário apresentado e levando em consideração que não foi possível alcançar a meta estabelecida para a Região Xingu, o desempenho físico e financeiro da Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água no exercício de 2021 esteve *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

6.1.2. Ação 7568. Realização de Obras de Esgotamento Sanitário

REGIÃO ARAGUAIA					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: SANTA MARIA DAS BARREIRAS					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 20221	2.352 LIGAÇÕES
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
O atendimento do município de Santa Maria das Barreiras com obra de Sistema de Esgotamento Sanitário, foi uma proposição da Sedop para o PPA 2020/2023, que tinha como foco o início da obra no primeiro ano do PPA (2020). No entanto, conforme consta no Relatório de Gestão da Sedop – Ano 2020, a obra não pôde iniciar de acordo com o planejado, considerando que o ano de 2020 foi marcado pela pandemia da Covid-19, tendo como uma das consequências ocasionadas por este cenário, a impossibilidade de avançar nas tratativas relacionadas ao início de novas obras. Sendo assim, levando em conta que o cenário pandêmico evidenciou a vulnerabilidade social dos Municípios Paraenses com os menores índices de atendimento com rede de esgotamento sanitário e que o advento da Revisão do PPA 2020/2023 – Biênio 2022/2023 possibilitou que a Sedop revisasse todas as obras de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) com status de NOVA, a área técnica propôs a manutenção ou alterações (inclusão/exclusão) dos municípios contemplados nos instrumentos de planejamento da Sedop (PPA 2020/2023, LOA/OGE 2022), fundamentada nos principais estudos e pesquisas disponíveis no âmbito do Saneamento Básico e tendo como referência os índices de atendimento com rede de esgotamento sanitário no Estado do Pará. Com esta lógica de priorizar os municípios com os maiores índices de vulnerabilidade social, e considerando que a Sedop precisa delimitar seu campo de atuação para melhor cumprimento das metas estabelecidas nos instrumentos de planejamento público, o município de Santa Maria das Barreiras será contemplado pela Ação 7568. Realização de Obras de Esgotamento Sanitário em outro momento. Quanto à execução financeira, embora a <i>Ação 7568. Realização de Obras de Sistema de Esgotamento Sanitário</i> tenha recebido um aporte orçamentário de R\$ 300.000,00¹ para execução de obras, os motivos acima apresentados acabaram por impedir o desempenho físico e, consequentemente, o desempenho financeiro desta ação na Região Araguaia, concedendo a mesma o status de <i>Abaixo do Esperado</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO BAIXO AMAZONAS					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: BELTERRA					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2021	500 LIGAÇÕES
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Para o ano de 2021, dentre os municípios que integram a Região Baixo Amazonas, o município de Belterra foi uma proposição da Sedop para o PPA 2020/2023, sendo desta feita, beneficiado com obra de sistema de esgotamento sanitário através da execução da <i>Ação 7568. Realização de Obras de Esgotamento Sanitário</i>. Sendo uma proposição para o PPA 2020/2023, o objetivo almejado era de que a obra iniciasse no primeiro ano do PPA, ou seja, em 2020. Entretanto, conforme consta no Relatório de Gestão da Sedop – Ano 2020, a obra não pôde iniciar em concordância com o planejado, considerando que o ano de 2020 foi marcado pela pandemia da Covid-19, tendo como uma das consequências ocasionadas por este cenário, a impossibilidade de avançar nas tratativas relacionadas ao início de novas obras. Com este contexto, o início das tratativas relacionadas a execução da obra de sistema de esgotamento sanitário para o município de Belterra foi postergado para o ano de 2021. Para a execução desta obra, o referido município foi contemplado com recursos oriundos da operação de crédito FINISA 2. No segundo semestre de 2021 (Novembro), foi celebrado contrato com a empresa, cujo objeto do instrumento é a “Elaboração dos Projetos Básicos e Executivos para Implantação dos Sistemas de Água e Esgotamento Sanitário da Cidade de Belterra”. Atualmente o processo encontra-se na fase de início de elaboração do projeto básico e executivo, aguardando assinatura da ordem de serviço. Quanto à execução financeira, embora a <i>Ação 7568. Realização de Obras de Sistema de Esgotamento Sanitário</i> tenha recebido um aporte orçamentário de R\$ 3.465.000,00¹, como o serviço ainda está na fase inicial, não houve etapa concluída para pagamento referente a execução de serviços, portanto não ocorreu nenhum desembolso financeiro no decorrer do ano de 2021. Por fim, considerando os motivos acima apresentados, o desempenho físico e financeiro da <i>Ação 7568. Realização de Obras de Esgotamento Sanitário na Região Baixo Amazonas</i>, no exercício de 2021 apresentou o status <i>Abaixo do Esperado</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO - NOVEMBRO/2021.

REGIÃO GUAJARÁ					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: BELÉM					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2021	300 LIGAÇÕES
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Na Região Guajará, para o ano de 2021, a Sedop programou o atender com obra de sistema de esgotamento sanitário três ilhas próximas ao município de Belém: Ilha do Combu, Ilha Murucutum e Ilha Grande. Sendo uma proposição para o PPA 2020/2023, o objetivo almejado era de que a obra iniciasse no primeiro ano do PPA, ou seja, em 2020. Entretanto, conforme consta no Relatório de Gestão da Sedop – Ano 2020, a obra não pôde iniciar em concordância com o planejado, considerando que o ano de 2020 foi marcado pela pandemia da Covid-19, tendo como uma das consequências ocasionadas por este cenário, a impossibilidade de avançar nas tratativas relacionadas ao início de novas obras. Com este contexto, o início das tratativas relacionadas a execução da obra de sistema de esgotamento sanitário para as Ilhas do Combu, Murucutum e Grande foi postergado para o ano de 2021. Para a execução desta obra, o referido município foi contemplado com recursos oriundos da operação de crédito FINISA 2. No segundo semestre de 2021 (Novembro), foi celebrado contrato com a empresa, cujo objeto do instrumento é a “Elaboração dos Projetos Básicos e Executivos para Implantação dos Sistemas de Água e Esgotamento Sanitário das Ilhas do Combu, Murucutum e Ilha Grande”. Atualmente o processo encontra-se na fase de início de elaboração do projeto básico e executivo, aguardando assinatura da ordem de serviço. Quanto à execução financeira, embora a <i>Ação 7568. Realização de Obras de Sistema de Esgotamento Sanitário</i> tenha recebido um aporte orçamentário de R\$ 1.685.660,00¹, como o serviço ainda está na fase inicial, não houve etapa concluída para pagamento referente a execução de serviços, portanto não ocorreu nenhum desembolso financeiro no decorrer do ano de 2021. Por fim, considerando os motivos acima apresentados, o desempenho físico e financeiro da Ação 7568. Realização de Obras de Esgotamento Sanitário na Região Guajará, no exercício de 2021 apresentou o status <i>Abaixo do Esperado</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO - NOVEMBRO/2021.

REGIÃO MARAJÓ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: BREVES, SALVATERRA, SOURE					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2021	22.641 LIGAÇÕES
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Em 2021, a Sedop planejou implementar a <i>Ação 7568. Realização de Obras de Esgotamento Sanitário</i> na Região Marajó, nos municípios de Breves, Salvaterra e Soure. O atendimento do município de Breves com obra de Sistema de Esgotamento Sanitário, foi uma proposição da Sedop para o PPA 2020/2023, que tinha como foco o início da obra no primeiro ano do PPA (2020). No entanto, conforme consta no Relatório de Gestão da Sedop – Ano 2020, a obra não pôde iniciar de acordo com o planejado, considerando que o ano de 2020 foi marcado pela pandemia da Covid-19, tendo como uma das consequências ocasionadas por este cenário, a impossibilidade de avançar nas tratativas relacionadas ao início de novas obras. Sendo assim, levando em conta que o cenário pandêmico evidenciou a vulnerabilidade social dos Municípios Paraenses com os menores índices de atendimento com rede de esgotamento sanitário e que o advento da Revisão do PPA 2020/2023 – Biênio 2022/2023 possibilitou que a Sedop revisasse todas as obras de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) com status de NOVA, a área técnica propôs a manutenção ou alterações (inclusão/exclusão) dos municípios contemplados nos instrumentos de planejamento da Sedop (PPA 2020/2023, LOA/OGE 2022), fundamentada nos principais estudos e pesquisas disponíveis no âmbito do Saneamento Básico e tendo como referência os índices de atendimento com rede de esgotamento sanitário no Estado do Pará. Com esta lógica de priorizar os municípios com os maiores índices de vulnerabilidade social, e considerando que a Sedop precisa delimitar seu campo de atuação para melhor cumprimento das metas estabelecidas para Região Marajó, o município de Breves será contemplado pela Ação 7568. Realização de Obras de Esgotamento Sanitário em outro momento. O Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Salvaterra, também foi uma proposição para o PPA 2020/2023, e, assim como as demais obras previstas para iniciar em 2020, ficou impossibilitada em avançar nas tratativas para início da obra. Com este contexto, a execução da obra de sistema de esgotamento sanitário no município de Salvaterra foi postergado para o ano de 2021. Para a execução desta obra, o referido município foi contemplado com recursos oriundos da operação de crédito FINISA 2. No segundo semestre de 2021 (Novembro), foi celebrado contrato com a empresa, cujo objeto do instrumento é a “Elaboração dos Projetos Básicos e Executivos para Implantação dos Sistemas de Água e Esgotamento Sanitário da Cidade de Salvaterra”. Atualmente o processo encontra-se na fase de início de elaboração do projeto básico e executivo, aguardando assinatura da ordem de serviço. Quanto a obra de sistema de esgotamento sanitário no município de Soure, embora a Sedop tenha estabelecido como prioridade equacionar as pendências que impedem a continuidade e conclusão das obras com financiamento da Funasa, não houve avanço na resolutividade das pendências referentes a obra executada no município de Soure. A mesma manteve o status de paralisada no decorrer do ano de 2021, aguardando novo processo licitatório para continuidade dos serviços.					

Com relação à execução financeira, embora a ação tenha recebido aporte orçamentário no valor de R\$ 4.850.000,00¹, como as obras novas não puderam ser iniciadas e a obra do município de Soure não teve a evolução física esperada para o ano de 2021, o desempenho físico e, conseqüentemente, o desempenho financeiro da Ação 7568. Realização de Obras de Esgotamento Sanitário na Região Marajó em 2021 apresenta o status *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO - NOVEMBRO/2021.

REGIÃO TAPAJÓS					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: JACAREACANGA					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2021	720 LIGAÇÕES
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
O atendimento do município de Jacareacanga com obra de Sistema de Esgotamento Sanitário, foi uma proposição da Sedop para o PPA 2020/2023, que tinha como foco o início da obra no primeiro ano do PPA (2020). No entanto, conforme consta no Relatório de Gestão da Sedop – Ano 2020, a obra não pôde iniciar de acordo com o planejado, considerando que o ano de 2020 foi marcado pela pandemia da Covid-19, tendo como uma das consequências ocasionadas por este cenário, a impossibilidade de avançar nas tratativas relacionadas ao início de novas obras. Sendo assim, levando em conta que o cenário pandêmico evidenciou a vulnerabilidade social dos Municípios Paraenses com os menores índices de atendimento com rede de esgotamento sanitário e que o advento da Revisão do PPA 2020/2023 – Biênio 2022/2023 possibilitou que a Sedop revisasse todas as obras de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) com status de NOVA, a área técnica propôs a manutenção ou alterações (inclusão/exclusão) dos municípios contemplados nos instrumentos de planejamento da Sedop (PPA 2020/2023, LOA/OGE 2022), fundamentada nos principais estudos e pesquisas disponíveis no âmbito do Saneamento Básico e tendo como referência os índices de atendimento com rede de esgotamento sanitário no Estado do Pará. Com esta lógica de priorizar os municípios com os maiores índices de vulnerabilidade social, e considerando que a Sedop precisa delimitar seu campo de atuação para melhor cumprimento das metas estabelecidas nos instrumentos de planejamento público, o município de Jacareacanga será contemplado pela Ação 7568. Realização de Obras de Esgotamento Sanitário em outro momento. Quanto à execução financeira, embora a <i>Ação 7568. Realização de Obras de Sistema de Esgotamento Sanitário</i> tenha recebido um aporte orçamentário de R\$ 100.000,00¹ para execução de obras, os motivos acima apresentados acabaram por impedir o desempenho físico e, consequentemente, o desempenho financeiro desta ação na Região Tapajós, concedendo a mesma o status de <i>Abaixo do Esperado</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO TOCANTINS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ACARÁ E BARCARENA					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2021	6.060 LIGAÇÕES
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
O atendimento dos municípios de Acará e Barcarena com obra de Sistema de Esgotamento Sanitário, foi uma proposição da Sedop para o PPA 2020/2023, que tinha como foco o início da obra no primeiro ano do PPA (2020). No entanto, conforme consta no Relatório de Gestão da Sedop – Ano 2020, as obras não puderam iniciar de acordo com o planejado, considerando que o ano de 2020 foi marcado pela pandemia da Covid-19, tendo como uma das consequências ocasionadas por este cenário, a impossibilidade de avançar nas tratativas relacionadas ao início de novas obras. Sendo assim, levando em conta que o cenário pandêmico evidenciou a vulnerabilidade social dos Municípios Paraenses com os menores índices de atendimento com rede de esgotamento sanitário e que o advento da Revisão do PPA 2020/2023 – Biênio 2022/2023 possibilitou que a Sedop revisasse todas as obras de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) com status de NOVA, a área técnica propôs a manutenção ou alterações (inclusão/exclusão) dos municípios contemplados nos instrumentos de planejamento da Sedop (PPA 2020/2023, LOA/OGE 2022), fundamentada nos principais estudos e pesquisas disponíveis no âmbito do Saneamento Básico e tendo como referência os índices de atendimento com rede de esgotamento sanitário no Estado do Pará. Com esta lógica de priorizar os municípios com os maiores índices de vulnerabilidade social, e considerando que a Sedop precisa delimitar seu campo de atuação para melhor cumprimento das metas estabelecidas nos instrumentos de planejamento público, os municípios de Acará e Barcarena serão contemplados pela Ação 7568. Realização de Obras de Esgotamento Sanitário em outro momento. Quanto à execução financeira, embora a Ação 7568. <i>Realização de Obras de Sistema de Esgotamento Sanitário</i> tenha recebido um aporte orçamentário de R\$ 500.000,00¹ para execução de obras, os motivos acima apresentados acabaram por impedir o desempenho físico e, conseqüentemente, o desempenho financeiro desta ação na Região Tocantins, concedendo a mesma o status de <i>Abaixo do Esperado</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO XINGU					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: PLACAS					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2021	1.577 LIGAÇÕES
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
O atendimento do município de Placas com obra de Sistema de Esgotamento Sanitário, foi uma proposição da Sedop para o PPA 2020/2023, que tinha como foco o início da obra no primeiro ano do PPA (2020). No entanto, conforme consta no Relatório de Gestão da Sedop – Ano 2020, a obra não pôde iniciar de acordo com o planejado, considerando que o ano de 2020 foi marcado pela pandemia da Covid-19, tendo como uma das consequências ocasionadas por este cenário, a impossibilidade de avançar nas tratativas relacionadas ao início de novas obras. Sendo assim, levando em conta que o cenário pandêmico evidenciou a vulnerabilidade social dos Municípios Paraenses com os menores índices de atendimento com rede de esgotamento sanitário e que o advento da Revisão do PPA 2020/2023 – Biênio 2022/2023 possibilitou que a Sedop revisasse todas as obras de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) com status de NOVA, a área técnica propôs a manutenção ou alterações (inclusão/exclusão) dos municípios contemplados nos instrumentos de planejamento da Sedop (PPA 2020/2023, LOA/OGE 2022), fundamentada nos principais estudos e pesquisas disponíveis no âmbito do Saneamento Básico e tendo como referência os índices de atendimento com rede de esgotamento sanitário no Estado do Pará. Com esta lógica de priorizar os municípios com os maiores índices de vulnerabilidade social, e considerando que a Sedop precisa delimitar seu campo de atuação para melhor cumprimento das metas estabelecidas nos instrumentos de planejamento público, o município de Placas será contemplado pela Ação 7568. Realização de Obras de Esgotamento Sanitário em outro momento. Quanto à execução financeira, embora a Ação 7568. <i>Realização de Obras de Sistema de Esgotamento Sanitário</i> tenha recebido um aporte orçamentário de R\$ 100.000,00¹ para execução de obras, os motivos acima apresentados acabaram por impedir o desempenho físico e, consequentemente, o desempenho financeiro desta ação na Região Xingu, concedendo a mesma o status de <i>Abaixo do Esperado</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

6.1.3. Ação 7608. Construção de Parques Urbanos

REGIÃO DO GUAJARÁ					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: BELÉM					
PRODUTO	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2021	NÃO FOI PREVISTO CONCLUSÃO DE OBRA EM 2021
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Com o compromisso de contribuir com o Governo do Estado do Pará no fomento ao desenvolvimento urbano sustentável nos municípios paraenses, a Sedop vem mantendo no PPA 2020/2023 a <i>Ação 7608. Construção de Parques Urbanos</i>. Para o município de Belém, a expectativa é que a Sedop desenvolva esta ação em parceria com a Secult quanto a Implantação do Parque da Cidade, o qual tem previsão para iniciar suas obras no primeiro semestre de 2022. Quanto à meta física acordada para esta ação, é necessário lembrar que a proposta da Sedop consiste no parque urbano implantado na vigência do PPA atual, ou seja, até o ano de 2023. Ocorre que, no momento da alimentação dos sistemas de planejamento público (SIGPLAN – MÓDULOS PPA E OGE) os mesmos não permitem a inserção do número zero no quantitativo anual, gerando a interpretação equivocada de que em cada ano do PPA haverá 1 Parque Implantado. No caso da execução financeira, embora a <i>Ação 7608. Construção de Parques Urbanos</i> tenha recebido aporte orçamentário para o ano de 2021, como não houve execução física da obra, consequentemente também não houve execução financeira, conferindo ao desempenho desta ação na Região Guajará o status de <i>Abaixo do Esperado</i>.					

REGIÃO RIO CAETÉ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: BRAGANÇA					
PRODUTO	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2021	NÃO FOI PREVISTO CONCLUSÃO DE OBRA EM 2021
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Com o compromisso de contribuir com o Governo do Estado do Pará no fomento ao desenvolvimento urbano sustentável nos municípios paraenses, a Sedop vem mantendo no PPA 2020/2023 a <i>Ação 7608. Construção de Parques Urbanos</i>. Com relação ao desempenho físico desta ação na Região Rio Caeté, a expectativa era que em 2021 a Sedop tivesse avançado nas tratativas fundamentais (processo Licitatório – projeto básico e executivo) para início da obra em 2022. Entretanto, devido a necessidade de dar celeridade as obras em execução que ficaram prejudicadas por conta da pandemia da Covid – 19, o início da maioria das obras com status de NOVA foram adiadas, e isto inclui a obra de “Construção de Parque Urbano” para o município de Bragança. Quanto à meta física acordada para esta ação, é necessário lembrar que a proposta da Sedop consiste no parque urbano implantado na vigência do PPA atual, ou seja, até o ano de 2023. Ocorre que, no momento da alimentação dos sistemas de planejamento público (SIGPLAN – MÓDULOS PPA E OGE) os mesmos não permitem a inserção do número zero no quantitativo anual, gerando a interpretação equivocada de que em cada ano do PPA haverá 1 Parque Implantado. No caso da execução financeira, embora a <i>Ação 7608. Construção de Parques Urbanos</i> tenha recebido aporte orçamentário para o ano de 2021, como não houve execução física pelos motivos acima apresentados, também não houve execução financeira, conferindo ao desempenho desta ação na Região Rio Caeté o status de <i>Abaixo do Esperado</i>.					

REGIÃO TAPAJÓS					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: ITAITUBA					
PRODUTO	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2021	NÃO FOI PREVISTO CONCLUSÃO DE OBRA EM 2021
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Com o compromisso de contribuir com o Governo do Estado do Pará no fomento ao desenvolvimento urbano sustentável nos municípios paraenses, a Sedop vem mantendo no PPA 2020/2023 a <i>Ação 7608. Construção de Parques Urbanos</i>. Com relação ao desempenho físico desta ação na Região Tapajós, a expectativa era que em 2021 a Sedop tivesse avançado nas tratativas fundamentais (processo Licitatório – projeto básico e executivo) para início da obra em 2022. Entretanto, devido a necessidade de dar celeridade as obras em execução que ficaram prejudicadas por conta da pandemia da Covid – 19, o início da maioria das obras com status de NOVA foram adiadas, e isto inclui a obra de “Construção de Parque Urbano” para o município de Itaituba. Quanto à meta física acordada para esta ação, é necessário lembrar que a proposta da Sedop consiste no parque urbano implantado na vigência do PPA atual, ou seja, até o ano de 2023. Ocorre que, no momento da alimentação dos sistemas de planejamento público (SIGPLAN – MÓDULOS PPA E OGE) os mesmos não permitem a inserção do número zero no quantitativo anual, gerando a interpretação equivocada de que em cada ano do PPA haverá 1 Parque Implantado. No caso da execução financeira, embora a <i>Ação 7608. Construção de Parques Urbanos</i> tenha recebido aporte orçamentário para o ano de 2021, como não houve execução física pelos motivos acima apresentados, também não houve execução financeira, conferindo ao desempenho desta ação na Região Tapajós o status de <i>Abaixo do Esperado</i>.					

REGIÃO TOCANTINS					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: BARCARENA					
PRODUTO	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2021	NÃO FOI PREVISTO CONCLUSÃO DE OBRA EM 2021
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Com o compromisso de contribuir com o Governo do Estado do Pará no fomento ao desenvolvimento urbano sustentável nos municípios paraenses, a Sedop vem mantendo no PPA 2020/2023 a <i>Ação 7608. Construção de Parques Urbanos</i>. Com relação ao desempenho físico desta ação na Região Tocantins, a expectativa era que em 2021 a Sedop tivesse avançado nas tratativas fundamentais (processo Licitatório – projeto básico e executivo) para início da obra em 2022. Entretanto, devido a necessidade de dar celeridade as obras em execução que ficaram prejudicadas por conta da pandemia da Covid – 19, o início da maioria das obras com status de NOVA foram adiadas, e isto inclui a obra de “Construção de Parque Urbano” para o município de Barcarena. Quanto à meta física acordada para esta ação, é necessário lembrar que a proposta da Sedop consiste no parque urbano implantado na vigência do PPA atual, ou seja, até o ano de 2023. Ocorre que, no momento da alimentação dos sistemas de planejamento público (SIGPLAN – MÓDULOS PPA E OGE) os mesmos não permitem a inserção do número zero no quantitativo anual, gerando a interpretação equivocada de que em cada ano do PPA haverá 1 Parque Implantado. No caso da execução financeira, embora a <i>Ação 7608. Construção de Parques Urbanos</i> tenha recebido aporte orçamentário para o ano de 2021, como não houve execução física pelos motivos acima apresentados, também não houve execução financeira, conferindo ao desempenho desta ação na Região Tocantins o status de <i>Abaixo do Esperado</i>.					

6.1.4. Ação 7644. Implantação de Aterros Sanitários

REGIÃO GUAMÁ					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: CASTANHAL					
PRODUTO	ATERRO IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2021	1 ATERRO IMPLANTADO
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Diferente das demais Regiões de Integração que são atendidas pela <i>Ação 7644. Implantação de Aterros Sanitário</i>, em que o produto obtido é 01 Aterro Implantado, para a Região Guamá o produto será <u>01 Aterro REGIONALIZADO Implantado</u>. Isto deve-se ao fato de que nesta região, no ano de 2019, os municípios de Castanhal, Inhangapi, Santa Maria do Pará, São Francisco do Pará e Santa Izabel do Pará formaram um consórcio municipal para solucionar os entraves que impedem a gestão ecologicamente correta de resíduos sólidos. Consórcio este que, além de unir os municípios em prol do mesmo objetivo (eliminar lixões a céu aberto), reduz os custos de operação e manutenção do aterro a ser implantado. O Objeto executado por esta ação é “Implantação do Centro de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – CGIRS regionalizado do Consórcio Intermunicipal para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos – CONCISSS”, o qual para o seu desenvolvimento conta com recursos provenientes do Contrato de Financiamento Banco de Desenvolvimento da América Latina – Cooperação Andina de Fomento – CAF. No ano de 2021, o desenvolvimento da <i>Ação 7644. Implantação de Aterros Sanitário</i> na Região Guamá para implantação do empreendimento apresentou evolução conforme tabela abaixo:					
MUNICÍPIOS	OBRA	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS			
CASTANHAL, INHANGAPI, SANTA MARIA DO PARÁ, SANTA IZABEL DO PARÁ, SÃO FRANCISCO DO PARÁ	“IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS – CGIRS REGIONALIZADO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA A GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – CONCISSS”	# Reunião com a SEMAS (Diretor e Secretário Adjunto) para a continuidade das discussões sobre o Termo de Referência (TR) do EIA/RIMA.			
		# Protocolo na SEMAS da sugestão de TR e do Parecer Técnico justificando as alterações propostas.			
		# Reunião com a SEMAS sobre a adequação do TR à realidade da Área 6♦			
		# Apresentação para a SEMAS das alterações propostas no TR.			
		# Acompanhamento da vistoria inicial pelos técnicos da SEMAS de reconhecimento da área Área 6♦			
		# Emissão, pela SEMAS/PA do TR revisado para desenvolvimento do EIA/RIMA.			
		# Envio para a CAF das peças técnicas necessárias ao processo de licitação do EIA/RIMA do CGIRS do CONCISSS			

♦ Área onde localiza-se o “Lixão” de Castanhal.

Quanto ao processo licitatório para contratação de empresa especializada para execução da obra de Aterro Sanitário, principalmente tendo a obrigatoriedade de atendimento ao TR oficial emitido pela SEMAS, optou-se pela realização de um único processo licitatório, com os seguintes objetos:

- Desenvolvimento dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia para o CGIRS regionalizado do CONCISSS;
- Estudo de Viabilidade para Aproveitamento dos Gases gerados pela disposição dos rejeitos urbanos em aterros sanitários;
- Plano de Operação, manutenção e monitoramento do CGIRS;
- Elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e do seu respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente – EIA/RIMA, para o processo de licenciamento ambiental da implantação e operação do CGIRS do CONCISSS.

As documentações do processo licitatório encontram-se em fase final, sendo a data para a obtenção da Licença Prévia - LP e da Licença de Instalação – LI prevista para janeiro de 2023. Com essa previsão, o início e o término da implantação do empreendimento serão remetidos para as datas de maio de 2023 e maio de 2024, respectivamente.

No que diz ao Projeto Técnico de Trabalho Social – PTTS, será implementado através de ação conjunta da Sedop e municípios que compõem o Consórcio, denominado Programa CONCISSS AMBIENTAL, cujo foco principal é melhorar o planejamento dos trabalhos sociais já iniciados com os catadores de lixo dos municípios integrantes do CONCISS.

Aguarda-se a entrega dos Planos de: Educação Ambiental e Participação Social, Minimização de Resíduos Orgânicos e Coleta Seletiva e Inserção dos Catadores de lixo e valorização dos resíduos, os quais estão em elaboração juntamente com o desenvolvimento do Plano Municipal de Saneamento Urbano, (Convênio SEDOP/Prefeitura de Castanhal nº. 031/2018, renovado em 19.04.2022).

Com relação à execução financeira, como o desenvolvimento das atividades concentraram-se no desenvolvimento de reuniões e orientações quanto ao atendimento das condicionantes ambientais para obtenção das licenças necessárias para construção e implementação do Aterro Sanitário Regionalizado e do Galpão de Triagem, do valor programado de R\$ 18.785.443,00¹ para atender a Região Guamá durante o ano de 2021, foram utilizados apenas R\$ 118,70² referentes a diárias e deslocamentos dos técnicos aos municípios. Ressaltamos que, o início da obra se dará após a conclusão das todas estas etapas e, fundamentalmente, após a conclusão do Termo de Referência.

De acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7644. Implantação de Aterros Sanitários* na Região Guamá no exercício de 2021 foi *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO RIO CAPIM					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: RONDON DO PARÁ					
PRODUTO	ATERRO IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2021	1 ATERRO IMPLANTADO
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
O Objeto executado pela <i>Ação 7644. Implantação de Aterros Sanitário</i> é “Implantação do Centro de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - CGIRS” no município de Rondon do Pará, o qual para o seu desenvolvimento conta com recursos provenientes do Contrato de Financiamento Banco de Desenvolvimento da América Latina – Cooperação Andina de Fomento – CAF. No primeiro semestre de 2021, foi finalizado processo licitatório para contratação de empresa para a construção do “Centro de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos” no município de Rondon do Pará. No segundo semestre, foi emitida Ordem de Serviço para início da obra, a qual encontra-se na etapa inicial de serviços preliminares, tais como, limpeza do terreno, instalação do canteiro de obras e serviços topográficos. A falta de alguns materiais para a execução de determinados serviços, acabaram por interferir diretamente no ritmo da obra, ocasionando desta forma atraso no cumprimento das etapas previstas no cronograma físico e financeiro. Com relação à execução financeira, como a execução da obra encontra-se na fase inicial e ainda não houve medição dos serviços que demandasse dispêndio financeiro, do valor programado de R\$ 9.552.360,00¹, foram utilizados R\$ 712,14² referentes a diárias e deslocamentos dos técnicos ao município. Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da <i>Ação 7644. Implantação de Aterros Sanitários</i> na Região Rio Capim no exercício de 2021 foi <i>Abaixo do Esperado</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO TAPAJÓS					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: ITAITUBA					
PRODUTO	ATERRO IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2021	1 ATERRO IMPLANTADO
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Na Região Tapajós, o desenvolvimento da <i>Ação 7644. Implantação de Aterros Sanitário</i> tem como meta a “Implantação do Centro de Triagem (CT)” no município de Itaituba, o qual conta com recursos provenientes do Contrato de Financiamento Banco de Desenvolvimento da América Latina – Cooperação Andina de Fomento – CAF. Inicialmente, o Centro de Triagem estava previsto para ser implantado na localidade conhecida como Gleba Arraia, à 22,1 km do centro urbano de Itaituba. Entretanto este local, inicialmente previsto, apresentou obstáculos devido a diversos fatores que vão desde a infraestrutura e planejamento urbano, viabilidade técnica, econômica, logística, e um forte movimento social dos catadores junto à Prefeitura para a mudança do local, para outro que fosse mais próximo de suas residências. Todos estes fatores reunidos fundamentaram a solicitação da Prefeitura Municipal de Itaituba de alteração da área inicialmente prevista para a implantação do CT. O novo local selecionado para a implantação do empreendimento, atende aos requisitos propostos com a diminuição de 10,1 km para a área anteriormente prevista de implantação do Centro de Triagem. No final do primeiro semestre de 2021, a Sedop enviou uma Nota Técnica ao CAF solicitando a mudança da Área do Centro de Triagem, a qual foi devidamente autorizada pelo gestor do recurso no segundo semestre de 2021. Esclarecemos que, a mudança da área do projeto impactou diretamente no desenvolvimento das etapas já previstas no cronograma, uma vez que todo o projeto teve que ser revisto para se adequar à nova localização. Sendo assim, apenas em outubro de 2021 foram enviadas as peças técnicas ao CAF, para aprovação do processo de Implantação do Centro de Triagem no Município de Itaituba e posterior início do processo licitatório, ficando desta forma a previsão para início da obra no primeiro semestre de 2022. Quanto à execução financeira, do valor programado de R\$ 11.019.688,00¹, conforme exposto anteriormente, não houve dispêndios financeiros para a <i>Ação 7644. Implantação de Aterros Sanitário</i> no exercício de 2021. Por fim, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da <i>Ação 7644. Implantação de Aterros Sanitários</i> na Região Tapajós no decorrer do ano de 2021 foi <i>Abaixo do Esperado</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO XINGU					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: BRASIL NOVO					
PRODUTO	ATERRO IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2021	1 ATERRO IMPLANTADO
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Na Região Xingu, o desenvolvimento da <i>Ação 7644. Implantação de Aterros Sanitário</i> tem como meta a “Implantação do Galpão de Triagem (CT)” no município de Brasil Novo, o qual conta com recursos provenientes do Contrato de Financiamento Banco de Desenvolvimento da América Latina – Cooperação Andina de Fomento – CAF. Iniciado em 2020, a obra referente a construção do Galpão de Triagem encontra-se em execução, com previsão de entrega para o primeiro semestre de 2022. Imediatamente após a conclusão da obra, haverá entrega de equipamentos para operacionalização do Galpão de Triagem como: prensa enfardadeira vertical, balança mecânica plataforma com capacidade de 1.000 kg, empilhadeira simples com capacidade 1.000 kg, deslocamento manual e energia de elevação elétrica; carrinho plataforma com 2 eixos, capacidade mínima de 300 kg, para transportes de fardos; carrinho manual para transportes de tambores e bags com capacidade mínima de 150 kg. Ainda no município de Brasil Novo, está em curso o projeto para Revitalização do Aterro Sanitário existente, projeto este fundamental para garantir que o Galpão de Triagem funcione com eficiência e eficácia. As peças técnicas necessárias ao processo de licitação desse projeto foi encaminhado para avaliação e aprovação do Banco Financiador, no segundo semestre de 2021, tendo desta forma, previsão para início da revitalização do aterro no segundo semestre de 2022. Quanto a movimentação financeira da <i>Ação 7644. Implantação de Aterros Sanitário</i> no ano de 2021, informamos que houve equívoco na execução orçamentária, ou seja, o empenho referente a execução da obra de construção do Galpão de Triagem foi realizado na <i>Ação 8692. Apoio à Implementação da Política Estadual de Saneamento Básico</i>, não utilizando desta forma o orçamento de R\$ 1.400.000,00¹ planejado para tender esta ação. Para o ano de 2022, a Sedop se compromete Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da <i>Ação 7644. Implantação de Aterros Sanitários</i> na Região Xingu, no exercício de 2021, foi <i>Abaixo do Esperado</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO MARAJÓ					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: AFUÁ					
PRODUTO	ATERRO IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2021	1 ATERRO IMPLANTADO
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Na Região Marajó, o município contemplado pela <i>Ação 7644. Implantação de Aterros Sanitário</i> foi o município de Afuá, no qual foi programado para o ano de 2021 a continuidade da obra “<i>Construção de Galpão de Triagem de Resíduos Sólidos</i>”. Iniciado em 2018, a obra é executada através de Convênio de Repasse firmado com a Prefeitura Municipal de Afuá. Prevista para ser concluída no ano de 2020, com o advento da pandemia da Covid – 19, a conclusão foi adiada para o ano de 2021. Em 2021, a obra pôde cumprir o cronograma físico e financeiro planejado, sendo concluída em julho de 2021. A obra, além de auxiliar na preservação do meio ambiente por meio de processos ecologicamente corretos, desde o descarte até a destinação final, irá ajudar na redução de custos em diversos processos e na identificação de oportunidades, para reduzir o volume de resíduos gerados. Quanto a movimentação financeira da <i>Ação 7644. Implantação de Aterros</i>, ressaltamos que o valor de R\$ 120.935,00¹ programado para o ano de 2021, foi suficiente para atender à necessidade financeira para a conclusão do Galpão de Triagem de Resíduos Sólidos no município de Afuá. Faz-se necessário esclarecer que a alimentação no sistema desta ação na Região Marajó, no decorrer do ano de 2021 ficou desatualizada, por isso no sistema SigPlan – Monitoramento não há registro da meta física alcançada, o que leva a ação obter o desempenho físico <i>Abaixo do Esperado</i>. Sendo assim, informamos que para o encerramento do exercício de 2021, o sistema SigPlan- Monitoramento será devidamente atualizado, de modo a garantir a unidade da informação. Por fim, considerando que a meta programada para a Região Marajó foi obtida e que a execução financeira desta ação está conforme planejado, a Sedop considera que o desempenho físico e financeiro da <i>Ação 7644. Implantação de Aterros Sanitários</i> na Região Xingu, no exercício de 2021, foi <i>Conforme Programado</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

6.1.5. Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de vias Urbanas

REGIÃO ARAGUAIA					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: BANNACH, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, CUMARÚ DO NORTE, FLORESTA DO ARAGUAIA, OURILÂNDIA DO NORTE, REDENÇÃO, RIO MARIA, SANTA MARIA DAS BARREIRAS, SANTANA DO ARAGUAIA, TUCUMÃ.					
PRODUTO	VIA PAVIMENTADA	UNIDADE	KM	META 2021	38 KM

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021

Para o ano de 2021, a Sedop programou desenvolver a *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas*, na Região Araguaia, nos municípios de Bannach, Conceição do Araguaia, Cumarú do Norte, Floresta do Araguaia, Ourilândia do Norte, Redenção, Rio Maria, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia e Tucumã.

Dos municípios programados, apenas nos municípios de Cumarú do Norte e Redenção, não houve execução de obras. Vale lembrar que os referidos municípios foram beneficiados com vias urbanas pavimentadas no ano de 2020 (Relatório de Gestão Sedop – 2020). Quanto os demais municípios, a tabela abaixo sintetiza os resultados obtidos em cada município:

MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	KM EXECUTADOS
BANNACH	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	6 KM
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	13 KM
FLORESTA DO ARAGUAIA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	7 KM
OURILÂNDIA DO NORTE	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	2 KM
RIO MARIA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	4 KM
SANTA MARIA DAS BARREIRAS	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	4 KM
SANTANA DO ARAGUAIA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	4 KM
TUCUMÃ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	15 KM
TOTAL REGIÃO ARAGUAIA		55 KM

Quanto ao desempenho físico desta ação na Região Araguaia, no decorrer do ano de 2021 foram executados 55 km de vias pavimentadas, ultrapassando a meta física estabelecida em cerca de 45%.

Com relação ao desempenho financeiro, o valor orçado inicialmente de R\$ 6.834.295,00¹, foi atualizado em R\$ 8.551.262,94 para atender a região com execução de obras de pavimentação, chegando ao valor de R\$ 15.385.557,94². Esta divergência *orçamento planejado X orçamento executado*, deve-se, em grande parte, ao fato do valor estabelecido no teto orçamentário disponibilizado para Sedop ser insuficiente para o atendimento real do número de obras executadas através desta ação.

Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7536. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* na Região Araguaia, encerra o exercício de 2021 com status de *Acima do Programado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO BAIXO AMAZONAS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ALENQUER, ALMEIRIM, CURUÁ, FARO, JURUTI, MOJUÍ DOS CAMPOS, MONTE ALEGRE, ÓBIDOS, ORIXIMINÁ, PRAINHA, SANTARÉM.					
PRODUTO	VIA PAVIMENTADA	UNIDADE	KM	META 2021	35 KM

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021

Para o ano de 2021, a Sedop programou desenvolver a *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas*, na Região Baixo Amazonas, nos municípios de Alenquer, Almeirim, Curuá, Faro, Juruti, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha e Santarém.

Dos municípios programados, apenas nos municípios de Óbidos, Mojuí dos Campos e Faro, as tratativas para início de obras de pavimentação no decorrer de 2021, até o presente momento, ainda não se concretizaram. Vale lembrar que o município de Faro foi beneficiado com vias urbanas pavimentadas no ano de 2020 (Relatório de Gestão Sedop – 2020). Quanto os demais municípios, a tabela abaixo sintetiza os resultados obtidos em cada município:

MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	KM EXECUTADOS
ALENQUER	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	3 KM
ALMEIRIM	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	8 KM
CURUÁ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	5 KM
JURUTI	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	2 KM
MONTE ALEGRE	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	6 KM
ORIXIMINÁ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	2 KM
PRAINHA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	3 KM
SANTARÉM	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	6 KM
TOTAL REGIÃO BAIXO AMAZONAS		35 KM

Com a execução destas obras, a Sedop alcançou em 100% a meta estabelecida para a Região Baixo Amazonas no ano de 2021.

Com relação ao desempenho financeiro, o valor orçado inicialmente de R\$ 8.072.335,00¹, foi atualizado em R\$ 3.354.412,46 para atender a região com execução de obras de pavimentação, chegando ao valor de R\$ 11.426.747,46². Esta divergência *orçamento planejado X orçamento executado*, deve-se, em grande parte, ao fato do valor estabelecido no teto orçamentário disponibilizado para Sedop ser insuficiente para o atendimento real do número de obras executadas através desta ação.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7536. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* na Região Baixo Amazonas encerra o exercício de 2021 com status de *Conforme o Programado*.

REGIÃO CARAJÁS

MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: BOM JESUS DO TOCANTINS, BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, CANÃA DOS CARAJÁS, CURIONÓPOLIS, ELDORADO DOS CARAJÁS, MARABÁ, PARAUAPEBAS, PIÇARRA, SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, SÃO JOÃO DO ARAGUAIA.

PRODUTO	VIA PAVIMENTADA	UNIDADE	KM	META 2021	37 KM
----------------	-----------------	----------------	----	------------------	-------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021

Para a Região Carajás, a implementação da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* com obras voltadas para a melhoria do sistema viário envolveu os municípios de Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Canãa dos Carajás, Curionópolis, Eldorado dos Carajás, Marabá, Parauapebas, Piçarra, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do Araguaia e São João do Araguaia.

Ressaltamos que esta Região de Integração faz parte da área de atuação da Companhia Vale do Rio Doce, sendo portanto, atendida com recursos provenientes do Fundo para o Desenvolvimento Regional com Recursos da Desestatização (FRD2) do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) para execução de obras de pavimentação e drenagem. Os municípios contemplados por este recurso são: Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Canãa dos Carajás, Curionópolis, Eldorado dos Carajás, São Domingos do Araguaia e São João do Araguaia.

Com relação aos municípios de *Canãa dos Carajás, Eldorado dos Carajás e São João do Araguaia*, os projetos não foram implementados em consequência do posicionamento adotado pelo BNDES (gestor do recursos) no primeiro semestre de 2020 de suspender a aprovação e liberação de novos projetos, situação esta que permanece atualmente.

Quanto aos municípios de Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Curionópolis e São Domingos do Araguaia, as obras seguem em execução em conformidade com o cronograma físico e financeiro.

No município de Parauapebas, as tratativas para início de obras no decorrer de 2021, até o presente momento, ainda não se concretizou. Esclarecemos que, com exceção de Bom Jesus do Tocantins, os municípios de Curionópolis, Marabá e São João do Araguaia também foram contemplados com recurso oriundo do Finisa – Caixa, e em 2021, apresentaram evolução conforme tabela abaixo:

MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	KM EXECUTADOS
BOM JESUS DO TOCANTINS	PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET EM VIAS URBANAS (FRD II).	1 KM
CURIONÓPOLIS	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS. (FINISA).	2 KM
MARABÁ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (FINISA).	18 KM
SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (FINISA).	7 KM
TOTAL REGIÃO CARAJÁS		28 KM

Quanto ao desempenho físico desta ação na Região Carajás, no decorrer do ano de 2021 foram executados 28 km de vias pavimentadas, atingindo a meta física estabelecida de 37 Km em cerca de 76%.

Com relação ao desempenho financeiro, o valor orçado inicialmente de R\$ 6.833.385,00¹, foi atualizado em R\$ 3.264.818,29 para atender a região com execução de obras de pavimentação, chegando ao valor de R\$ 10.098.203,29². Esta divergência *orçamento planejado X orçamento executado*, deve-se, em grande parte, ao fato do valor estabelecido no teto orçamentário disponibilizado para Sedop ser insuficiente para o atendimento real do número de obras executadas através desta ação.

Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7536. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* na Região Carajás, encerra o exercício de 2021 com status de *Conforme o Programado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO GUAJARÁ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ANANINDEUA, BELÉM, BENEVIDES, MARITUBA, SANTA BÁRBARA DO PARÁ.					
PRODUTO	VIA PAVIMENTADA	UNIDADE	KM	META 2021	159 KM
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Em 2021, na Região Guajará foram previstos 159 km de vias pavimentadas através do desenvolvimento da Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas nos municípios de Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba e Santa Bárbara do Pará.					
A tabela abaixo sintetiza o desenvolvimento das obras com os produtos obtidos no decorrer do ano de 2021:					
MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA			KM EXECUTADOS	
ANANINDEUA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.			18 KM	
BELÉM	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.			32 KM	
BENEVIDES	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.			11 KM	
MARITUBA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.			39 KM	
SANTA BÁRBARA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.			2 KM	
TOTAL REGIÃO GUAJARÁ				102 KM	
Quanto ao desempenho físico desta ação na Região Guajará, no decorrer do ano de 2021 foram executados 102 km de vias pavimentadas, atingindo a meta física estabelecida de 159 Km em cerca de 64%.					
Com relação ao desempenho financeiro, na Região Guajará, a execução financeira foi bem próxima do o valor orçado inicialmente de R\$ 51.663.725,00 ¹ , sendo necessário atualizar o valor em apenas R\$ 7.576,06 para atender a região com execução de obras de pavimentação, chegando ao valor de R\$ 51.671.301,06 ² .					
Por fim, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da Ação 7536. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas na Região Guajará, encerra o exercício de 2021 com status de Merece Atenção.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO GUAMÁ

MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: CASTANHAL, CURUÇA, IGARAPÉ-AÇÚ, MAGALHÃES BARATA, MARAPANIM, SANTA MARIA DO PARÁ, SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ, SÃO CAETANO DE ODIVELAS, SÃO DOMINGOS DO CAPIM, SÃO FRANCISCO DO PARÁ, SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, TERRA ALTA, VIGIA.

PRODUTO	VIA PAVIMENTADA	UNIDADE	KM	META 2021	35 KM
----------------	-----------------	----------------	----	------------------	-------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021

Na Região Guamá, foram programados a execução de 35 km de vias pavimentadas por intermédio da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas*, nos municípios de Castanhal, Curuçá, Igarapé - Açú, Magalhães Barata, Marapanim, Santa Maria do Pará, Santo Antônio do Tauá, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Francisco do Pará, São Miguel do Guamá, Terra Alta e Vigia.

Dos municípios programados, apenas nos municípios de Santa Maria do Pará e São Francisco do Pará, as tratativas para início de obras de pavimentação no decorrer de 2021, até o presente momento, ainda não se concretizaram. Vale lembrar que os referidos municípios foram beneficiados com vias urbanas pavimentadas no ano de 2020 (Relatório de Gestão Sedop – 2020).

Outra situação que merece ser destacada é que, embora não tenha sido contemplado nos instrumento de planejamento para execução de obra de pavimentação, o município de Inhangapi também foi beneficiado através do desenvolvimento da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas*. Para melhor entendimento, a tabela abaixo sintetiza os resultados obtidos em cada município:

MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	KM EXECUTADOS
CASTANHAL	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA BRASIL.	3 KM
CASTANHAL	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	45 KM
CURUÇÁ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	15 KM
IGARAPÉ-AÇU	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	7 KM
INHANGAPI	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	7 KM
MAGALHÃES BARATA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	8 KM
MARAPANIM	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	4 KM
SANTA IZABEL	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	6 KM
SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	9 KM

MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	KM EXECUTADOS
SÃO CAETANO DE ODIVELAS	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	6 KM
SÃO DOMINGOS DO CAPIM	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	5 KM
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	1 KM
TERRA ALTA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	5 KM
VIGIA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	6 KM
TOTAL REGIÃO GUAMÁ		127 KM

Quanto ao desempenho físico desta ação na Região Guamá, no decorrer do ano de 2021 foram executados 121 km de vias pavimentadas, ultrapassando a meta física estabelecida em cerca de 86 km. Esclarecemos que nesta região, houve um equívoco no momento da alimentação dos quilômetros executados no município de Castanhal (mês 08/2021), onde foi inserido no sistema SigPlan- Monitoramento 88 km, quando o quantitativo real de vias pavimentadas é de 8 km.

Com relação ao desempenho financeiro, o valor orçado inicialmente de R\$ 10.599.905,00¹, foi atualizado em R\$ 48.807.667,38 para atender a região com execução de obras de pavimentação, chegando ao valor de R\$ 59.407.572,38². Esta divergência *orçamento planejado X orçamento executado*, deve-se, em grande parte, ao fato do valor estabelecido no teto orçamentário disponibilizado para Sedop ser insuficiente para o atendimento real do número de obras executadas através desta ação.

Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da Ação 7536. *Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* na Região Guamá, encerra o exercício de 2021 com status de *Acima do Programado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO LAGO DE TUCURUÍ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: GOIANÉSIA DO PARÁ, ITUPIRANGA, JACUNDÁ, NOVA IPIXUNA, NOVO REPARTIMENTO, TUCURUÍ.					
PRODUTO	VIA PAVIMENTADA	UNIDADE	KM	META 2021	25 KM

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021

Durante o ano de 2021, a *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* foi desenvolvida na Região Lago de Tucuruí nos municípios de Goianésia do Pará, Itupiranga, Jacundá, Nova IPIXUNA, Novo Repartimento e Tucuruí.

Outra situação que merece ser destacada é que, embora não tenha sido contemplado nos instrumento de planejamento para execução de obra de pavimentação, o município de Breu Branco também foi beneficiado através do desenvolvimento da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas*. Para melhor entendimento, a tabela abaixo sintetiza os resultados obtidos em cada município:

MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	KM EXECUTADOS
BREU BRANCO	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (PIRTUC).	1 KM
GOIANÉSIA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (FINISA).	3 KM
GOIANÉSIA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (PIRTUC).	1 KM
GOIANÉSIA	EXECUÇÃO DE MEIO FIO, SARJETA E SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL EM VIAS PÚBLICAS (REPASSE PREFEITURA).	1 KM
ITUPIRANGA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (PIRTUC).	4 KM
JACUNDÁ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (PIRTUC).	2 KM
NOVA IPIXUNA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (PIRTUC).	2 KM
NOVO REPARTIMENTO	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (PIRTUC).	3 KM
TUCURUÍ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (FINISA).	5 KM
TUCURUÍ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (PIRTUC).	1 KM
TOTAL REGIÃO LAGO DE TUCURUÍ		23 KM

Esclarecemos que a alimentação no sistema desta região no decorrer do ano de 2021 ficou desatualizada, por isso há divergência no quantitativo de quilômetros informado no sistema e o quantitativo de quilômetros apresentados neste Relatório de Gestão. Sendo assim, informamos que para o encerramento do exercício de 2021, o sistema SigPlan- Monitoramento será devidamente atualizado, de modo a garantir a unidade da informação.

Por sua vez, considerando a meta atualizada de 23 km de vias pavimentadas na Região Lago de Tucuruí e que a mesma corresponde ao atingimento de 92% da meta física estabelecida para o ano de 2021, o desempenho físico da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* nesta região passa a ser de acordo com o planejado.

No que diz respeito à execução financeira, houve necessidade de atualizar a dotação orçamentária inicial majorando em R\$ 13.852.112,59¹. Esta atualização foi necessária, principalmente, devido à grande demanda de serviços relacionados à execução obras de

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021

pavimentação que a Sedop recebe, cuja dotação inicial era insuficiente para o perfeito atendimento dos pleitos.

Por fim, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7536. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* na Região Lago de Tucuruí, encerra o exercício de 2021 com status de *Conforme o Programado*.

REGIÃO MARAJÓ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: BAGRE, CACHOEIRA DO ARARI, CURRALINHO, GURUPÁ, MUANÁ, PONTA DE PEDRAS, PORTEL, SALVATERRA, SOURE.					
PRODUTO	VIA PAVIMENTADA	UNIDADE	KM	META 2021	23 KM

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021

Para a Região Marajó, a implementação da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* com obras voltadas para a melhoria do sistema viário envolveu os municípios de Bagre, Cachoeira do Arari, Curralinho, Gurupá, Muaná, Ponta de Pedras, Portel, Salvaterra e Soure.

A tabela abaixo sintetiza o desenvolvimento das obras com os produtos obtidos no decorrer do ano de 2021:

MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	KM EXECUTADOS
BAGRE	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	2 KM
CACHOEIRA DO ARARI	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS	7 KM
CURRALINHO	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS	6 KM
GURUPÁ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS	3 KM
MUANÁ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS	13 KM
PONTA DE PEDRAS	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS	2 KM
PORTEL	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS	3 KM
SALVATERRA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS	6 KM
SALVATERRA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E DRENAGEM SUPERFICIAL – RUA 29 DE DEZEMBRO (CEF).	1,10 KM
SOURE	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS	9 KM
TOTAL REGIÃO MARAJÓ		52,10 KM

Esclarecemos que a alimentação no sistema desta região no decorrer do ano de 2021 ficou desatualizada, por isso há divergência no quantitativo de quilômetros informado no sistema e o quantitativo de quilômetros apresentados neste Relatório de Gestão. Sendo assim, informamos que para o encerramento do exercício de 2021, o sistema SigPlan- Monitoramento será devidamente atualizado, de modo a garantir a unidade da informação.

Por sua vez, considerando a meta atualizada de 52,10 km de vias pavimentadas na Região Marajó e que a mesma ultrapassou a meta física estabelecida para o ano de 2021 em 29,10 km, o cumprimento da meta física da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* nesta região foi acima do planejado.

Com relação ao desempenho financeiro, o valor orçado inicialmente de R\$ 9.785.815,00¹, foi atualizado em R\$ 18.119.894,86 para atender a região com execução de obras de pavimentação, chegando ao valor de R\$ 27.905.709,86². Esta divergência *orçamento planejado X orçamento executado*, deve-se, em grande parte, ao fato do valor estabelecido no teto orçamentário disponibilizado para Sedop ser insuficiente para o atendimento real do número de obras executadas através desta ação.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7536. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* na Região Marajó, encerra o exercício de 2021 com status de *Acima do Programado*.

REGIÃO RIO CAETÉ

MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: BONITO, BRAGANÇA, CACHOEIRA DO PIRIÁ, CAPANEMA, NOVA TIMBOTEUA, PEIXE-BOI, PRIMAVERA, SANTA LUZIA DO PARÁ, SÃO JOÃO DE PIRABAS, TRACUATEUA, VISEU.

PRODUTO	VIA PAVIMENTADA	UNIDADE	KM	META 2021	30 KM
----------------	-----------------	----------------	----	------------------	-------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021

Em 2021, a *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* foi desenvolvida na Região Rio Caeté nos municípios de Bonito, Bragança, Cachoeira do Piriá, Capanema, Nova Timboteua, Peixe-Boi, Primavera, Santa Luzia do Pará, São João de Pirabas, Tracuateua e Viseu.

Outra situação que merece ser destacada é que, embora não tenha sido contemplado nos instrumento de planejamento para execução de obra de pavimentação, o município de Salinópolis também foi beneficiado através do desenvolvimento da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas*. Para melhor entendimento, a tabela abaixo sintetiza os resultados obtidos em cada município:

MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	KM EXECUTADOS
BONITO	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	6 KM
BRAGANÇA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	27 KM
CACHOEIRA DO PIRIÁ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	8 KM
CAPANEMA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	18 KM
NOVA TIMBOTEUA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	8 KM
PEIXE - BOI	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	4 KM
PRIMAVERA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	8 KM
QUATIPURU	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	3 KM
SALINÓPOLIS	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	2 KM
SANTA LUZIA DO PARÁ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	6 KM
SÃO JOÃO DE PIRABAS	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	6 KM
TRACUATEUA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	8 KM
VISEU	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	19 KM
TOTAL REGIÃO RIO CAETÉ		123 KM

No que diz respeito a meta física, para o ano de 2021 foi planejado a execução de 30 km de vias pavimentadas na Região Rio Caeté, no entanto, a Sedop conseguiu ultrapassar a meta estabelecida em 93 km, garantindo desta forma a excelência no desempenho físico da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas*.

Com relação ao desempenho financeiro, o valor orçado inicialmente de R\$ 10.166.306,00¹, foi atualizado em R\$ 17.238.689,95 para atender a região com execução de obras de pavimentação, chegando ao valor de R\$ 27.404.995,95². Esta divergência *orçamento planejado X orçamento executado*, deve-se, em grande parte, ao fato do valor estabelecido no

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

teto orçamentário disponibilizado para Sedop ser insuficiente para o atendimento real do número de obras executadas através desta ação.

Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7536. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* na Região Rio Caeté, encerra o exercício de 2021 com status de *Acima do Programado*.

REGIÃO RIO CAPIM					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ABEL FIGUEIREDO, AURORA DO PARÁ, BUJARU, CAPITÃO POÇO, CONCÓRDIA DO PARÁ, DOM ELISEU, IPIXUNA DO PARÁ, IRITUIA, MÃE DO RIO, NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, RONDON DO PARÁ, TOMÉ-AÇÚ, ULIANÓPOLIS.					
PRODUTO	VIA PAVIMENTADA	UNIDADE	KM	META 2021	16 KM

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021

Em 2021, a Ação 7645. *Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* foi desenvolvida na Região Rio Caeté nos municípios de Abel Figueiredo, Aurora do Pará, Bujaru, Capitão Poço, Concórdia do Pará, Dom Eliseu, Ipixuna do Pará, Irituia, Mãe do Rio, Nova Esperança do Piriá, Rondon do Pará, Tomé-Açú e Ulianópolis.

No que diz respeito ao município de Abel Figueiredo, o mesmo é atendido com recursos provenientes do Fundo para o Desenvolvimento Regional com Recursos da Desestatização (FRD2) do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) para execução de obras de pavimentação e drenagem. Ocorre que no primeiro semestre de 2020, o gestor do recurso (BNDES) adotou o posicionamento de suspender a aprovação e liberação de novos projetos, situação esta que permanece atualmente impedindo a implementação do projeto no município de Abel Figueiredo.

No município de Mãe do Rio, para o ano de 2021, também foi previsto a continuidade da execução de obra de pavimentação de vias urbanas com recurso oriundo da Caixa Econômica Federal – CEF, entretanto, o projeto encontra-se em fase de reprogramação com redução de metas e conclusão com funcionalidade. Após aprovada a reprogramação junto a CEF, a Sedop iniciará novo processo licitatório.

Quanto aos demais municípios, a tabela abaixo sintetiza o desenvolvimento das obras com os produtos obtidos no decorrer do ano de 2021:

MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	KM EXECUTADOS
AURORA DO PARÁ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	4 KM
BUJARU	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	4 KM
CAPITÃO POÇO	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	27 KM
CONCÓRDIA DO PARÁ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	4 KM
DOM ELISEU	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	4 KM
IPIXUNA DO PARÁ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	4 KM
IRITUIA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	6 KM
MÃE DO RIO	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	6 KM
NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	2 KM

MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	KM EXECUTADOS
RONDON DO PARÁ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	2 KM
RONDON DO PARÁ	EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ (FRD II)	3 KM
TOMÉ - AÇU	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	9 KM
ULIANÓPOLIS	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	4 KM
TOTAL REGIÃO RIO CAPIM		79 KM

Quanto ao desempenho físico da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* na Região Rio Capim, foram executados o quantitativo de 79 km de vias pavimentadas no decorrer do ano de 2021, o que representa superação da meta estabelecida para a região em cerca de 63 km.

Em relação ao desempenho financeiro houve necessidade de atualizar a dotação orçamentária inicial majorando em R\$ 11.042.340,14. Esta atualização foi necessária, principalmente, devido à grande demanda de serviços relacionados à execução obras de pavimentação que a Sedop recebe, cuja dotação inicial era insuficiente para o perfeito atendimento dos pleitos.

Finalizando, considerando o cenário exposto, a Sedop destaca que no ano de 2021, na Região Rio Capim, a *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas*, teve um desempenho *Acima do Programado*.

REGIÃO TAPAJÓS																																
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ITAITUBA, NOVO PROGRESSO, RURÓPOLIS, TRAIRÃO																																
PRODUTO	VIA PAVIMENTADA	UNIDADE	KM	META 2021	84 KM																											
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021																																
Para a Região Tapajós, em 2021, a implementação da <i>Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas</i> foi planejada para atender os municípios de Itaituba, Novo Progresso, Rurópolis e Trairão. É importante destacar que esta Região de Integração é beneficiada com recurso oriundo do Contrato de financiamento com o New Development Bank – NDB para implementação de ações voltadas para o componente Infraestrutura Urbana – Mobilidade. No município de Novo Progresso, para o ano de 2021, também foi previsto a continuidade da execução de obra de pavimentação de vias urbanas com recurso oriundo da Caixa Econômica Federal – CEF, entretanto, o projeto encontra-se em fase de reprogramação com redução de metas e conclusão com funcionalidade. Após aprovada a reprogramação junto a CEF, a Sedop encerrará o objeto. Outra situação que merece ser destacada é que, embora não tenha sido contemplado nos instrumento de planejamento para execução de obra de pavimentação, o município de Aveiro também foi beneficiado através do desenvolvimento da <i>Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas</i>. Para melhor entendimento do desempenho físico desta ação na Região Tapajós, a tabela a seguir apresenta a síntese dos produtos obtidos no exercício de 2021:																																
<table><tr><th>MUNICÍPIO</th><th>DESCRIÇÃO DA OBRA</th><th>KM EXECUTADOS</th></tr><tr><td>AVEIRO</td><td>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO.</td><td>2 KM</td></tr><tr><td>AVEIRO</td><td>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (FINISA).</td><td>4 KM</td></tr><tr><td>ITAITUBA</td><td>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL (NDB)</td><td>27 KM</td></tr><tr><td>NOVO PROGRESSO</td><td>REPASSE PREFEITURA - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, NOS BAIRROS BELA VISTA E CRISTO REI.</td><td>2 KM</td></tr><tr><td>NOVO PROGRESSO</td><td>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL (NDB)</td><td>10 KM</td></tr><tr><td>RURÓPOLIS</td><td>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL (NDB)</td><td>15 KM</td></tr><tr><td>TRAIRÃO</td><td>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL (NDB)</td><td>12 KM</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL REGIÃO TAPAJÓS</td><td>72 KM</td></tr></table>						MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	KM EXECUTADOS	AVEIRO	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO.	2 KM	AVEIRO	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (FINISA).	4 KM	ITAITUBA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL (NDB)	27 KM	NOVO PROGRESSO	REPASSE PREFEITURA - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, NOS BAIRROS BELA VISTA E CRISTO REI.	2 KM	NOVO PROGRESSO	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL (NDB)	10 KM	RURÓPOLIS	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL (NDB)	15 KM	TRAIRÃO	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL (NDB)	12 KM	TOTAL REGIÃO TAPAJÓS		72 KM
MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	KM EXECUTADOS																														
AVEIRO	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO.	2 KM																														
AVEIRO	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (FINISA).	4 KM																														
ITAITUBA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL (NDB)	27 KM																														
NOVO PROGRESSO	REPASSE PREFEITURA - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, NOS BAIRROS BELA VISTA E CRISTO REI.	2 KM																														
NOVO PROGRESSO	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL (NDB)	10 KM																														
RURÓPOLIS	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL (NDB)	15 KM																														
TRAIRÃO	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL (NDB)	12 KM																														
TOTAL REGIÃO TAPAJÓS		72 KM																														
Esclarecemos que a alimentação no sistema desta região no decorrer do ano de 2021 ficou desatualizada, por isso há divergência no quantitativo de quilômetros informado no sistema e o quantitativo de quilômetros apresentados neste Relatório de Gestão. Sendo assim, informamos que para o encerramento do exercício de 2021, o sistema SigPlan- Monitoramento será devidamente atualizado, de modo a garantir a unidade da informação. Por sua vez, considerando a meta atualizada de 72 km de vias pavimentadas na Região Tapajós e que a mesma corresponde ao atingimento de 85,71% da meta física estabelecida para o ano de 2021, o desempenho físico da <i>Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas</i> nesta região passa a ser de acordo com o planejado.																																

Com relação ao desempenho financeiro, o orçamento programado para atender esta ação na Região Tapajós foi de R\$ 21.149.362,00¹, sendo utilizado R\$ 19.825.978,50² estando em conformidade com o orçamento programado.

Por fim, considerando o cenário acima exposto, a Sedop destaca que no ano de 2021, na Região Tapajós, a *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas*, teve um desempenho físico e financeiro *Conforme o Programado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO TOCANTINS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ABAETETUBA, ACARÁ, BAIÃO, IGARAPÉ-MIRI, MOJU, OEIRAS DO PARÁ, TAILÂNDIA					
PRODUTO	VIA PAVIMENTADA	UNIDADE	KM	META 2021	13 KM

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021

Em 2021, a *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* foi desenvolvida na Região Tocantins nos municípios de Abaetetuba, Acará, Baião, Igarapé-Miri, Moju, Oeiras do Pará e Tailândia.

A tabela abaixo sintetiza o desenvolvimento das obras com os produtos obtidos no decorrer do ano de 2021:

MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	KM EXECUTADOS
ABAETETUBA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	27 KM
ACARÁ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	1 KM
BAIÃO	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	2 KM
IGARAPÉ - MIRI	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	7 KM
MOJU	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	8 KM
OEIRAS DO PARÁ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	1 KM
TAILÂNDIA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	7 KM
TOTAL REGIÃO TOCANTINS		53 KM

No que diz respeito a meta física, para o ano de 2021 foi planejado a execução de 13 km de vias pavimentadas na Região Tocantins, no entanto, a Sedop conseguiu ultrapassar a meta estabelecida em 40 km, garantindo desta forma a excelência no desempenho físico da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas*.

Com relação ao desempenho financeiro, o valor orçado inicialmente de R\$ 6.635.735,00¹, foi atualizado em R\$ 20.979.230,88 para atender a região com execução de obras de pavimentação, chegando ao valor de R\$ 27.614.965,88². Esta divergência *orçamento planejado X orçamento executado*, deve-se, em grande parte, ao fato do valor estabelecido no teto orçamentário disponibilizado para Sedop ser insuficiente para o atendimento real do número de obras executadas através desta ação.

Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7536. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* na Região Tocantins, encerra o exercício de 2021 com status de *Acima do Programado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO XINGU					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ALTAMIRA, ANAPU, BRASIL NOVO, MEDICILÂNDIA, PACAJÁ, PLACAS, PORTO DE MOZ, SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, URUARÁ, VITÓRIA DO XINGU					
PRODUTO	VIA PAVIMENTADA	UNIDADE	KM	META 2021	122 KM

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021																																									
Para a Região Xingu, em 2021, a implementação da <i>Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas</i> foi planejada para atender os municípios de Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Placas, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória Do Xingu. É importante destacar que esta Região de Integração é beneficiada com recurso oriundo do Contrato de financiamento Banco de Desenvolvimento da América Latina – Cooperação Andina de Fomento – CAF para implementação de ações voltadas para o componente Mobilidade e Drenagem Urbana e componente Desenvolvimento Urbano – Planejamento e com recurso oriundo do Contrato de financiamento com o New Development Bank – NDB para implementação de ações voltadas para o componente Infraestrutura Urbana – Mobilidade. Para melhor entendimento do desempenho físico desta ação na Região Xingu, a tabela a seguir apresenta a síntese dos produtos obtidos no exercício de 2021:																																									
	<table> <tr> <th>MUNICÍPIO</th><th>DESCRIÇÃO DA OBRA</th><th>KM EXECUTADOS</th></tr> <tr> <td>ALTAMIRA</td><td>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.</td><td>10 KM</td></tr> <tr> <td>ANAPU</td><td>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (CAF).</td><td>12 KM</td></tr> <tr> <td>BRASIL NOVO</td><td>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (NDB).</td><td>28 KM</td></tr> <tr> <td>MEDICILÂNDIA</td><td>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (NDB).</td><td>30 KM</td></tr> <tr> <td>MEDICILÂNDIA</td><td>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.</td><td>3 KM</td></tr> <tr> <td>PACAJÁ</td><td>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (CAF).</td><td>19 KM</td></tr> <tr> <td>PLACAS</td><td>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (NDB).</td><td>10 KM</td></tr> <tr> <td>PORTO DE MOZ</td><td>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (CAF).</td><td>16 KM</td></tr> <tr> <td>SENADOR JOSÉ PORFÍRIO</td><td>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (NDB).</td><td>22 KM</td></tr> <tr> <td>URUARÁ</td><td>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.</td><td>9 KM</td></tr> <tr> <td>VITÓRIA DO XINGU</td><td>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.</td><td>6 KM</td></tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL REGIÃO XINGU</td><td>165 KM</td></tr> </table>	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	KM EXECUTADOS	ALTAMIRA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	10 KM	ANAPU	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (CAF).	12 KM	BRASIL NOVO	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (NDB).	28 KM	MEDICILÂNDIA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (NDB).	30 KM	MEDICILÂNDIA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	3 KM	PACAJÁ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (CAF).	19 KM	PLACAS	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (NDB).	10 KM	PORTO DE MOZ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (CAF).	16 KM	SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (NDB).	22 KM	URUARÁ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	9 KM	VITÓRIA DO XINGU	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	6 KM	TOTAL REGIÃO XINGU		165 KM	
MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	KM EXECUTADOS																																							
ALTAMIRA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	10 KM																																							
ANAPU	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (CAF).	12 KM																																							
BRASIL NOVO	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (NDB).	28 KM																																							
MEDICILÂNDIA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (NDB).	30 KM																																							
MEDICILÂNDIA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	3 KM																																							
PACAJÁ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (CAF).	19 KM																																							
PLACAS	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (NDB).	10 KM																																							
PORTO DE MOZ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (CAF).	16 KM																																							
SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (NDB).	22 KM																																							
URUARÁ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	9 KM																																							
VITÓRIA DO XINGU	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	6 KM																																							
TOTAL REGIÃO XINGU		165 KM																																							
Esclarecemos que a alimentação no sistema desta região no decorrer do ano de 2021 ficou desatualizada, por isso há divergência no quantitativo de quilômetros informado no sistema e o quantitativo de quilômetros apresentados neste Relatório de Gestão. Sendo assim,																																									

informamos que para o encerramento do exercício de 2021, o sistema SigPlan- Monitoramento será devidamente atualizado, de modo a garantir a unidade da informação.

No que diz respeito a meta física, para o ano de 2021 foi planejado a execução de 122 km de vias pavimentadas na Região Xingu, no entanto, a Sedop conseguiu ultrapassar a meta estabelecida em 43 km, garantindo desta forma a excelência no desempenho físico da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas*.

Com relação ao desempenho financeiro, o valor orçado inicialmente de R\$ 24.519.592,00¹, foi atualizado em R\$ 25.271.877,60 para atender a região com execução de obras de pavimentação, chegando ao valor de R\$ 49.791.469,60². Esta divergência *orçamento planejado X orçamento executado*, deve-se, em grande parte, ao fato do valor estabelecido no teto orçamentário disponibilizado para Sedop ser insuficiente para o atendimento real do número de obras executadas através desta ação.

Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7536. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* na Região Xingu, encerra o exercício de 2021 com status de *Acima do Programado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

6.1.6. Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana

REGIÃO BAIXO AMAZONAS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: BELTERRA, MOJUÍ DOS CAMPOS, SANTARÉM.					
PRODUTO	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2021	1 SISTEMA IMPLANTADO
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Para o ano de 2021, na Região Baixo Amazonas, esperava-se o desenvolvimento da <i>Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança</i>, através da continuidade das seguintes atividades interrompidas pela pandemia da Covid – 19: 1. Retomada das articulações com os órgãos municipais da Região Metropolitana de Santarém (RMS); 2. Readequação da minuta de Projeto de Lei Complementar da RMS; 3. Retomada dos estudos e pesquisas para a elaboração do Termo de Referência para a contratação de uma consultoria do PDUI - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, Entretanto, por decorrência ainda dos efeitos da pandemia, várias condicionantes internas e externas, impossibilitaram a realização das atividades acima mencionadas, bem como, a realização das atividades de campo nos municípios que fazem parte da Região Metropolitana de Santarém (RMS). Este contexto justifica o baixo desempenho físico e financeiro atribuído a esta ação governamental no exercício de 2021, o que lhe confere o status de <i>Abaixo do Esperado</i>. Ainda como justificativa, a Sedop informa que: - A meta da <i>Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana</i> é ter 01 Sistema de Governança Implantado na Região Metropolitana de Santarém – RMS, a qual abrange três municípios da Região de Integração Baixo Amazonas (Belterra, Mojuí dos Campos e Santarém) e não ter 01 sistema implantado em cada município e em cada ano do PPA, como o sistema consolida; - O bom desempenho desta ação não está totalmente na governabilidade da Sedop, haja vista que, para que a mesma se concretize, a resolutividades de condicionantes políticas são fundamentais para a continuidade do processo; - A obtenção do produto/meta desta ação tem como prazo limite o período de vigência do PPA 2020/2023, ou seja, até o ano de 2023, podendo ocorrer antes dependendo da evolução das tratativas técnicas e, principalmente, políticas. Frente ao exposto, a Sedop espera fundamentar o motivo do desempenho físico e financeiro da <i>Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana</i> na Região Baixo Amazonas apresentar o status de <i>Abaixo do Programado</i> no Sistema Integrado de Planejamento - SIGPLAN – Monitoramento, para o exercício de 2021.					

REGIÃO CARAJÁS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: BOM JESUS DO TOCANTINS, MARABÁ, SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, SÃO JOÃO DO ARAGUAIA.					
PRODUTO	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2021	1 SISTEMA IMPLANTADO
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Para o ano de 2021, na Região Carajás, esperava-se o desenvolvimento da <i>Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança</i>, através da continuidade das seguintes atividades interrompidas pela pandemia da Covid – 19: - Retomada das articulações com os órgãos municipais da Região Metropolitana de Marabá (RMM); - Readequação da minuta de Projeto de Lei Complementar da RMM; - Retomada dos estudos e pesquisas para a elaboração do Termo de Referência para a contratação de uma consultoria do PDUI - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, Entretanto, por decorrência ainda dos efeitos da pandemia, várias condicionantes internas e externas, impossibilitaram a realização das atividades acima mencionadas, bem como, a realização das atividades de campo nos municípios que fazem parte da Região Metropolitana de Marabá (RMM). Este contexto justifica o baixo desempenho físico e financeiro atribuído a esta ação governamental no exercício de 2021, o que lhe confere o status de <i>Abaixo do Esperado</i>. Ainda como justificativa, a Sedop informa que: - A meta da <i>Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana</i> é ter 01 Sistema de Governança Implantado na Região Metropolitana de Marabá – RMM, caso a referida RMM seja instituída. O Projeto de lei nº 167/2012 estabelece a composição da RMM com municípios que fazem parte da Região de Integração Carajás (Bom Jesus do Tocantins, Marabá e São Domingos do Araguaia) e da Região de Integração Lago de Tucuruí (Itupiranga e Nova Ipixuna); - O bom desempenho desta ação não está totalmente na governabilidade da Sedop, haja vista que, para que a mesma se concretize, a resolutividades de condicionantes políticas são fundamentais para a continuidade do processo; - A obtenção do produto/meta desta ação tem como prazo limite o período de vigência do PPA 2020/2023, ou seja, até o ano de 2023, podendo ocorrer antes dependendo da evolução das tratativas técnicas e, principalmente, políticas. Frente ao exposto, a Sedop espera fundamentar o motivo do desempenho físico e financeiro da <i>Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana</i> na Região Carajás apresentar o status de <i>Abaixo do Programado</i> no Sistema Integrado de Planejamento - SIGPLAN – Monitoramento, para o exercício de 2021.					

REGIÃO GUAJARÁ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ANANINDEUA, BELÉM, BENEVIDES, MARITUBA, SANTA BÁRBARA DO PARÁ.					
PRODUTO	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2021	1 SISTEMA IMPLANTADO
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Para o ano de 2021, na Região Guajará, esperava-se o desenvolvimento da <i>Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança</i>, através da continuidade das seguintes atividades interrompidas pela pandemia da Covid – 19: - Retomada das articulações com os órgãos municipais da Região Metropolitana de Belém (RMB); - Readequação da minuta de Projeto de Lei Complementar da RMB; - Retomada dos estudos e pesquisas para a elaboração do Termo de Referência para a contratação de uma consultoria do PDUI - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, Entretanto, por decorrência ainda dos efeitos da pandemia, várias condicionantes internas e externas, impossibilitaram a realização das atividades acima mencionadas, bem como, a realização das atividades de campo nos municípios que fazem parte da Região Metropolitana de Belém (RMB). Este contexto justifica o baixo desempenho físico e financeiro atribuído a esta ação governamental no exercício de 2021, o que lhe confere o status de <i>Abaixo do Esperado</i>. Ainda como justificativa, a Sedop informa que: - A meta da <i>Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana</i> é ter 01 Sistema de Governança Implantado na Região Metropolitana de Belém – RMB. A Lei Complementar nº 76/2011 estabelece a composição da RMB com municípios que fazem parte da Região de Integração Guajará (Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba e Santa Bárbara do Pará) e da Região de Integração Guamá (Castanhal e Santa Izabel do Pará); - O Sistema Integrado de Planejamento - SIGPLAN – Monitoramento, consolida equivocadamente 01 sistema implantado em cada município e em cada ano do PPA, o que, conforme explicado acima, não condiz com o produto esperado para esta ação. - O bom desempenho desta ação não está totalmente na governabilidade da Sedop, haja vista que, para que a mesma se concretize, a resolutividades de condicionantes políticas são fundamentais para a continuidade do processo; - A obtenção do produto/meta desta ação tem como prazo limite o período de vigência do PPA 2020/2023, ou seja, até o ano de 2023, podendo ocorrer antes dependendo da evolução das tratativas técnicas e, principalmente, políticas. Frente ao exposto, a Sedop espera fundamentar o motivo do desempenho físico e financeiro da <i>Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana</i> na Região Guajará apresentar o status de <i>Abaixo do Programado</i> no Sistema Integrado de Planejamento - SIGPLAN – Monitoramento, para o exercício de 2021.					

REGIÃO GUAMÁ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: CASTANHAL, SANTA IZABEL.					
PRODUTO	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2021	MUNICÍPIOS QUE FAZEM PARTE DA RMB
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Para o ano de 2021, na Região Guajará, esperava-se o desenvolvimento da <i>Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança</i>, através da continuidade das seguintes atividades interrompidas pela pandemia da Covid – 19: 10. Retomada das articulações com os órgãos municipais da Região Metropolitana de Belém (RMB); 11. Readequação da minuta de Projeto de Lei Complementar da RMB; 12. Retomada dos estudos e pesquisas para a elaboração do Termo de Referência para a contratação de uma consultoria do PDUI - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, Entretanto, por decorrência ainda dos efeitos da pandemia, várias condicionantes internas e externas, impossibilitaram a realização das atividades acima mencionadas, bem como, a realização das atividades de campo nos municípios que fazem parte da Região Metropolitana de Belém (RMB). Este contexto justifica o baixo desempenho físico e financeiro atribuído a esta ação governamental no exercício de 2021, o que lhe confere o status de <i>Abaixo do Esperado</i>. Ainda como justificativa, a Sedop informa que: - A meta da <i>Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana</i> é ter 01 Sistema de Governança Implantado na Região Metropolitana de Belém – RMB. A Lei Complementar nº 76/2011 estabelece a composição da RMB com municípios que fazem parte da Região de Integração Guajará (Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba e Santa Bárbara do Pará) e da Região de Integração Guamá (Castanhal e Santa Izabel do Pará); - O Sistema Integrado de Planejamento - SIGPLAN – Monitoramento, consolida equivocadamente 01 sistema implantado em cada município e em cada ano do PPA, o que, conforme explicado acima, não condiz com o produto esperado para esta ação. - O bom desempenho desta ação não está totalmente na governabilidade da Sedop, haja vista que, para que a mesma se concretize, a resolutividades de condicionantes políticas são fundamentais para a continuidade do processo; - A obtenção do produto/meta desta ação tem como prazo limite o período de vigência do PPA 2020/2023, ou seja, até o ano de 2023, podendo ocorrer antes dependendo da evolução das tratativas técnicas e, principalmente, políticas. Frente ao exposto, a Sedop espera fundamentar o motivo do desempenho físico e financeiro da <i>Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana</i> na Região Guajará apresentar o status de <i>Abaixo do Programado</i> no Sistema Integrado de Planejamento - SIGPLAN – Monitoramento, para o exercício de 2021.					

REGIÃO LAGO DE TUCURUÍ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ITUPIRANGA, NOVA IPIXUNA.					
PRODUTO	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2021	MUNICÍPIOS QUE FAZEM PARTE DA RMM
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Para o ano de 2021, na Região Carajás, esperava-se o desenvolvimento da <i>Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança</i>, através da continuidade das seguintes atividades interrompidas pela pandemia da Covid – 19: 13. Retomada das articulações com os órgãos municipais da Região Metropolitana de Marabá (RMM); 14. Readequação da minuta de Projeto de Lei Complementar da RMM; 15. Retomada dos estudos e pesquisas para a elaboração do Termo de Referência para a contratação de uma consultoria do PDUI - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, Entretanto, por decorrência ainda dos efeitos da pandemia, várias condicionantes internas e externas, impossibilitaram a realização das atividades acima mencionadas, bem como, a realização das atividades de campo nos municípios que fazem parte da Região Metropolitana de Marabá (RMM). Este contexto justifica o baixo desempenho físico e financeiro atribuído a esta ação governamental no exercício de 2021, o que lhe confere o status de <i>Abaixo do Esperado</i>. Ainda como justificativa, a Sedop informa que: - A meta da <i>Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana</i> é ter 01 Sistema de Governança Implantado na Região Metropolitana de Marabá – RMM, caso a referida RMM seja instituída. O Projeto de lei nº 167/2012 estabelece a composição da RMM com municípios que fazem parte da Região de Integração Carajás (Bom Jesus do Tocantins, Marabá e São Domingos do Araguaia) e da Região de Integração Lago de Tucuruí (Itupiranga e Nova Ipixuna); - O bom desempenho desta ação não está totalmente na governabilidade da Sedop, haja vista que, para que a mesma se concretize, a resolutividades de condicionantes políticas são fundamentais para a continuidade do processo; - A obtenção do produto/meta desta ação tem como prazo limite o período de vigência do PPA 2020/2023, ou seja, até o ano de 2023, podendo ocorrer antes dependendo da evolução das tratativas técnicas e, principalmente, políticas. Frente ao exposto, a Sedop espera fundamentar o motivo do desempenho físico e financeiro da <i>Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana</i> na Região Carajás apresentar o status de <i>Abaixo do Programado</i> no Sistema Integrado de Planejamento - SIGPLAN – Monitoramento, para o exercício de 2021.					

6.1.7. Ação 8463. Apoio às Ações do Concidades

REGIÃO GUAJARÁ																				
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: BELÉM																				
PRODUTO	CONSELHO APOIADO	UNIDADE	UN	META 2021	1 CONSELHO APOIADO															
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021																				
Em 2021, a Sedop pôde trabalhar com mais afinco no desenvolvimento da <i>Ação 8463. Apoio às Ações do Concidades</i>, ação esta que é de suma importância para a construção de políticas públicas nas áreas de habitação, saneamento ambiental, transporte e mobilidade urbana e planejamento territorial, que favoreçam o acesso a todos os cidadãos. Embora no período de janeiro a abril de 2021, por atendimento do decreto estadual as atividades presenciais ainda estivessem suspensas, nos demais meses, a Sedop executou atividades de apoio às ações do Concidades. A tabela abaixo apresenta de forma sucinta as atividades retomadas no ano de 2021:																				
<table><tr><th colspan="2">APOIO ÀS AÇÕES DO CONCIDADES - 2021</th></tr><tr><th>ATIVIDADES</th><th>DATA</th></tr><tr><td rowspan="6">1. REUNIÕES COM A COORDENAÇÃO EXECUTIVA DO CONSELHO DAS CIDADES.</td><td>12/05/21 A 19/05/21 (VIRTUAL)</td></tr><tr><td>26/05/21 (PRESENCIAL)</td></tr><tr><td>11/06/21, 16/06/21 E 23/06/21 (VIRTUAL)</td></tr><tr><td>17/07/21 E 21/07/21 (PRESENCIAL)</td></tr><tr><td>03/08/21, 17/08/21, 24/08/21, 26/08/21 (PRESENCIAL)</td></tr><tr><td>03/09/21 (PRESENCIAL)</td></tr><tr><td>2. 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES.</td><td>06/07/21 E 07/07/2021 (VIRTUAL)</td></tr><tr><td>3. 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES.</td><td>17/09/21 (VIRTUAL)</td></tr></table>						APOIO ÀS AÇÕES DO CONCIDADES - 2021		ATIVIDADES	DATA	1. REUNIÕES COM A COORDENAÇÃO EXECUTIVA DO CONSELHO DAS CIDADES.	12/05/21 A 19/05/21 (VIRTUAL)	26/05/21 (PRESENCIAL)	11/06/21, 16/06/21 E 23/06/21 (VIRTUAL)	17/07/21 E 21/07/21 (PRESENCIAL)	03/08/21, 17/08/21, 24/08/21, 26/08/21 (PRESENCIAL)	03/09/21 (PRESENCIAL)	2. 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES.	06/07/21 E 07/07/2021 (VIRTUAL)	3. 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES.	17/09/21 (VIRTUAL)
APOIO ÀS AÇÕES DO CONCIDADES - 2021																				
ATIVIDADES	DATA																			
1. REUNIÕES COM A COORDENAÇÃO EXECUTIVA DO CONSELHO DAS CIDADES.	12/05/21 A 19/05/21 (VIRTUAL)																			
	26/05/21 (PRESENCIAL)																			
	11/06/21, 16/06/21 E 23/06/21 (VIRTUAL)																			
	17/07/21 E 21/07/21 (PRESENCIAL)																			
	03/08/21, 17/08/21, 24/08/21, 26/08/21 (PRESENCIAL)																			
	03/09/21 (PRESENCIAL)																			
2. 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES.	06/07/21 E 07/07/2021 (VIRTUAL)																			
3. 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES.	17/09/21 (VIRTUAL)																			
Merece destaque no ano de 2021, a realização da <i>19ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual das Cidades</i>, por marcar a retomada dos encontros presenciais dos conselheiros. O evento aconteceu no período de 24/11/21 a 26/11/21 e contou com a participação de conselheiros representantes de municípios das 12 Regiões de Integração do Estado. Um dos propósitos da <i>19ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual das Cidades</i> é iniciar os trabalhos de mobilização e articulação para a realização da <i>7ª Conferência Estadual das Cidades do Pará</i>, que acontecerá em 2022 tendo como tema “Cidades Democráticas, Inclusivas e Sustentáveis”. Quanto ao desempenho físico, esclarecemos que a alimentação no sistema desta ação no decorrer do ano de 2021 ficou desatualizada, sendo assim, informamos que para o encerramento do exercício de 2021, o sistema SigPlan- Monitoramento será devidamente atualizado, de modo a garantir a unidade da informação de 01 Conselho Apoiado.																				

Quanto ao desempenho financeiro, do orçamento programado para atender a *Ação 8463. Apoio às Ações do Concidades* no valor de R\$ 67.900,00¹, foram utilizados cerca de 33% que corresponde a R\$ 22.204,92² para o pagamento de atividades de apoio técnico (diárias).

Por fim, considerando o cenário apresentado, apesar das dificuldades enfrentadas no ano de 2021 para desenvolver a *Ação 8463. Apoio às Ações do Concidades*, o esforço dos técnicos envolvidos na execução desta ação, possibilitou que a meta estabelecida de 1 Conselho Apoiado fosse alcançada, garantindo desta forma o status de *Conforme o Programado* para esta ação no exercício de 2021.

¹ FONTE: SIGPLAN – MÓDULO MONITORAMENTO: NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN – MÓDULO MONITORAMENTO: NOVEMBRO/2021.

6.1.8. Ação 8692. Apoio à Implementação da Política Estadual de Saneamento Básico

REGIÃO ARAGUAIA					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: BANNACH, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2021	3 INSTRUMENTOS ELABORADOS
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Em 2021, na Região Araguaia, o apoio técnico em ações de investimento em instrumentos de saneamento básico foi planejado para atender os municípios de Bannach, Conceição do Araguaia e Redenção. No que diz respeito aos municípios de Bannach e Conceição do Araguaia, não houve demanda de saneamento no ano de 2021. Com relação ao município de Rio Maria, o mesmo não foi contemplado na programação do ano de 2021, devido ao cenário favorável para finalização do instrumento em 2020 no momento da elaboração do orçamento da Sedop para o ano de 2021, situação esta que não se concretizou. Desta forma, objetivando a finalização do instrumento no município de Rio Maria, o mesmo teve atividades desenvolvidas em 2021. Para melhor entendimento do desempenho da Ação 8692. Apoio à Implementação da Política Estadual de Saneamento Básico na Região Araguaia, em 2021, a tabela abaixo sintetiza as principais atividades desenvolvidas, bem como, produtos obtidos:					
MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS		% EXECUTADO ¹	
REDENÇÃO	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO TC 27/2019	- ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PRODUTOS REFERENTES AO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO; - ORIENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES PARA FORMULAÇÃO DOS PRODUTOS NO CRONOGRAMA DE AÇÕES; - PROSSEGUIMENTO DOS LEVANTAMENTOS PARA FORMULAÇÃO DO DIAGNÓSTICO TÉCNICO PARTICIPATIVO MUNICIPAL.		25% COM CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DE PRODUTOS.	
RIO MARIA	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO (CV 118/2012 FUNASA/SEDOP)	- ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – EXECUTADOS TODOS OS PRODUTOS.		100% DOS PRODUTOS DA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO FORAM EXECUTADOS E ENTREGUES PELA EMPRESA CONTRATADA.	
Quanto ao desempenho físico, esclarecemos que a alimentação no sistema desta ação no decorrer do ano de 2021 ficou desatualizada, sendo assim, informamos que para o encerramento do exercício de 2021, o sistema SigPlan- Monitoramento será devidamente atualizado, de modo a garantir a unidade da informação de 01 Instrumento Elaborado no município de Rio Maria. Com relação à execução financeira, embora a ação tenha recebido aporte orçamentário de R\$ 65.409,00² para o desenvolvimento desta ação na Região Araguaia durante o ano de					

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

2021, os técnicos da SEDOP realizaram o apoio técnico aos municípios de maneira virtual, o que consequentemente, não gerou dispêndios financeiros.

Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* na Região Araguaia no exercício de 2021, *Merece Atenção*. No entanto, vale ressaltar que, a obtenção do produto desta ação, bem como o alcance da meta física estabelecida não está totalmente na governabilidade da SEDOP. Os municípios contemplados têm grande influência para que o desempenho da referida ação seja Conforme o Programado.

REGIÃO BAIXO AMAZONAS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: CURUÁ, JURUTI, MONTE ALEGRE, ÓBIDOS, PRAINHA, SANTARÉM.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2021	6 INSTRUMENTOS ELABORADOS
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Em 2021, na Região Baixo Amazonas, o apoio técnico em ações de investimento em instrumentos de saneamento básico foi planejado para atender os municípios de Curuá, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Prainha e Santarém. No que diz respeito aos municípios de Óbidos e Santarém, não houve demanda de saneamento no ano de 2021. Quanto aos demais municípios, a tabela abaixo sintetiza as principais atividades desenvolvidas no decorrer do ano de 2021:					
MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS		% EXECUTADO ¹	
CURUÁ	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	- ORIENTAÇÃO TÉCNICA DURANTE AS FASES DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO; - ORIENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTOS QUE AUXILIARAM A FORMULAÇÃO DO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL.		20% COM CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DE PRODUTOS.	
JURUTI	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	- ORIENTAÇÃO TÉCNICA DURANTE AS FASES DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO; - ANÁLISE DAS PEÇAS TÉCNICAS;		30% DAS ATIVIDADES REALIZADAS.	
MONTE ALEGRE	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	- ORIENTAÇÃO TÉCNICA DURANTE AS FASES DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO; - ANÁLISE DAS PEÇAS TÉCNICAS;		35% DAS ATIVIDADES REALIZADAS.	
PRAINHA	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	- ORIENTAÇÃO TÉCNICA DURANTE AS FASES DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO; - ANÁLISE DAS PEÇAS TÉCNICAS;		25% COM CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE ELABORAÇÃO DAS ETAPAS DO PLANO.	
Quanto ao desempenho físico, esclarecemos que a alimentação no sistema desta ação no decorrer do ano de 2021 ficou desatualizada, sendo assim, informamos que para o encerramento do exercício de 2021, o sistema SigPlan- Monitoramento será devidamente atualizado, de modo a garantir a unidade da informação. Com relação à execução financeira, da dotação inicial de R\$ 130.818,00² para atender a Região Baixa Amazonas durante o ano de 2021, houve movimentação financeira no valor de R\$ 2.336,42³ referente ao pagamento de diárias aos técnicos responsáveis pelo desenvolvimento da ação. Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico na Região Baixo Amazonas no exercício de 2021, foi <i>Abaixo do Esperado</i>. No entanto, vale ressaltar que, a obtenção do produto desta ação, bem como o alcance da meta física estabelecida não está totalmente na governabilidade da SEDOP. Os municípios contemplados têm grande influência para que o desempenho da referida ação seja conforme o programado.					

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

³ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO GUAJARÁ					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: BENEVIDES					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2021	NÃO PROGRAMADA
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
O atendimento ao município de Breves e a Região Guajará através da <i>Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico</i>, não foi programado nos instrumentos de planejamento da Sedop. Entretanto, após manifestação do município formalizada por meio de ofício encaminhado a Sedop, foi firmado Termo de Cooperação Técnica nº 02/2021, cujo objeto é “Concepção do Plano de Saneamento Básico Municipal”. Atualmente, a Sedop está aguardando o cronograma de visita ao município para apresentação da metodologia de elaboração do Plano de Saneamento Básico e formação de Grupos de Trabalho, conforme prevê as etapas iniciais do cronograma de atividades. Quanto ao desempenho físico e financeiro da <i>Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico</i> na Região Guajará, como se trata de uma demanda espontânea, surgida em momento posterior a elaboração dos instrumentos de planejamento da Sedop, não foram estabelecidas metas físicas e nem financeiras para o ano de 2021 que possam referenciar um desempenho adequado ou não desta ação na região.					

REGIÃO GUAMÁ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: CASTANHAL, COLARES, CURUÇÁ, IGARAPÉ-AÇU, INHANGAPI, MARACANÃ, MARAPANIM, SANTA IZABEL DO PARÁ, SANTA MARIA DO PARÁ, SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ, SÃO CAETANO DE ODIVELAS, SÃO DOMINGOS DO CAPIM, SÃO FRANCISCO DO PARÁ, SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, VIGIA.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2021	15 INSTRUMENTOS ELABORADOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021			
Em 2021, na Região Guamá, o apoio técnico em ações de investimento em instrumentos de saneamento básico foi planejado para atender os municípios de Castanhal, Colares, Curuçá, Igarapé-Açu, Inhangapi, Maracanã, Marapanim, Santa Izabel do Pará, Santa Maria do Pará, Santo Antônio do Tauá, São Caetano de Odívalas, São Domingos do Capim, São Francisco do Pará, São Miguel do Guamá e Vigia. No que diz respeito aos municípios de Colares, Curuçá, Igarapé-Açu, Maracanã, Marapanim e Santo Antônio do Tauá, não houve demanda de saneamento no ano de 2021. Quanto aos demais municípios, a tabela abaixo sintetiza as principais atividades desenvolvidas no decorrer do ano de 2021, tanto nos municípios programados, quanto nos municípios atendidos através de demanda espontânea:			
MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
CASTANHAL, INHANGAPI, SANTA MARIA DO PARÁ, SANTA IZABEL DO PARÁ, SÃO FRANCISCO DO PARÁ	PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (Vinculado ao CAF)	- FORMAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO COM DECRETO MUNICIPAL DEFININDO OS INTEGRANTES; - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL; - LEVANTAMENTOS PRELIMINARES QUE AUXILIAREM A FORMULAÇÃO DO DIAGNÓSTICO TÉCNICO PARTICIPATIVO MUNICIPAL.	35% DAS ATIVIDADES REALIZADAS
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	- TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ELABORADO, PORÉM NÃO HOUVE PUBLICAÇÃO. (GESTOR MUNICIPAL NÃO ASSINOU O TC - AÇÃO PARALISADA)	10% FASE INICIAL DE ELABORAÇÃO
SÃO DOMINGOS DO CAPIM	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	- ORIENTAÇÃO TÉCNICA DURANTE AS FASES DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO; - ANÁLISE DAS PEÇAS TÉCNICAS; - REFORMULAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO COM DECRETO MUNICIPAL DEFININDO OS INTEGRANTES; - ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL; - LEVANTAMENTOS PARA FINALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO TÉCNICO PARTICIPATIVO MUNICIPAL.	20% CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE ELABORAÇÃO DAS ETAPAS DO PLANO
SÃO CAETANO DE ODIVELAS	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	- FIRMADO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 13/2021 ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E SEDOP; OBS: Aguardando cronograma de visita ao município para apresentação da metodologia de elaboração do plano de saneamento.	15% FASE INICIAL DE ELABORAÇÃO
SÃO CAETANO DE ODIVELAS	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	- FIRMADO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 13/2021 ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E SEDOP; OBS: Aguardando cronograma de visita ao município para apresentação da metodologia de elaboração do plano de saneamento.	15% FASE INICIAL DE ELABORAÇÃO
MAGALHÃES BARATA (Demanda Espontânea)	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	- FIRMADO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 24/2021 ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E SEDOP; OBS: Aguardando cronograma de visita ao município para apresentação da metodologia de elaboração do plano de saneamento.	15% FASE INICIAL DE ELABORAÇÃO

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

Com relação à execução financeira, da dotação inicial de R\$ 327.045,00¹ para atender a Região Guamá durante o ano de 2021, houve movimentação financeira no valor de R\$ 40.506,05². Deste valor, R\$ 38.242,08 é referente ao pagamento da obra de “Construção de Galpão para Tratamento de Resíduos Sólidos”. Esta situação ocorreu devido a uma execução orçamentária na natureza de despesa 449051- Obras e Instalações, a qual não é prevista nesta ação para a aplicação dos recursos. Esta execução orçamentária e financeira deveria ter sido empenhada e paga na Ação 7644. *Implantação de Aterros Sanitários*.

Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da Ação 8692. *Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* na Região Guamá no exercício de 2021, foi *Abaixo do Esperado*. No entanto, vale ressaltar que, a obtenção do produto desta ação, bem como o alcance da meta física estabelecida não está totalmente na governabilidade da SEDOP. Os municípios contemplados têm grande influência para que o desempenho da referida ação seja conforme o programado.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO LAGO DE TUCURUÍ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: BREU BRANCO, JACUNDÁ.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2021	2 INSTRUMENTOS ELABORADOS
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Em 2021, na Região Lago de Tucuruí, o apoio técnico em ações de investimento em instrumentos de saneamento básico foi planejado para atender os municípios de Breu Branco e Jacundá. No que diz respeito ao município de Breu Branco, não houve demanda de saneamento no ano de 2021. Quanto ao município de Tucuruí, embora no ano de 2020 algumas atividades tenham sido desenvolvidas, tais como: continuidade dos levantamentos, formulação do diagnóstico municipal e reorganização do cronograma das etapas de elaboração, o município não manifestou interesse em prorrogar a vigência do Termo de Cooperação Técnica, o que ocasionou a paralisação das atividades no ano de 2021. Com relação à execução financeira, embora a ação tenha recebido um aporte orçamentário de R\$ 43.606,00¹ para o desenvolvimento desta ação na Região Lago de Tucuruí durante o ano de 2021, conforme explicado anteriormente, como a ação não teve desempenho físico, não houve dispêndio financeiro. Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da <i>Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico</i> na Região Lago de Tucuruí no exercício de 2021, foi <i>Abaixo do Esperado</i>. No entanto, vale ressaltar que, a obtenção do produto desta ação, bem como o alcance da meta física estabelecida não está totalmente na governabilidade da SEDOP. Os municípios contemplados têm grande influência para que o desempenho da referida ação seja conforme o programado.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO MARAJÓ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ANAJÁS, BREVES, PONTA DE PEDRAS, PORTEL, SALVATERRA, SANTA CRUZ DO ARARI, SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2021	7 INSTRUMENTOS ELABORADOS
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Em 2021, na Região Marajó, o apoio técnico em ações de investimento em instrumentos de saneamento básico foi planejado para atender os municípios de Anajás, Breves, Ponta de Pedras, Portel, Salvaterra, Santa Cruz do Arari e São Sebastião da Boa Vista. No que diz respeito aos municípios de Anajás, Salvaterra e São Sebastião da Boa Vista, não houve demanda de saneamento no ano de 2021. Quanto aos demais municípios, a tabela abaixo sintetiza as principais atividades desenvolvidas no decorrer do ano de 2021, tanto nos municípios programados, quanto nos municípios atendidos através de demanda espontânea:					
MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS		% EXECUTADO ¹	
AFUÁ (Demanda Espontânea)	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	- FIRMADO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 09/2021 ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E SEDOP; OBS: Aguardando cronograma de visita ao município para apresentação da metodologia de elaboração do plano de saneamento.		15% FASE INICIAL DE ELABORAÇÃO	
BREVES	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	- TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ELABORADO, PORÉM NÃO HOUVE PUBLICAÇÃO. (GESTOR MUNICIPAL NÃO ASSINOU O TC - AÇÃO PARALISADA)		10% FASE INICIAL DE ELABORAÇÃO	
GURUPÁ (Demanda Espontânea)	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	- ORIENTAÇÃO TÉCNICA DURANTE AS FASES DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO; - ANÁLISE DAS PEÇAS TÉCNICAS; - REFORMULAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO COM DECRETO MUNICIPAL DEFININDO OS INTEGRANTES; - ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL; - LEVANTAMENTOS PARA FINALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO TÉCNICO PARTICIPATIVO MUNICIPAL.		20% CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DE PRODUTOS.	
PONTA DE PEDRAS (Demanda Espontânea)	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	- ORIENTAÇÃO TÉCNICA DURANTE AS FASES DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO; - APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 06/2021. - FORMAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO COM DECRETO MUNICIPAL DEFININDO OS INTEGRANTES; - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL; - LEVANTAMENTOS PARA FINALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO TÉCNICO PARTICIPATIVO MUNICIPAL.		10% INÍCIO DAS ORIENTAÇÕES E APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA DE TRABALHO.	
PORTEL	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	- ORIENTAÇÃO TÉCNICA DURANTE AS FASES DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO; - ANÁLISE DAS PEÇAS TÉCNICAS; - CONTINUAÇÃO DO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE QUESTIONÁRIOS, RELATÓRIOS E DAS ETAPAS DE ELABORAÇÃO.		20% CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE ELABORAÇÃO DAS ETAPAS DO PLANO	

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
SANTA CRUZ DO ARARI (Demanda Espontânea)	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	- ORIENTAÇÃO TÉCNICA DURANTE AS FASES DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO; - ANÁLISE DAS PEÇAS TÉCNICAS; - CONTINUAÇÃO DO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE QUESTIONÁRIOS, RELATÓRIOS E DAS ETAPAS DE ELABORAÇÃO.	20% CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DE PRODUTOS.

Com relação à execução financeira, da dotação inicial de R\$ 153.061,00² para atender a Região Marajó durante o ano de 2021, houve movimentação financeira no valor de R\$ 2.692,49³ referente ao pagamento de diárias aos técnicos responsáveis pelo desenvolvimento da ação.

Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* na Região Marajó no exercício de 2021, foi *Abaixo do Esperado*. No entanto, vale ressaltar que, a obtenção do produto desta ação, bem como o alcance da meta física estabelecida não está totalmente na governabilidade da SEDOP. Os municípios contemplados têm grande influência para que o desempenho da referida ação seja conforme o programado.

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

³ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO RIO CAETÉ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: QUATIPURU, TRACUATEUA.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2021	2 INSTRUMENTOS ELABORADOS
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Em 2021, na Região Rio Caeté, o apoio técnico em ações de investimento em instrumentos de saneamento básico foi planejado para atender os municípios de Quatipuru e Tracuateua. No que diz respeito ao município de Tracuateua, não houve demanda de saneamento no ano de 2021, no entanto a Sedop atendeu o município de Augusto Corrêa através de demanda espontânea. A tabela abaixo sintetiza as principais atividades desenvolvidas no decorrer do ano de 2021, nos municípios de Quatipuru e Augusto Corrêa:					
MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS		% EXECUTADO ¹	
QUATIPURU	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	- ORIENTAÇÃO TÉCNICA DURANTE AS FASES DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO; - ANÁLISE DAS PEÇAS TÉCNICAS; - REFORMULAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO COM DECRETO MUNICIPAL DEFININDO OS INTEGRANTES; - ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL; - LEVANTAMENTOS PARA FINALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO TÉCNICO PARTICIPATIVO MUNICIPAL.		20% CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE ELABORAÇÃO DAS ETAPAS DO PLANO	
AUGUSTO CORRÊA (Demanda Espontânea)	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	- FIRMADO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 10/2021 ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E SEDOP; - REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA REUNIÃO TÉCNICA COM OS SECRETÁRIOS, COM OBJETIVO DE COLETAR INFORMAÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO.		10% FASE INICIAL DE ELABORAÇÃO	

Com relação à execução financeira, da dotação inicial de R\$ 43.782,00² para atender a Região Rio Caeté durante o ano de 2021, houve movimentação financeira no valor de R\$ 2.373,80³ referente ao pagamento de diárias aos técnicos responsáveis pelo desenvolvimento da ação.

Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico na Região Rio Caeté no exercício de 2021, foi Abaixo do Esperado. No entanto, vale ressaltar que, a obtenção do produto desta ação, bem como o alcance da meta física estabelecida não está totalmente na governabilidade da SEDOP. Os municípios contemplados têm grande influência para que o desempenho da referida ação seja conforme o programado.

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

³ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO RIO CAPIM					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: BUJARU, CAPITÃO POÇO, CONCÓRDIA DO PARÁ, MÃE DO RIO, RONDON DO PARÁ, ULIANÓPOLIS.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2021	6 INSTRUMENTOS ELABORADOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021

Em 2021, na Região Rio Capim, o apoio técnico em ações de investimento em instrumentos de saneamento básico foi planejado para atender os municípios de Bujaru, Capitão Poço, Concórdia do Pará, Mãe do Rio, Rondon do Pará e Ulianópolis. No que diz respeito aos municípios de Bujaru, Capitão Poço, e Mãe do Rio, não houve demanda de saneamento no ano de 2021.

Com relação aos municípios de Concórdia do Pará e Tomé-Açu, cujo instrumento é a Formalização do Consórcio CIGERS (Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de resíduos Sólidos), não houve o avanço esperado permanecendo o mesmo percentual de execução obtido durante o ano de 2020. Quanto aos demais municípios, a tabela abaixo sintetiza as principais atividades desenvolvidas no decorrer do ano de 2021:

MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
RONDON DO PARÁ (Vinculado ao CAF)	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	- APOIO TÉCNICO NA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS; - CAPACITAÇÕES E ORIENTAÇÕES AOS TÉCNICOS MUNICIPAIS; - ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTES A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	70% DAS ATIVIDADES REALIZADAS
RONDON DO PARÁ (Vinculado ao CAF)	PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO	- FORMAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO; - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL; -LEVANTAMENTOS PRELIMINARES PARA FORMULAÇÃO DO DIAGNÓSTICO TÉCNICO PARTICIPATIVO MUNICIPAL.	10% FASE INICIAL DE ELABORAÇÃO
ULIANÓPOLIS	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (CONVÊNIO FUNASA)	- ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – EXECUTADOS TODOS OS PRODUTOS.	100% DOS PRODUTOS DA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO FORAM EXECUTADOS E ENTREGUES PELA EMPRESA CONTRATADA.

Com relação à execução financeira, da dotação inicial de R\$ 131.346,00² para atender a Região Rio Capim durante o ano de 2021, houve a necessidade de atualizar o valor programado para R\$ 147.448,06³ de modo a garantir, principalmente, o desenvolvimento da ação no município de Ulianópolis.

Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* na Região Rio Capim no exercício de 2021, foi *Abaixo do Esperado*. No entanto, vale ressaltar que, a obtenção do produto desta ação, bem como o alcance da meta física estabelecida não está totalmente na governabilidade da SEDOP. Os municípios contemplados têm grande influência para que o desempenho da referida ação seja conforme o programado.

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

³ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO TOCANTINS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ACARÁ, BAIÃO, CAMETÁ, MOJU, OEIRAS DO PARÁ.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2021	5 INSTRUMENTOS ELABORADOS
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Em 2021, na Região Tocantins, o apoio técnico em ações de investimento em instrumentos de saneamento básico foi planejado para atender os municípios de Acará, Baião, Cametá, Moju e Oeiras Do Pará. No que diz respeito aos municípios de Acará, Baião, Moju e Oeiras Do Pará, não houve demanda de saneamento no ano de 2021. Com relação ao município de Cametá, a tabela abaixo sintetiza as principais atividades desenvolvidas no decorrer do ano de 2021:					
MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS		% EXECUTADO ¹	
CAMETÁ	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	- ORIENTAÇÃO TÉCNICA DURANTE AS FASES DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO; - APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 06/2021. - FORMAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO COM DECRETO MUNICIPAL DEFININDO OS INTEGRANTES; - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL; - LEVANTAMENTOS PARA FINALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO TÉCNICO PARTICIPATIVO MUNICIPAL.		10% INÍCIO DAS ORIENTAÇÕES E APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA DE TRABALHO.	
Com relação à execução financeira, da dotação inicial de R\$ 131.258,00² para atender a Região Tocantins durante o ano de 2021, houve movimentação financeira no valor de R\$ 1.403,90³ referente ao pagamento de diárias aos técnicos responsáveis pelo desenvolvimento da ação. Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico na Região Tocantins no exercício de 2021, foi <i>Abaixo do Esperado</i>. No entanto, vale ressaltar que, a obtenção do produto desta ação, bem como o alcance da meta física estabelecida não está totalmente na governabilidade da SEDOP. Os municípios contemplados têm grande influência para que o desempenho da referida ação seja conforme o programado.					

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

³ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO XINGU					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ALTAMIRA, BRASIL NOVO.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2021	2 INSTRUMENTOS ELABORADOS
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Em 2021, na Região Xingu, o apoio técnico em ações de investimento em instrumentos de saneamento básico foi planejado para atender os municípios de Altamira e Brasil Novo. No que diz respeito ao município de Altamira, não houve demanda de saneamento no ano de 2021.					
Com relação ao município de Brasil Novo, a tabela abaixo sintetiza as principais atividades desenvolvidas no decorrer do ano de 2021:					
MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS		% EXECUTADO ¹	
BRASIL NOVO (Vinculado ao CAF)	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	- ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS; - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES ESTRUTURAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM;		50% DAS ATIVIDADES REALIZADAS	
BRASIL NOVO (Vinculado ao CAF)	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	- FORMAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO; - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL; -LEVANTAMENTOS PRELIMINARES PARA FORMULAÇÃO DO DIAGNÓSTICO TÉCNICO PARTICIPATIVO MUNICIPAL.		10% FASE INICIAL DE ELABORAÇÃO	

Com relação à execução financeira, embora a ação tenha recebido um aporte orçamentário de R\$ 43.675,00² para o desenvolvimento desta ação na Região Xingu durante o ano de 2021, foram executados R\$ 272.557,67 além do valor programado. Esta situação ocorreu devido a uma execução orçamentária na natureza de despesa 449051- Obras e Instalações, a qual não é prevista nesta ação para a aplicação dos recursos. Trata-se da obra “Construção de 01 (Um) Galpão de Triagem para Resíduos Sólidos, Inclusive Projetos” financiada com recursos oriundos da Confederação Andina de Fomento – CAF, a qual deveria ter sido empenhada e paga na Ação 7644. Implantação de Aterros Sanitários.

Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico na Região Xingu no exercício de 2021, foi Abaixo do Esperado. No entanto, vale ressaltar que, a obtenção do produto desta ação, bem como o alcance da meta física estabelecida não está totalmente na governabilidade da SEDOP. Os municípios contemplados têm grande influência para que o desempenho da referida ação seja conforme o programado.

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

6.1.9. Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento

REGIÃO ARAGUAIA					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: BANNACH, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PAU D'ARCO, REDENÇÃO.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2021	4 INSTRUMENTOS ELABORADOS
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Com o objetivo de subsidiar tecnicamente os municípios na elaboração e revisão dos Planos Diretores, Planos de Mobilidade, Lei de Perímetro Urbano, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei de Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária, a SEDOP desenvolve a <i>Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano</i> simultaneamente em várias Regiões de Integração. Em 2021, na Região Araguaia, a SEDOP planejou atender os municípios de Bannach, Conceição do Araguaia, Pau D'arco e Redenção. No que diz respeito aos municípios de Bannach, Conceição do Araguaia e Pau D'arco, não houve demanda relacionada à instrumentos de Desenvolvimento Urbano. Com relação aos instrumentos iniciados no município de Redenção (Plano de Mobilidade Urbana e Revisão do Plano Diretor), no ano de 2021, não houve o avanço esperado permanecendo os mesmos percentuais de execução obtidos durante o ano de 2020. Com relação ao município de São Félix do Xingu, o mesmo não foi contemplado na programação do ano de 2021, devido ao cenário favorável para finalização do instrumento em 2020 no momento da elaboração do orçamento da Sedop para o ano de 2021, situação esta que não se concretizou. Desta forma, objetivando a finalização dos instrumentos no município de São Felix do Xingu, o mesmo teve atividades desenvolvidas em 2021. Para melhor entendimento do desempenho da <i>Ação 8692. Apoio à Implementação da Política Estadual de Saneamento Básico</i> na Região Araguaia, em 2021, a tabela abaixo sintetiza as principais atividades desenvolvidas, bem como, produtos obtidos:					
MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS		% EXECUTADO ¹	
SÃO FÉLIX DO XINGU	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- MINUTA DA LEI ENCAMINHADA PARA APROVAÇÃO NA CÂMARA DOS VEREADORES.		100% DOS PRODUTOS DA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA.	
	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	- REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL PARTICIPATIVO EM FASE DE FINALIZAÇÃO..		80% DOS PRODUTOS REALIZADOS	
	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	- FIRMADO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 11/2021 ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E SEDOP; - ATIVIDADES SENDO EXECUTADAS CONFORME PLANO DE TRABALHO.		30% DOS PRODUTOS REALIZADOS	

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

Com relação à execução financeira, da dotação inicial de R\$ 97.416,00¹ para atender a Região Tocantins durante o ano de 2021, houve movimentação financeira no valor de R\$ 5.341,05² referente ao pagamento de diárias aos técnicos responsáveis pelo desenvolvimento da ação.

Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* na Região Araguaia no exercício de 2021, foi *Abaixo do Esperado*. No entanto, vale ressaltar que, a obtenção do produto desta ação, bem como o alcance da meta física estabelecida não está totalmente na governabilidade da SEDOP. Os municípios contemplados têm grande influência para que o desempenho da referida ação seja conforme o programado.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO BAIXO AMAZONAS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: CURUÁ, MONTE ALEGRE, ÓBIDOS, ORIXIMINÁ, SANTARÉM.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2021	5 INSTRUMENTOS ELABORADOS
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Com o objetivo de subsidiar tecnicamente os municípios na elaboração e revisão dos Planos Diretores, Planos de Mobilidade, Lei de Perímetro Urbano, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei de Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária, a SEDOP desenvolve a <i>Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano</i> simultaneamente em várias Regiões de Integração. Em 2021, na Região Baixo Amazonas, a SEDOP planejou atender os municípios de Curuá, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Santarém. No que diz respeito ao município de Santarém, o mesmo é contemplado nesta ação por se tratar de um município polo, funcionando como via de transbordo para as viagens destinadas aos municípios da Região Baixo Amazonas. Quanto ao município de Monte Alegre, não houve demanda relacionada à instrumentos de Desenvolvimento Urbano e no município de Oriximiná (regularização Fundiária), no ano de 2021, não houve o avanço esperado permanecendo os mesmos percentuais de execução obtidos durante o ano de 2020. Quanto aos demais municípios, a tabela abaixo sintetiza as principais atividades desenvolvidas no decorrer do ano de 2021, tanto nos municípios programados, quanto nos municípios atendidos através de demanda espontânea:					
MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS		% EXECUTADO ¹	
ALMEIRIM (Demanda Espontânea)	ELABORAÇÃO PLANO DIRETOR	- ORIENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS ETAPAS TÉCNICAS DESTINADAS A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL.		10% FASE INICIAL DE ELABORAÇÃO	
	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- ORIENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS ETAPAS TÉCNICAS DESTINADAS A ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO.		10% FASE INICIAL DE ELABORAÇÃO	
BELTERRA (Demanda Espontânea)	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO	- INICIADA AÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA MUNICIPAL; - INICIADO A AÇÃO PARA CRIAÇÃO DO CADASTRO DAS FAMÍLIAS QUE SERÃO BENEFICIADAS COM A TITULAÇÃO.		10% FASE INICIAL DE ELABORAÇÃO	
CURUÁ	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- FINALIZADA A PRIMEIRA ETAPA TÉCNICA; - REALIZAÇÃO DE REUNIÕES TÉCNICAS; - ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS DO INVENTÁRIO PRELIMINAR; - ELABORAÇÃO DE MAPAS TEMÁTICOS E RELATÓRIOS VIÁRIOS.		50% DO MATERIAL ELABORADO PARA DIAGNÓSTICO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA.	
JURUTI (Demanda Espontânea)	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- REALIZADA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO PARA FINALIZAÇÃO DAS ETAPAS DE OFICINAS, AUDIÊNCIAS E PREPARAÇÃO DA MINUTA DO PROJETO DE LEI.		100% DOS PRODUTOS REALIZADOS	
MOJÚÍ DOS CAMPOS (Demanda Espontânea)	ELABORAÇÃO PLANO DIRETOR	- FIRMADO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 014/2021 ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E SEDOP; - ATIVIDADES SENDO EXECUTADAS CONFORME PLANO DE TRABALHO.		20% DOS PRODUTOS REALIZADOS	

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
ÓBIDOS	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- FINALIZADO A PRIMEIRA ETAPA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.	40% DOS PRODUTOS REALIZADOS
	LEGISLAÇÕES URBANÍSTICAS (Implementação e revisão)	- FIRMADO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 23/2021 ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E SEDOP; - ENTREGA DE MATERIAL REFERENTE A ELABORAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO (CTM).	20% DOS PRODUTOS REALIZADOS

Com relação à execução financeira, da dotação inicial de R\$ 121.294,00² para atender a Região Baixo Amazonas durante o ano de 2021, houve movimentação financeira no valor de R\$ 4.635,46³ referente ao pagamento de diárias aos técnicos responsáveis pelo desenvolvimento da ação.

Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* na Região Baixo Amazonas no exercício de 2021, foi *Abaixo do Esperado*. No entanto, vale ressaltar que, a obtenção do produto desta ação, bem como o alcance da meta física estabelecida não está totalmente na governabilidade da SEDOP. Os municípios contemplados têm grande influência para que o desempenho da referida ação seja conforme o programado.

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

³ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO CARAJÁS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ELDORADO DOS CARAJÁS, MARABÁ, PARAUAPEBAS, SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2021	4 INSTRUMENTOS ELABORADOS
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Com o objetivo de subsidiar tecnicamente os municípios na elaboração e revisão dos Planos Diretores, Planos de Mobilidade, Lei de Perímetro Urbano, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei de Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária, a SEDOP desenvolve a <i>Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano</i> simultaneamente em várias Regiões de Integração. Em 2021, na Região Carajás, a SEDOP planejou atender os municípios de Eldorado dos Carajás, Marabá, Parauapebas e São Domingos do Araguaia. Com relação ao município de Marabá, não há ações desenvolvidas. O mesmo atua como município polo, por tratar-se de uma via de transbordo para as viagens destinadas aos municípios vizinhos. Quanto ao município de Parauapebas, as ações que estavam sendo desenvolvidas e acompanhadas desde 2018 foram suspensas e até o presente momento, não houve posicionamento da gestão municipal em formalizar a continuidade das ações. Quanto aos demais municípios, a tabela abaixo sintetiza as principais atividades desenvolvidas no decorrer do ano de 2021:					
MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS			% EXECUTADO ¹
ELDORADO DOS CARAJÁS	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- REALIZADA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO PARA FINALIZAÇÃO DAS ETAPAS DE OFICINAS, AUDIÊNCIAS E PREPARAÇÃO DA MINUTA DO PROJETO DE LEI.			100% DOS PRODUTOS REALIZADOS
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ELABORAÇÃO PLANO DIRETOR	- FIRMADO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 19/2021 ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E SEDOP; - REALIZADA 1ª VISITA TÉCNICA PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A 1ª ETAPA (ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS, CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO PRELIMINAR).			10% FASE INICIAL DE ELABORAÇÃO
	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- FIRMADO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 18/2021 ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E SEDOP; - REALIZADA 1ª VISITA TÉCNICA PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A 1ª ETAPA (ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS, CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO PRELIMINAR).			10% FASE INICIAL DE ELABORAÇÃO
Com relação à execução financeira, do orçamento programado de R\$ 97.416,00², houve movimentação financeira de cerca de R\$ 8.901,75³ do valor total, referente a despesas de custeio (diárias). Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da <i>Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano</i> na Região Carajás no exercício de 2021, foi <i>Abaixo do Esperado</i>. No entanto, vale ressaltar que, a obtenção do produto desta ação, bem como o alcance da meta					

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO - NOVEMBRO/2021.

³ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO - NOVEMBRO/2021

física estabelecida não está totalmente na governabilidade da SEDOP. Os municípios contemplados têm grande influência para que o desempenho da referida ação seja conforme o programado.

REGIÃO GUAJARÁ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: BENEVIDES					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2021	NÃO HOUVE PREVISÃO DE PARA O ANO DE 2021
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Com o objetivo de subsidiar tecnicamente os municípios na elaboração e revisão dos Planos Diretores, Planos de Mobilidade, Lei de Perímetro Urbano, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei de Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária, a SEDOP desenvolve a <i>Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano</i> simultaneamente em várias Regiões de Integração. Embora para o ano de 2021, a SEDOP não tenha considerado a Região Guajará para o desenvolvimento da <i>Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano</i>, houve solicitação do município de Benevides à Sedop para apoio técnico à elaboração do Plano de Mobilidade Urbana. Para melhor entendimento, a tabela abaixo sintetiza as principais atividades desenvolvidas no município no ano de 2021:					
MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS			% EXECUTADO ¹
BENEVIDES	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- FIRMADO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 03/2021 ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E SEDOP; - ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E DAS PEÇAS TÉCNICAS DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA; - ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DO INVENTÁRIO PRELIMINAR.			80% DOS PRODUTOS REALIZADOS
Com relação à execução financeira, como a Região Guajará e, conseqüentemente, o referido município, não foi contemplado nos instrumentos de planejamento da Sedop para o ano de 2021, não houve previsão orçamentária para essa região. No entanto, para atender a demanda espontânea do município, houve movimentação financeira de cerca de R\$ 1.002,32², referente a despesas de custeio (diárias). Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da <i>Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano</i> na Região Guajará no exercício de 2021, foi <i>Abaixo do Esperado</i>. No entanto, vale ressaltar que, a obtenção do produto desta ação, bem como o alcance da meta física estabelecida não está totalmente na governabilidade da SEDOP. Os municípios contemplados têm grande influência para que o desempenho da referida ação seja conforme o programado.					

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO - NOVEMBRO/2021

REGIÃO GUAMÁ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: CASTANHAL, CURUÇÁ, IGARAPÉ-AÇU, INHANGAPI, MARACANÃ, MARAPANIM, SANTA IZABEL DO PARÁ, SÃO DOMINGOS DO CAPIM, SÃO FRANCISCO DO PARÁ, SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, VIGIA.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2021	11 INSTRUMENTOS ELABORADOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021

Com o objetivo de subsidiar tecnicamente os municípios na elaboração e revisão dos Planos Diretores, Planos de Mobilidade, Lei de Perímetro Urbano, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei de Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária, a SEDOP desenvolve a *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* simultaneamente em várias Regiões de Integração.

Em 2021, na Região Guamá, a SEDOP planejou atender os municípios de Castanhall, Curuçá, Igarapé-Açu, Inhangapi, Maracanã, Marapanim, Santa Izabel do Pará, São Domingos do Capim, São Francisco do Pará, São Miguel do Guamá e Vigia. Com relação ao município de Castanhall, no ano de 2021, não houve o avanço esperado permanecendo os mesmos percentuais de execução obtidos durante o ano de 2020.

Quanto aos municípios de Curuçá, Igarapé-Açu, Inhangapi, Maracanã, Santa Izabel do Pará, São Francisco do Pará, São Miguel do Guamá e Vigia, não houve demanda relacionada à instrumentos de Desenvolvimento Urbano no ano de 2021.

Quanto aos demais municípios, a tabela abaixo sintetiza as principais atividades desenvolvidas no decorrer do ano de 2021, tanto nos municípios programados, quanto nos municípios atendidos através de demanda espontânea:

MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
MARAPANIM	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- AÇÕES REFERENTES AO CONVÊNIO Nº 28/2019 ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E SEDOP; - ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS E DOCUMENTOS PARA CONCEPÇÃO DO PLANO.	30% DOS PRODUTOS REALIZADOS
	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	- REVISÃO DO PLANO DIRETOR FINALIZADA; - MINUTA DA LEI ENCAMINHADA PARA APROVAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL.	100% DOS PRODUTOS REALIZADOS
MAGALHÃES BARATA (Demanda Espontânea)	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	- FIRMADO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 23/2021 ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E SEDOP; - REALIZAÇÃO DE REUNIÃO TÉCNICA PARA APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA; - INICIADAS AS ATIVIDADES NO MUNICÍPIO.	10% FASE INICIAL DE ELABORAÇÃO
SÃO CAETANO DE ODIVELAS (Demanda Espontânea)	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	- FIRMADO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 12/2021 ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E SEDOP; - ORIENTAÇÃO PARA OS TÉCNICOS MUNICIPAIS; - REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS E OFICINAS TEMÁTICAS.	30% DOS PRODUTOS REALIZADOS
	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS E DOCUMENTOS PARA CONCEPÇÃO DO PLANO. - ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, QUESTIONÁRIOS E RELATÓRIOS VIÁRIOS.	20% DOS PRODUTOS REALIZADOS

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
SÃO DOMINGOS DO CAPIM	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E RELATÓRIOS VIÁRIOS.	25% DOS PRODUTOS REALIZADOS
	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	- ORIENTAÇÃO AOS TÉCNICOS MUNICIPAIS PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS E OFICINAS TEMÁTICAS.	45% DOS PRODUTOS REALIZADOS

Com relação à execução financeira, da dotação inicial de R\$ 267.894,00² para atender a Região Guamá durante o ano de 2021, houve movimentação financeira de cerca de R\$ 6.000,45³ referente a despesas de custeio (diárias).

Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* na Região Guamá no exercício de 2021, foi *Abaixo do Esperado*. No entanto, vale ressaltar que, a obtenção do produto desta ação, bem como o alcance da meta física estabelecida não está totalmente na governabilidade da SEDOP. Os municípios contemplados têm grande influência para que o desempenho da referida ação seja conforme o programado.

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

³ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO - NOVEMBRO/2021.

REGIÃO LAGO DE TUCURUÍ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: JACUNDÁ.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2021	1 INSTRUMENTO ELABORADO
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Com o objetivo de subsidiar tecnicamente os municípios na elaboração e revisão dos Planos Diretores, Planos de Mobilidade, Lei de Perímetro Urbano, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei de Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária, a SEDOP desenvolve a <i>Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano</i> simultaneamente em várias Regiões de Integração. Em 2021, na Região Lago de Tucuruí, a SEDOP planejou atender o município de Jacundá no apoio técnico para a elaboração de instrumentos urbanos, no entanto, não houve demandas de mobilidade urbana e instrumentos urbanísticos para o município. A região foi atendida pela <i>Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano</i> através da continuidade das ações do Termo de Cooperação nº 07/2019 celebrado entre Prefeitura Municipal de Breu Branco e Sedop, conforme apresentado na tabela abaixo:					
MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS		% EXECUTADO ¹	
BREU BRANCO	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- ORIENTAÇÕES PARA FINALIZAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS.		70% DOS PRODUTOS REALIZADOS	
	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	- ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS TEMÁTICAS, SEMINÁRIOS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. - ORIENTAÇÕES OARA O GRUPO DE TRABALHO QUANTO A ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ATUAL.		60% DOS PRODUTOS DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL.	
Com relação à execução financeira, da dotação inicial de R\$ 24.354,00² para atender a Região Lago de Tucuruí durante o ano de 2021, houve movimentação financeira de cerca de R\$ 2.492,49³ referente a despesas de custeio (diárias). Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da <i>Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano</i> na Região Lago de Tucuruí no exercício de 2021, foi Abaixo do Esperado. No entanto, vale ressaltar que, a obtenção do produto desta ação, bem como o alcance da meta física estabelecida não está totalmente na governabilidade da SEDOP. Os municípios contemplados têm grande influência para que o desempenho da referida ação seja conforme o programado.					

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

³ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO - NOVEMBRO/2021.

REGIÃO MARAJÓ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ANAJÁS, BREVES, PONTA DE PEDRAS, PORTEL, SALVATERRA, SANTA CRUZ DO ARARI, SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2021	7 INSTRUMENTOS ELABORADOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021

Com o objetivo de subsidiar tecnicamente os municípios na elaboração e revisão dos Planos Diretores, Planos de Mobilidade, Lei de Perímetro Urbano, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei de Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária, a SEDOP desenvolve a *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* simultaneamente em várias Regiões de Integração.

Em 2021, na Região Marajó, a SEDOP planejou atender os municípios de Anajás, Breves, Ponta de Pedras, Portel, Salvaterra, Santa Cruz do Arari e São Sebastião da Boa Vista. No que diz respeito aos municípios Anajás, Breves, Portel, Salvaterra, Santa Cruz do Arari e São Sebastião da Boa Vista, não houve demanda relacionada à instrumentos de Desenvolvimento Urbano no ano de 2021.

Quanto aos demais municípios, a tabela abaixo sintetiza as principais atividades desenvolvidas no decorrer do ano de 2021, tanto nos municípios programados, quanto nos municípios atendidos através de demanda espontânea:

MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
AFUÁ (Demanda Espontânea)	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- FIRMADO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 08/2021 ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E SEDOP; - REALIZAÇÃO DE REUNIÃO TÉCNICA PARA APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA; - INICIADAS AS ATIVIDADES NO MUNICÍPIO.	20% DOS PRODUTOS REALIZADOS
MUANÁ (Demanda Espontânea)	LEGISLAÇÕES URBANÍSTICAS (Implementação e revisão)	- FIRMADO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 22/2021 ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E SEDOP; - INICIADAS AS ATIVIDADES NO MUNICÍPIO.	10% FASE INICIAL DE ELABORAÇÃO
PONTA DE PEDRAS	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- EM FASE DE ESTRUTURAÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO E ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E QUESTIONÁRIOS.	30% DOS PRODUTOS REALIZADOS

Com relação à execução financeira, da dotação inicial de R\$ 169.050,00² para atender a Região Marajó durante o ano de 2021, houve movimentação financeira de cerca de R\$ 3.204,63³ referente a despesas de custeio (diárias).

Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* na Região Marajó no exercício de 2021, foi *Abaixo do Esperado*. No entanto, vale ressaltar que, a obtenção do produto desta ação, bem como o alcance da meta física estabelecida não está totalmente na governabilidade da SEDOP. Os municípios contemplados têm grande influência para que o desempenho da referida ação seja conforme o programado.

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

³ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO - NOVEMBRO/2021.

REGIÃO RIO CAETÉ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: AUGUSTO CORRÊA, SÃO JOÃO DE PIRABAS, TRACUATEUA.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2021	3 INSTRUMENTOS ELABORADOS
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Com o objetivo de subsidiar tecnicamente os municípios na elaboração e revisão dos Planos Diretores, Planos de Mobilidade, Lei de Perímetro Urbano, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei de Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária, a SEDOP desenvolve a <i>Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano</i> simultaneamente em várias Regiões de Integração. Em 2021, na Região Rio Caeté, a SEDOP planejou atender os municípios de Augusto Corrêa, São João de Pirabas e Tracuateua. Com relação ao município de Augusto Corrêa, no ano de 2021, não houve o avanço esperado permanecendo os mesmos percentuais de execução obtidos durante o ano de 2020 e no que diz respeito aos municípios São João de Pirabas e Tracuateua, não houve demanda relacionada à instrumentos de Desenvolvimento Urbano no ano de 2021. Entretanto, a <i>Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano</i> pôde ser desenvolvida na Região Caeté através de demanda espontânea, conforme pode ser verificado na tabela abaixo:					
MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS		% EXECUTADO¹	
CAPANEMA	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- ORIENTAÇÕES À EQUIPE TÉCNICA DO MUNICÍPIO PARA FINALIZAÇÃO DA 2ª ETAPA DE ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO.		40% DOS PRODUTOS REALIZADOS	
Com relação à execução financeira, do orçamento programado de R\$ 72.586,00², não houve movimentação financeira no ano de 2021 uma vez que os técnicos da Sedop realizaram o apoio técnico ao município através de reuniões virtuais o que, consequentemente, não gerou dispêndios financeiros. Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da <i>Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano</i> na Região Caeté no exercício de 2021, foi <i>Abaixo do Esperado</i>. No entanto, vale ressaltar que, a obtenção do produto desta ação, bem como o alcance da meta física estabelecida não está totalmente na governabilidade da SEDOP. Os municípios contemplados têm grande influência para que o desempenho da referida ação seja conforme o programado.					

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO - 04/12/2020.

REGIÃO RIO CAPIM					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: BUJARU, CAPITÃO POÇO, MÃE DO RIO, TOMÉ - AÇU, ULIANÓPOLIS.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2021	5 INSTRUMENTOS ELABORADOS
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Com o objetivo de subsidiar tecnicamente os municípios na elaboração e revisão dos Planos Diretores, Planos de Mobilidade, Lei de Perímetro Urbano, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei de Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária, a SEDOP desenvolve a Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano simultaneamente em várias Regiões de Integração. Em 2021, na Região Rio Capim, a SEDOP planejou atender os municípios de Bujaru, Capitão Poço, Mãe do Rio, Tomé – Açú e Ulianópolis. Com relação aos municípios de Tomé – Açú e Ulianópolis, no ano de 2021, não houve o avanço esperado permanecendo os mesmos percentuais de execução obtidos durante o ano de 2020 e no que diz respeito ao município de Mãe do Rio, não houve demanda relacionada à instrumentos de Desenvolvimento Urbano no ano de 2021. Quanto aos demais municípios, a tabela abaixo sintetiza as principais atividades desenvolvidas no decorrer do ano de 2021, nos municípios programados:					
MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS		% EXECUTADO¹	
BUJARU	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, PEÇAS TÉCNICAS E INVENTÁRIO PRELIMINAR.		30% DOS PRODUTOS REALIZADOS	
	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	- REVISÃO DO PLANO DIRETOR FINALIZADA; - MINUTA DA LEI ENCAMINHADA PARA APROVAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL.		100% DOS PRODUTOS REALIZADOS	
CAPITÃO POÇO	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- FIRMADO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 15/2021 ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E SEDOP; - INICIADAS AS ATIVIDADES NO MUNICÍPIO CONFORME CRONOGRAMA; - REALIZAÇÃO DE OFICINAS; - ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO PRELIMINAR;		40% DOS PRODUTOS REALIZADOS	
Com relação à execução financeira, da dotação inicial de R\$ 121.294,00² para atender a Região Marajó durante o ano de 2021, houve movimentação financeira de cerca de R\$ 7.121,40³ referente a despesas de custeio (diárias). Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano na Região Rio Capim no exercício de 2021, foi Abaixo do Esperado. No entanto, vale ressaltar que, a obtenção do produto desta ação, bem como o alcance da meta física estabelecida não está totalmente na governabilidade da SEDOP. Os municípios contemplados têm grande influência para que o desempenho da referida ação seja conforme o programado.					

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

³ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO - NOVEMBRO/2021.

REGIÃO TAPAJÓS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ITAITUBA.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2021	1 INSTRUMENTO ELABORADO
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Em 2021, na Região Tapajós, o apoio técnico em ações de investimento em instrumentos de desenvolvimento urbano foi planejado para atender os municípios de Itaituba. Entretanto, não houve demanda de ações de mobilidade urbana e instrumentos urbanísticos no ano de 2021 para o referido município. Sendo assim, considerando que não houve desempenho físico e nem financeiro da Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano na Região Tapajós no exercício de 2021, o desenvolvimento da mesma foi Abaixo do Esperado.					

REGIÃO TOCANTINS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ACARÁ, CAMETÁ, IGARAPÉ-MIRI, MOJU, OEIRAS DO PARÁ, TAILÂNDIA.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2021	5 INSTRUMENTOS ELABORADOS
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Com o objetivo de subsidiar tecnicamente os municípios na elaboração e revisão dos Planos Diretores, Planos de Mobilidade, Lei de Perímetro Urbano, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei de Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária, a SEDOP desenvolve a <i>Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano</i> simultaneamente em várias Regiões de Integração. Em 2021, na Região Tocantins, a SEDOP planejou atender os municípios de: Acará, Cametá, Igarapé-Miri, Moju, Oeiras do Pará e Tailândia. Quanto ao município de Acará, em 2021 houve descontinuidade no processo por conta de problemas político-administrativos, os quais acabaram por intervir no desenvolvimento das atividades, mantendo-se o mesmo status do ano de 2020. No que diz respeito aos municípios de Igarapé-Miri, Moju e Tailândia, não houve demanda relacionada à instrumentos de Desenvolvimento Urbano no ano de 2021. Quanto aos demais municípios, a tabela abaixo sintetiza as principais atividades desenvolvidas no decorrer do ano de 2021, tanto nos municípios programados, quanto nos municípios atendidos através de demanda espontânea:					
MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS		% EXECUTADO ¹	
BAIÃO (Demanda Espontânea)	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- CONTINUIDADE DAS AÇÕES REFERENTES AO CONVÊNIO Nº 44/2018: - ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, INTERVENÇÕES E ELABORAÇÃO DA MINUTA DO PROJETO DE LEI DA MOBILIDADE.		75% DOS PRODUTOS REALIZADOS	
CAMETÁ	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- EM FASE DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS.		30% DOS PRODUTOS REALIZADOS	
	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	- ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA REVISÃO DO PDM.		40% DOS PRODUTOS REALIZADOS	
OEIRAS DO PARÁ	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- REALIZAÇÃO DE REUNIÃO TÉCNICA OBJETIVANDO COLETAR INFORMAÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL DO MUNICÍPIO; - ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.		20% DOS PRODUTOS REALIZADOS	
	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	- ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DAS ÚLTIMAS ETAPAS DE REVISÃO; - ELABORAÇÃO DA MATRIZ DE DIAGNÓSTICO; - ELABORAÇÃO DA MINUTA DA LEI COMPLEMENTAR.		30% DOS PRODUTOS REALIZADOS	

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

Com relação à execução financeira, da dotação inicial de R\$ 145.708,00¹ para atender a Região Marajó durante o ano de 2021, houve movimentação financeira de cerca de R\$ 3.442,01² referente a despesas de custeio (diárias).

Finalizando, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* na Região Tocantins no exercício de 2021, foi *Abaixo do Esperado*. No entanto, vale ressaltar que, a obtenção do produto desta ação, bem como o alcance da meta física estabelecida não está totalmente na governabilidade da SEDOP. Os municípios contemplados têm grande influência para que o desempenho da referida ação seja conforme o programado.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO - NOVEMBRO/2021.

REGIÃO XINGU					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ALTAMIRA, BRASIL NOVO.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2021	1 INSTRUMENTO ELABORADO
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Em 2021, na Região Tapajós, o apoio técnico em ações de investimento em instrumentos de desenvolvimento urbano foi planejado para atender os municípios de Itaituba. Entretanto, não houve demanda de ações de mobilidade urbana e instrumentos urbanísticos no ano de 2021 para o referido município. Sendo assim, considerando que não houve desempenho físico e nem financeiro da <i>Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano</i> na Região Tapajós no exercício de 2021, o desenvolvimento da mesma foi <i>Abaixo do Esperado</i>.					

6.2. PROGRAMA 1498:
INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO

AÇÃO GOVERNAMENTAL:

7658. IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS

6.2.1. Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos

REGIÃO RIO CAETÉ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: BRAGANÇA, SALINÓPOLIS.					
PRODUTO	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2021	2 EQUIPAMENTOS IMPLANTADOS
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Em 2021, a <i>Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos</i> foi programada para ser desenvolvida na Região Rio Caeté através dos municípios de Bragança e Salinópolis. Com relação ao município de Bragança, as tratativas para implementação da <i>Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos</i> que não avançaram no ano de 2020, em 2021, consolidaram - se na celebração de dois Convênios de Cooperação Técnica entre Sedop e Prefeitura Municipal. Quanto ao município de Salinópolis, além da continuidade da obra de Requalificação da Orla do Atalaia, foram desenvolvidas mais duas obras no município. A tabela a seguir, apresenta de maneira sintetizada o desempenho da <i>Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos</i> na Região Caeté no decorrer do ano de 2021.					
MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA			SITUAÇÃO ATUAL	
BRAGANÇA	CONVÊNIO Nº 04/2021 (SEDOP/PREFEITURA) OBJETO: URBANIZAÇÃO DA ORLA DO CAETÉ – TRECHO I			- AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSO; - INÍCIO DE OBRA PREVISTO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.	
BRAGANÇA	CONVÊNIO Nº 12/2021 (SEDOP/PREFEITURA) OBJETO: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DE AJURUTEUA – ETAPA I			- AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSO; - INÍCIO DE OBRA PREVISTO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.	
SALINÓPOLIS	REQUALIFICAÇÃO DA ORLA DO ATALAIA: - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO; - URBANIZAÇÃO.			- <u>SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</u> : CONCLUÍDO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021, O SISTEMA BENEFICIA CERCA DE 80 FAMÍLIAS QUE TRABALHAM NAS BARRACAS LOCALIZADAS NA PRAIA DO ATALAIA; - <u>SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</u> : INICIADO EM 2020, FOI CONCLUÍDO CERCA DE 90% DA LINHA DE RECALQUE. NO ENTANTO, PARA MELHOR FUNCIONALIDADE DO SISTEMA, HOUVE NECESSIDADE DE REVISAR O PROJETO ADEQUANDO-O A NOVA CONCEPÇÃO. O SISTEMA CONTARÁ COM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO INDIVIDUAIS PARA CADA BARRACA E COM UM RAMAL QUE VAI LEVAR O ESGOTO JÁ TRATADO PARA UMA REGIÃO DE DESCARGA APROVADA PELA SEMAS. OUTRO ASPECTO A SER DESTACADO É QUE A REDE COLETORA SERÁ APOIADA EM UMA PASSARELA DE MODO A INTEGRAR A PROPOSTA URBANÍSTICA. A OBRA TEM CONCLUSÃO PREVISTA PARA O 2º SEMESTRE DE 2022. - <u>URBANIZAÇÃO DA ORLA DO ATALAIA</u> : PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO ENTREGUES A SEDOP, ESTANDO EM FASE DE FINALIZAÇÃO O MATERIAL TÉCNICO PARA POSTERIOR INÍCIO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM PREVISÃO PARA O 1º SEMESTRE DE 2022.	

MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	SITUAÇÃO ATUAL
SALINÓPOLIS	CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO E URBANIZAÇÃO DA ORLA NA AVENIDA BEIRA MAR	APÓS ELABORAÇÃO DO ESTUDO AMBIENTAL EM 2020, NO INÍCIO DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021, A OBRA FOI INICIADA. ATUALMENTE SEGUE EM EXECUÇÃO EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. A OBRA TEM CONCLUSÃO PREVISTA PARA 2º SEMESTRE DE 2022.
SALINÓPOLIS	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO MAÇARICO - RUA JOÃO PESSOA, S/N.	LICITADA EM 2020, A OBRA FOI INICIADA NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021. ATUALMENTE SEGUE EM EXECUÇÃO EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. A OBRA TEM CONCLUSÃO PREVISTA PARA 2º SEMESTRE DE 2022.

No que diz respeito à execução financeira, do valor de R\$ 2.965.210,00¹ programado para atender a Região Rio Caeté, houve necessidade de majorar este valor em R\$ 9.601.273,65, totalizando a execução financeira desta ação no ano de 2021 em cerca de R\$ 12.566.483,65².

É necessário esclarecer que parte desta divergência *orçamento planejado X orçamento executado*, deve-se a limitação do Teto Orçamentário disponibilizado para a Sedop, o qual é insuficiente para a real necessidade de execução das obras programadas e, parte, ao atendimento de demandas que não constavam na programação orçamentária referente a execução de obras para o ano de 2021, elaborada pela área técnica.

Diante do exposto, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos* na Região Rio Caeté, no decorrer do ano de 2021, apresenta o status *Merece Atenção*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021

REGIÃO GUAMÁ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: CURUÇÁ E MARAPANIM.					
PRODUTO	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2021	NÃO FOI PREVISTO META PARA 2021
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Embora a Região Guamá não tenha sido contemplada para o desenvolvimento da <i>Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos</i>, em 2021, houve a conclusão da obra de “Revitalização da Orla” no município de Curuçá e a execução da obra de “Recuperação da Encosta, Urbanização e Drenagem de 236 metros da Orla da Vila de Marudazinho” no município de Marapanim. Quanto a obra no município de Curuçá, iniciada em dezembro de 2020, a finalização da referida obra serve como agente catalizador na promoção do turismo como atividade econômica para o município de Curuçá. O espaço foi projetado para garantir infraestrutura e lazer aos moradores e visitantes, proporcionando uma maior integração da população com o espaço e gerando melhor qualidade de vida e contou com a urbanização de 173 metros lineares, com serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem e urbanização, além da reforma de quadras poliesportivas. No que diz respeito a obra executada no município de Marapanim, embora tenha sido iniciada em 2020, várias condicionantes relacionadas a questões climáticas (fortes chuvas) e ambientais (erosão do leito do rio), impactaram diretamente no aumento dos serviços contratados, ocasionando o atraso do cronograma físico e financeiro da obra. Atualmente, a obra está sendo executada em conformidade com o cronograma estabelecido, com expectativa de conclusão para o primeiro semestre de 2022. Faz-se necessário esclarecer que os referidos municípios não entraram no planejamento orçamentário para o ano de 2021 devido não constarem na programação de obras previstas para o ano de 2021, no entanto, a Sedop por natureza institucional, é o órgão responsável por executar obras de interesse do Governo do Estado, estando ou não previstas nos instrumentos de planejamento da Secretaria. Com relação à execução financeira, como a referida região não estava prevista na <i>Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos</i> no momento da elaboração do orçamento para o ano de 2021, não houve previsão orçamentária para o ano de 2021. Entretanto, a execução das obras nos municípios de Curuçá e Marapanim gerou dispêndio financeiro na ordem de R\$ 1.134.627,12¹. Diante do exposto, o desempenho físico e financeiro da <i>Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos</i> na Região Guamá, no decorrer do ano de 2021, apresenta o status <i>Abaixo do Esperado</i>. Esclarecemos que a alimentação no sistema desta região no decorrer do ano de 2021 ficou desatualizada, sendo assim, informamos que para o encerramento do exercício de 2021, o sistema SigPlan- Monitoramento será devidamente atualizado, de modo a garantir a unidade da informação.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO MARAJÓ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: BAGRE E SALVATERRA.					
PRODUTO	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2021	NÃO FOI PREVISTO META PARA 2021
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Embora a Região Marajó não tenha sido contemplada para o desenvolvimento da <i>Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos</i>, em 2021, houve a execução da obra de “Construção da Orla do Balneário Praia da Costa” no município de Bagre e a execução da obra de “Urbanização da Orla Beira Mar da Praia Grande” no município de Salvaterra. Quanto a obra no município de Bagre “Construção da Orla do Balneário Praia da Costa”, trata-se de um Convênio de Cooperação Técnica com a Prefeitura Municipal, o qual estava paralisado sendo retomado no primeiro semestre 2021. Atualmente a execução da obra segue de acordo com o cronograma físico e financeiro da obra. No município de Salvaterra, a obra de “Urbanização da Orla Beira Mar da Praia Grande” foi iniciada no segundo semestre de 2021 e segue com a execução dos serviços em conformidade com o cronograma físico e financeiro da obra. Faz-se necessário esclarecer que os referidos municípios não entraram no planejamento orçamentário para o ano de 2021 devido não constarem na programação de obras previstas para o ano de 2021, no entanto, a Sedop por natureza institucional, é o órgão responsável por executar obras de interesse do Governo do Estado, estando ou não previstas nos instrumentos de planejamento da Secretaria. Com relação à execução financeira, como a referida região não estava prevista na <i>Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos</i> no momento da elaboração do orçamento para o ano de 2021, não houve previsão orçamentária para o ano de 2021. Entretanto, a execução das obras nos municípios de Bagre e Salvaterra gerou dispêndio financeiro na ordem de R\$ 1.618.277,79¹. Diante do exposto, informamos que o desempenho físico e financeiro da <i>Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos</i> na Região Marajó, no decorrer do ano de 2021, apresenta o status <i>Abaixo do Esperado</i>. Esclarecemos que a alimentação no sistema desta região no decorrer do ano de 2021 ficou desatualizada, sendo assim, informamos que para o encerramento do exercício de 2021, o sistema SigPlan- Monitoramento será devidamente atualizado, de modo a garantir a unidade da informação.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021

REGIÃO TOCANTINS					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: BARCARENA					
PRODUTO	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2021	1 EQUIPAMENTO IMPLANTADO
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Em 2021, a <i>Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos</i> foi programada para ser desenvolvida na Região Tocantins no município de Barcarena. Embora em 2020, a implementação da <i>Ação 7658. Implementação de Equipamentos Turísticos</i> não tenham obtido êxito, em 2021, as tratativas avançaram com a abertura de processo licitatório para “<i>Contratação de Empresa para a Requalificação e Urbanização da Orla do Município de Barcarena</i>” no segundo semestre de 2021. Desta forma, considerando todos os cumprimentos das etapas do processo licitatório, espera-se que em 2022 seja iniciada a obra de Requalificação e Urbanização da Orla do município de Barcarena. Quanto à meta física acordada para esta ação, é necessário lembrar que a proposta da Sedop consiste no equipamento implantado na vigência do PPA atual, ou seja, até o ano de 2023. Ocorre que, no momento da alimentação dos sistemas de planejamento público (SIGPLAN – MÓDULOS PPA E OGE) os mesmos não permitem a inserção do número zero no quantitativo anual, gerando a interpretação equivocada de que em cada ano do PPA haverá 1 Equipamento Implantado. No caso da execução financeira, embora a <i>Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos</i> tenha recebido um aporte orçamentário de R\$ 51.000,00¹, como o desenvolvimento da ação durante o ano de 2021 encontra-se nas etapas iniciais do processo licitatório, não houve dispêndios financeiros, conferindo desta forma, ao desempenho desta ação na Região Tocantins o status de <i>Abaixo do Esperado</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

6.3. PROGRAMA 1499: ESPORTE E LAZER

AÇÃO GOVERNAMENTAL:

7659. CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER.

6.3.1. Ação 7659. Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer

REGIÃO BAIXO AMAZONAS					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: SANTARÉM.					
PRODUTO	EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO	UNIDADE	UN	META 2021	1 EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Em 2021, a Sedop passou a ser órgão executor da Ação 7659. <i>Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer</i>, cujo objetivo é oferecer espaços adequados às práticas esportivas e de lazer à população do Estado do Pará. Para a Região Baixo Amazonas, foi programado o desenvolvimento dessa ação governamental no município de Santarém, com a execução da obra “Reforma e Conclusão do Estádio Colosso do Tapajós”. Além dessa obra, mesmo não tendo sido programado nos instrumentos de planejamento da Sedop, em 2021 também foram desenvolvidas no município de Santarém o serviço de “Implantação do Sistema de Refrigeração e Adequação da Área de Segurança do Ginásio Poliesportivo” e “Construção do Centro de Convenções”. A tabela a seguir, consolida o desenvolvimento das obras citadas no decorrer do ano de 2021:					
MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	SITUAÇÃO ATUAL			
SANTARÉM	REFORMA E CONCLUSÃO DO ESTÁDIO COLOSSO DO TAPAJÓS (JADER BARBALHO, BARBALHÃO).	APÓS A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO, NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021, FOI ASSINADO A ORDEM DE SERVIÇO QUE AUTORIZA O INÍCIO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO COLOSSO DO TAPAJÓS. A OBRA TEM CONCLUSÃO PREVISTA PARA 2023.			
	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE SEGURANÇA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO.	A OBRA TEVE SUA ORDEM DE SERVIÇO ASSINADA NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021. ENCONTRA-SE NA FASE DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E LEVANTAMENTOS INICIAIS, SEGUINDO CONFORME PROGRAMADO EM SEU CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO. A OBRA TEM CONCLUSÃO PREVISTA PARA 2023.			
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021, FOI ENTREGUE EM SANTARÉM A ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO DA ÁREA PARA FUTURAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE CONVENÇÕES. NO SEGUNDO SEMESTRE, FOI CELEBRADO CONTRATO COM CONSÓRCIO E ASSINADO ORDEM DE SREVIÇO PARA INÍCIO DAS OBRAS. A OBRA TEM CONCLUSÃO PREVISTA PARA 2023.			
Quanto a execução financeira, do orçamento proposto de R\$ 10.870.312,00¹, foram utilizados R\$ 6.781.386,62², o que equivale a 62% do orçamento programado. É necessário esclarecer que apenas no segundo semestre de 2021 houve movimentação financeira nesta ação, o que ratifica o baixo desempenho financeiro.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO - NOVEMBRO DE 2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO - NOVEMBRO DE 2021.

Diante do exposto, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7659. Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer* na Região Baixo Amazonas no exercício de 2021, esteve *Abaixo do Esperado*.

REGIÃO GUAJARÁ					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: BELÉM.					
PRODUTO	EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO	UNIDADE	UN	META 2021	1 EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Em 2021, a Sedop passou a ser órgão executor da <i>Ação 7659. Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer</i>, cujo objetivo é oferecer espaços adequados às práticas esportivas e de lazer à população do Estado do Pará. Para a Região Guajará, foi programado o desenvolvimento dessa ação governamental no município de Belém, com a execução da obra “Reforma Geral do Estádio Olímpico do Pará - Mangueirão”. Por ser considerada uma intervenção estratégica, no processo de Revisão do PPA 2020/2023 ocorrido em 2021, foi solicitado a inclusão desta obra como <i>Compromisso Regional</i>. O projeto de reforma do Mangueirão tem o objetivo de modernizar e readequar a estrutura do Estádio, ampliando a capacidade de 35 mil para cerca de 51 mil espectadores. A obra envolverá a retirada de parte dos estacionamentos internos, para ampliar as áreas de circulação, principalmente para escoamento do público, ampliando as rotas de saída, reforma geral dos banheiros em todos os níveis, com substituição do piso, colocação de revestimentos e troca de todas as louças e metais sanitário existentes. O estádio será adaptado para as atuais normas de acessibilidade, de forma a garantir a entrada de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida no estádio, com mais tranquilidade. No primeiro semestre de 2021, foi assinada a Ordem de Serviço e iniciado a execução de serviços preliminares, como a desmontagem e remoção de equipamentos e mobiliário, demolição das áreas que darão lugar ao novo setor de cadeiras e aos novos vestiários, além da demolição dos túneis. Paralelo a execução dos serviços preliminares, outra atividade de grande importância desenvolvida no primeiro semestre de 2021, foi a elaboração de projetos executivos de arquitetura, projeto estrutural, projeto de instalação elétrica, sanitária e de combate a incêndios. Além de responsabilizar-se para que o cronograma físico e financeiro da obra possa ser cumprido, garantir à população que poderá utilizar este espaço com toda segurança é uma das premissas da Sedop. Prova disto é que, desde que a obra iniciou, os responsáveis pelo projeto de modernização e reconstrução do Estádio do Mangueirão solicitaram uma série de ensaios técnicos, objetivando identificar possíveis problemas estruturais que possam existir na construção. No segundo semestre de 2021, foram apresentados resultados sobre o trabalho realizado para traçar um diagnóstico sobre a estrutura atual do estádio, os quais identificaram desgastes na estrutura do estádio que, senão forem reparados imediatamente comprometerão a segurança e qualidade da obra. A prioridade neste momento é implementar os procedimentos necessários para reestabelecer a condição funcional da estrutura. Quanto à meta física acordada para esta ação, é necessário lembrar que a proposta da Sedop consiste no Equipamento Construído até o ano de 2022. Ocorre que, no momento da alimentação dos sistemas de planejamento público (SIGPLAN – MÓDULOS PPA E OGE) os mesmos não permitem a inserção do número zero no quantitativo anual, gerando a interpretação equivocada de que em cada ano do PPA haverá 1 Equipamento Construído.					

No que diz respeito à execução financeira, do valor de R\$ 15.929.688,00¹ programado para atender a *Ação 7659. Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer* na Região Guajará, houve necessidade de majorar este valor em R\$ 33.480.589,57, totalizando a execução financeira desta ação no ano de 2021 em cerca de R\$ R\$ 49.410.277,57 ². É necessário esclarecer que esta divergência *orçamento planejado X orçamento executado*, deve-se, principalmente, a limitação do Teto Orçamentário disponibilizado para a Sedop, o qual é insuficiente para a real necessidade de execução das obras programadas.

Por fim, considerando que a evolução da obra no decorrer do ano de 2021 está em conformidade com o cronograma planejado, a Sedop considera que o desempenho físico e financeiro da *Ação 7659. Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer* na Região Guajará, no exercício de 2021 foi *Conforme o Programado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021

6.4. PROGRAMA 1508:

GOVERNANÇA PÚBLICA

AÇÕES GOVERNAMENTAIS:

7552. CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS ESTADUAIS.

7556. APOIO A CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS DE UTILIZAÇÃO PÚBLICA.

8890. FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL.

8887. CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS.

8233. EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

8238. GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

6.4.1. Ação 7552. Construção e Conservação de Imóveis Públicos Estaduais

REGIÃO ARAGUAIA					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: RIO MARIA					
PRODUTO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	UN	META 20221	1 OBRA REALIZADA
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Para o ano de 2021, não foi programada a execução da <i>Ação 7552. Construção e Conservação de Imóveis Públicos</i> na Região do Araguaia. Entretanto, buscando cumprir sua competência institucional de "...executar obras e serviços de engenharia e arquitetura do Estado...", durante ano de 2021, a Sedop desenvolveu obra "Reforma e Adaptação do Quartel de Polícia Militar", no município de Rio Maria, obra concluída no primeiro semestre de 2021. Faz-se necessário esclarecer que a alimentação no sistema desta ação na Região Araguaia, no decorrer do ano de 2021 ficou desatualizada, por isso no sistema SigPlan – Monitoramento não há registro da meta física alcançada, o que leva a ação obter o desempenho físico <i>Abaixo do Esperado</i>. Sendo assim, informamos que para o encerramento do exercício de 2021, o sistema SigPlan- Monitoramento será devidamente atualizado, de modo a garantir a unidade da informação. Quanto à execução financeira, para o ano de 2021 para atender a Região do Araguaia, foram utilizados R\$ 1.028,91¹. Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro <i>Ação 7552. Construção e Conservação de imóveis Públicos Estaduais</i> na Região do Araguaia encerra o exercício de 2021 com status de <i>Abaixo do Programado</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO GUAJARÁ					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: BELÉM					
PRODUTO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	UN	META 20221	5 OBRAS REALIZADAS
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Para o ano de 2021, foi programada a execução da <i>Ação 7552. Construção e Conservação de imóveis Públicos Estaduais</i> apenas no município de Belém, na Região Guajará. As obras de “Construção do Prédio para Acervo Histórico da Guarnição da Aeronáutica de Belém na Base” e “Demolição do Prédio do Iasep, para construção do Novo Hospital da Mulher” tiveram seus serviços concluídos em 2021. A obra de “Reforma, Ampliação e Adequação do Prédio da Seplad” a “Construção de salas dos nobreks e passarelas, incluindo drenagem lateral no Instituto de Terras do Pará- ITERPA” e a “Construção do Prédio do Esquadrão de Material Bélico na Base Aérea” ambas no município de Belém, seguem conforme cronograma. Faz-se necessário esclarecer que a alimentação no sistema desta ação na Região Guajará, no decorrer do ano de 2021 ficou desatualizada, por isso no sistema SigPlan – Monitoramento não há registro da meta física alcançada, o que leva a ação obter o desempenho físico <i>Abaixo do Esperado</i>. Sendo assim, informamos que para o encerramento do exercício de 2021, o sistema SigPlan- Monitoramento será devidamente atualizado, de modo a garantir a unidade da informação. Com relação à execução financeira, do valor programado de R\$ 201.503,00¹ para atender a Região Guajará, foram utilizados R\$ 4.153.083,84². Esta divergência ocorre principalmente devido a limitação do teto orçamentário disponibilizado para a Sedop, o qual não traduz a real necessidade para execução da obra. Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da <i>Ação 7552. Construção e Conservação de imóveis Públicos Estaduais</i> na Região Guajará encerra o exercício de 2021 com status de <i>Conforme Programado</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

6.4.2. Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública.

REGIÃO ARAGUAIA					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ÁGUA AZUL DO NORTE E XINGUARA.					
PRODUTO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2021	3 OBRAS REALIZADAS.
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Para o ano de 2021, não foi programada a execução da <i>Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública</i> na Região Araguaia. Entretanto, buscando cumprir sua competência institucional de "...executar obras e serviços de engenharia e arquitetura do Estado...", durante ano de 2021, a Sedop desenvolveu obras nos municípios de Água Azul do Norte e Xinguara. No município de Água Azul do Norte, a Sedop executou à "Reforma e Ampliação da Câmara Municipal" obra concluída e entregue em 2021. Já no município de Xinguara foram executados os serviços de "Construção de Praça na Av. Francisco Caldeira Castelo Branco" obra concluída e entregue durante o ano de 2021 e, a obra de "Reforma e Ampliação da Câmara Municipal" que com a execução dos serviços conforme o cronograma programado, com a previsão de conclusão em 2022. Faz-se necessário esclarecer que a alimentação no sistema desta ação na Região Araguaia, no decorrer do ano de 2021 ficou desatualizada, por isso no sistema SigPlan – Monitoramento não há registro da meta física alcançada, o que leva a ação obter o desempenho físico <i>Abaixo do Esperado</i>. Sendo assim, informamos que para o encerramento do exercício de 2021, o sistema SigPlan- Monitoramento será devidamente atualizado, de modo a garantir a unidade da informação. Quanto à execução financeira, para o ano de 2021 para atender a Região Araguaia, foram utilizados R\$ 441.918,04¹. Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da <i>Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública</i> na Região Araguaia encerra o exercício de 2021 com status de <i>Abaixo do Programado</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO BAIXO AMAZONAS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ALMERIM, CURUÁ, JURUTI E MONTE ALEGRE.					
PRODUTO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2021	4 OBRAS REALIZADAS.
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Para o ano de 2021, foi programada a execução da <i>Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública</i> em quatro municípios da Região Baixo Amazonas: Almerim, Curuá, Juruti e Monte Alegre. No município de Monte Alegre, para o ano de 2021, foi previsto a continuidade da execução da obra de construção de praça pública com recurso oriundo da Caixa Econômica Federal – CEF, sendo concluída no segundo semestre de 2021. Já no município de Juruti, também foi previsto a continuidade da execução de obra construção de praça pública com recurso oriundo da Caixa Econômica Federal – CEF, entretanto, o projeto encontra-se em fase de reprogramação com levantamento do saldo dos serviços. Após aprovada a reprogramação junto a CEF, a Sedop iniciará novo processo licitatório. A obra de construção de praça pública, no município de Almerim com recurso oriundo da Caixa Econômica Federal – CEF, depois da conclusão de novo processo licitatório, foi retomada em 2021 e segue conforme programado. Quanto a obra prevista para o município de Curuá, construção de praça pública com recurso oriundo da Caixa Econômica Federal – CEF, ressaltamos que por maior que tenha sido o empenho da Sedop para a finalização da mesma, não será possível a execução dos serviços, haja vista, que o contrato foi rescindido após a constatação da inviabilidade do desenvolvimento do projeto na área planejada. No que diz respeito à Região Baixo Amazonas, buscando cumprir sua competência institucional de “...executar obras e serviços de engenharia e arquitetura do Estado...”, durante ano de 2021, a Sedop executou física e financeiramente à obra “Elaboração de Projeto Executivo do Estádio Jader Barbalho” a “Construção de pista de lazer na Avenida Sérgio Henn bairro Nova República” e “Conclusão do Hospital Materno Infantil” todas no município de Santarém, apresentam execução conforme cronograma planejado. Ainda no município de Santarém, a Sedop executou financeiramente a obra “Conclusão da obra do Ginásio Poliesportivo para 5.000 pessoas” que teve sua conclusão em 2020, entretanto, apresentava pendência financeira. Faz-se necessário esclarecer que a alimentação no sistema desta ação na Região Baixo Amazonas, no decorrer do ano de 2021 ficou desatualizada, por isso no sistema SigPlan – Monitoramento não há registro da meta física alcançada, o que leva a ação obter o desempenho físico <i>Abaixo do Esperado</i>. Sendo assim, informamos que para o encerramento do exercício de 2021, o sistema SigPlan- Monitoramento será devidamente atualizado, de modo a garantir a unidade da informação. Com relação à execução financeira, do valor programado de R\$ 599.526,00¹ para atender a Região Baixo Amazonas, foram utilizados R\$ 12.245.916,34², ultrapassando o valor orçamentário planejado em cerca de R\$ 11.646.390,34. Esta divergência ocorre principalmente devido a limitação do teto orçamentário disponibilizado para a Sedop, o qual não traduz a real necessidade para execução da obra. Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da <i>Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública</i> na Região Baixo Amazonas encerra o exercício de 2021 com status de <i>Abaixo do Programado</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO CARAJÁS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: BREJO GRANDE DO ARAGUAIA					
PRODUTO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2021	NÃO HOUVE PREVISÃO DE OBRA REALIZADA
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Para o ano de 2021, não foi programada a execução da <i>Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública</i> na Região Carajás. Entretanto, buscando cumprir sua competência institucional de "...executar obras e serviços de engenharia e arquitetura do Estado...", durante ano de 2021, a Sedop desenvolveu obra no município de Brejo Grande do Araguaia. No município de Brejo Grande do Araguaia, a Sedop executou à "Reforma e Ampliação da Câmara Municipal" com a execução dos serviços conforme o cronograma programado, com a previsão de conclusão em 2022. Faz-se necessário esclarecer que a alimentação no sistema desta ação na Região Araguaia, no decorrer do ano de 2021 ficou desatualizada, por isso no sistema SigPlan – Monitoramento não há registro da meta física alcançada, o que leva a ação obter o desempenho físico <i>Abaixo do Esperado</i>. Sendo assim, informamos que para o encerramento do exercício de 2021, o sistema SigPlan- Monitoramento será devidamente atualizado, de modo a garantir a unidade da informação. Quanto à execução financeira, para o ano de 2021, para atender a Região Carajás, foram utilizados R\$ 46.427,03¹. Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da <i>Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública</i> na Região Araguaia encerra o exercício de 2021 com status de <i>Abaixo do Programado</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO GUAJARÁ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ANANINDEUA E BELÉM.					
PRODUTO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2021	2 OBRAS REALIZADAS
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Para o ano de 2021, a <i>Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública</i> foi programada para ser desenvolvida na Região Guajará através dos municípios de Ananindeua e Belém. No município de Belém, para o ano de 2021, foi previsto a continuidade da execução da obra de reforma/restauração de praças públicas com recurso oriundo da Caixa Econômica Federal – CEF, apresenta execução física conforme programado. Já no município de Ananindeua, foi previsto o repasse financeiro para a Prefeitura, visando a construção do mercado do Icuí-Guará. O projeto encontra-se em fase de reprogramação para posterior início de processo licitatório pela Prefeitura. Outra situação que merece ser destacada é que, embora não tenha sido contemplado nos instrumentos de planejamento, a Sedop executou física e financeiramente a obra de construção de quadra poliesportiva no Conjunto Valparaíso, concluída no primeiro semestre de 2021 e, a obra Reforma da Praça Tio Carlito, que segue conforme cronograma, ambas em Ananindeua. Faz-se necessário esclarecer que a alimentação no sistema desta ação na Guajará, no decorrer do ano de 2021 ficou desatualizada, por isso no sistema SigPlan – Monitoramento não há registro da meta física alcançada, o que leva a ação obter o desempenho físico <i>Abaixo do Esperado</i>. Sendo assim, informamos que para o encerramento do exercício de 2021, o sistema SigPlan- Monitoramento será devidamente atualizado, de modo a garantir a unidade da informação. Com relação à execução financeira, do valor programado de R\$ 515.000,00¹ para atender a Região Guajará, foram utilizados R\$ 1.885.688,89², ultrapassando o valor orçamentário planejado em cerca de R\$ 1.370.688,89. Esta divergência ocorre principalmente devido a limitação do teto orçamentário disponibilizado para a Sedop, o qual não traduz a real necessidade para execução da obra. Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da <i>Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública</i> na Região Guajará encerra o exercício de 2021 com status de <i>Abaixo do Programado</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO GUAMÁ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: CASTANHAL, CURUÇA, MAGALHÃES BARATA E MARACANÃ					
PRODUTO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2021	7 OBRAS REALIZADAS.
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Para o ano de 2021, não foi programada a execução da <i>Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública</i> na Região Guamá. Entretanto, buscando cumprir sua competência institucional de "...executar obras e serviços de engenharia e arquitetura do Estado...", durante ano de 2021, a Sedop desenvolveu obras nos municípios de Castanhall, Curuçá, Magalhães Barata e Maracanã. No município de Maracanã, a Sedop executou à "Reforma e Ampliação da Câmara Municipal" com a execução dos serviços conforme o cronograma programado, com a previsão de conclusão em 2022. Em Magalhães Barata, a Sedop executou à "Revitalização e Reforma da Praça Nossa Senhora de Nazaré" obra concluída em 2021. Já no município de Castanhall, foram previstas a execução da "Construção da Sede dos Moto-Taxistas" e "Construção do Galpão Metálico da Sede Paroquial Esporte Clube", ambas concluídas em 2021. Ainda em Castanhall, foram executados os serviços "Reforma e Ampliação do Centro Terapêutico Fazenda Embrião" e "Reforma da Sede Social ao Apeú Beneficente Clube", que apresentam desempenho conforme cronograma. Faz-se necessário esclarecer que a alimentação no sistema desta ação na Região Guamá, no decorrer do ano de 2021 ficou desatualizada, por isso no sistema SigPlan – Monitoramento não há registro da meta física alcançada, o que leva a ação obter o desempenho físico <i>Abaixo do Esperado</i>. Sendo assim, informamos que para o encerramento do exercício de 2021, o sistema SigPlan- Monitoramento será devidamente atualizado, de modo a garantir a unidade da informação. Quanto à execução financeira, para o ano de 2021, para atender a Região Guamá, foram utilizados R\$ 796.159,68¹. Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da <i>Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública</i> na Região Guamá encerra o exercício de 2021 com status de <i>Abaixo do Programado</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO LAGO TUCURUÍ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ITUPIRANGA					
PRODUTO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	UM	META 2021	NÃO HOUVE PREVISÃO DE OBRA REALIZADA
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Para o ano de 2021, não foi programada a execução da <i>Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública</i> na Região Lago Tucuruí. Entretanto, buscando cumprir sua competência institucional de “...executar obras e serviços de engenharia e arquitetura do Estado...”, durante ano de 2021, a Sedop desenvolveu obra “Construção do Mercado Municipal” no município de Itupiranga, que segue conforme cronograma planejado. Quanto à execução financeira, para o ano de 2021, para atender a Região Lago Tucuruí, foram utilizados R\$ 2.185.267,98¹. Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da <i>Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública</i> na Região Lago Tucuruí encerra o exercício de 2021 com status de <i>Abaixo do Programado</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO MARAJÓ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: BREVES					
PRODUTO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2021	NÃO HOUVE PREVISÃO DE OBRA REALIZADA
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Para o ano de 2021, não foi programada a execução da <i>Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública</i> na Região Marajó. Entretanto, buscando cumprir sua competência institucional de "...executar obras e serviços de engenharia e arquitetura do Estado...", durante ano de 2021, a Sedop desenvolveu obra no município de Breves a obra "Construção da Feira do Empreendedor" no município de Breves, que segue conforme cronograma planejado. Faz-se necessário esclarecer que a alimentação no sistema desta ação na Região Guamá, no decorrer do ano de 2021 ficou desatualizada, por isso no sistema SigPlan – Monitoramento não há registro da meta física alcançada, o que leva a ação obter o desempenho físico <i>Abaixo do Esperado</i>. Sendo assim, informamos que para o encerramento do exercício de 2021, o sistema SigPlan- Monitoramento será devidamente atualizado, de modo a garantir a unidade da informação. Quanto à execução financeira, para atender a Região Marajó, foram utilizados R\$ 280.830,83¹. Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da <i>Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública</i> na Região Marajó encerra o exercício de 2021 com status de <i>Abaixo do Programado</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO RIO CAETÉ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: CAPANEMA E CACHOEIRA DO PIRIÁ					
PRODUTO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2021	3 OBRAS REALIZADAS
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Para o ano de 2021, a <i>Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública</i> foi programada para ser desenvolvida na Região Rio Caeté através do município de Capanema. No município de Capanema, para o ano de 2021, foram previstas à execução das obras “Reforma e Ampliação de uma Estação Comercial Pública” e “Reforma do Complexo Rodoviário e Construção do Shopping popular”, ambas concluídas durante o ano de 2021. Outra situação que merece ser destacada é que, embora não tenha sido contemplado nos instrumentos de planejamento, a Sedop executou física e financeiramente a obra de “Construção de Praça Pública”, concluída no primeiro semestre de 2021. Faz-se necessário esclarecer que a alimentação no sistema desta ação na Região Rio Caeté, no decorrer do ano de 2021 ficou desatualizada, por isso no sistema SigPlan – Monitoramento não há registro da meta física alcançada, o que leva a ação obter o desempenho físico <i>Abaixo do Esperado</i>. Sendo assim, informamos que para o encerramento do exercício de 2021, o sistema SigPlan- Monitoramento será devidamente atualizado, de modo a garantir a unidade da informação. Com relação à execução financeira, do valor programado de R\$ 110.795,00¹ para atender a Região Rio Caeté, foram utilizados R\$ 1.580.877,90², ultrapassando o valor orçamentário planejado em cerca de R\$ 1.470.082,90. Esta divergência ocorre principalmente devido a limitação do teto orçamentário disponibilizado para a Sedop, o qual não traduz a real necessidade para execução da obra. Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da <i>Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública</i> na Região Rio Caeté encerra o exercício de 2021 com status de <i>Conforme Programado</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO RIO CAPIM					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: RONDON DO PARÁ.					
PRODUTO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2021	1 OBRA REALIZADA.
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Para o ano de 2021, foi programada a execução da <i>Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública</i> em um município da Região Rio Capim: Rondon do Pará. No município de Rondon do Pará, para o ano de 2021, foi previsto a continuidade da execução da obra “Construção do Complexo Esportivo Miranda” que segue conforme cronograma planejado. Outra situação que merece ser destacada é que, embora não tenha sido contemplado nos instrumentos de planejamento, a Sedop executou física e financeiramente a obra de “Construção do terminal Rodoviário”, no município de Tomé Açu, “Construção de Praça Pública” “Construção de Praça na Vila do fundo do Pote e “Construção da feira Coberta”, ambas no município de Garrafão do Norte. Já no município de Concórdia do Pará, a Sedop executou os serviços “Construção de Um Canteiro Central” que segue conforme o cronograma, assim como, a obra “Revitalização do Mercado”, no município de Concórdia do Pará. No município de Paragominas, a Sedop concluiu os serviços da obra “Construção do Muro Frontal do Cemitério Público” Faz-se necessário esclarecer que a alimentação no sistema desta ação na Região Rio Capim, no decorrer do ano de 2021 ficou desatualizada, por isso no sistema SigPlan – Monitoramento não há registro da meta física alcançada, o que leva a ação obter o desempenho físico <i>Abaixo do Esperado</i>. Sendo assim, informamos que para o encerramento do exercício de 2021, o sistema SigPlan- Monitoramento será devidamente atualizado, de modo a garantir a unidade da informação. Com relação à execução financeira, do valor programado de R\$ 2.226.475,00¹ para atender a Região Rio Capim, foram utilizados cerca de R\$ 2.258.192,93². Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da <i>Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública</i> na Região Rio Capim encerra o exercício de 2021 com status de <i>Abaixo do Programado</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO TAPAJÓS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: TRAIRÃO.					
PRODUTO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2021	NÃO HOUVE PREVISÃO DE OBRA REALIZADA
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Para o ano de 2021, não foi programada a execução da <i>Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública</i> na Região Tapajós. Entretanto, buscando cumprir sua competência institucional de "...executar obras e serviços de engenharia e arquitetura do Estado...", durante ano de 2021, a Sedop executou, no município de Trairão, a obra "Reforma do Ginásio de Esportes Simão Janete" obra concluída e entregue em 2021. Faz-se necessário esclarecer que a alimentação no sistema desta ação na Região Tapajós, no decorrer do ano de 2021 ficou desatualizada, por isso no sistema SigPlan – Monitoramento não há registro da meta física alcançada, o que leva a ação obter o desempenho físico <i>Abaixo do Esperado</i>. Sendo assim, informamos que para o encerramento do exercício de 2021, o sistema SigPlan- Monitoramento será devidamente atualizado, de modo a garantir a unidade da informação. Quanto à execução financeira, para o ano de 2021, para atender a Região do Tapajós, foram utilizados R\$ 199.699,71¹. Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da <i>Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública</i> na Região do Tapajós encerra o exercício de 2021 com status de <i>Abaixo do Programado</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO TOCANTINS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: BARCARENA E BAIÃO					
PRODUTO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2021	NÃO HOUVE PREVISÃO DE OBRA REALIZADA
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Para o ano de 2021, não foi programada a execução da <i>Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública</i> na Região do Tocantins. Entretanto, buscando cumprir sua competência institucional de "...executar obras e serviços de engenharia e arquitetura do Estado...", durante ano de 2021, a Sedop desenvolveu obras nos municípios de Baião e Barcarena. No município de Baião, a Sedop executou à "Construção da Câmara Municipal" obra concluída em 2021. Em Barcarena, a Sedop executou à "Construção de Quadra Poliesportiva Descoberta" que segue conforme cronograma planejado, assim como, "Construção de Gabião e Colchão Reno na Orla da Praia de Sirituba, na Ilha de Trambioca" obra concluída no segundo semestre de 2021. Faz-se necessário esclarecer que a alimentação no sistema desta ação na Região Tocantins, no decorrer do ano de 2021 ficou desatualizada, por isso no sistema SigPlan – Monitoramento não há registro da meta física alcançada, o que leva a ação obter o desempenho físico <i>Abaixo do Esperado</i>. Sendo assim, informamos que para o encerramento do exercício de 2021, o sistema SigPlan- Monitoramento será devidamente atualizado, de modo a garantir a unidade da informação. Quanto à execução financeira, para o ano de 2021, para atender a Região do Tocantins, foram utilizados R\$ 135.593,06¹. Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da <i>Ação 7556. Apoio a Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública</i> na Região do Tocantins encerra o exercício de 2021 com status de <i>Abaixo do Programado</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

6.4.3. Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal

REGIÃO DO ARAGUAIA					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: ÁGUA AZUL DO NORTE					
PRODUTO	MUNICÍPIO ATENDIDO	UNIDADE	UN	META 2021	1 MUNICÍPIO ATENDIDO
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Para o ano de 2021, foi programada a execução da <i>Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal</i> apenas no município de Água azul do Norte, na Região Araguaia. Ressaltamos que esta Região de Integração faz parte da área de atuação da Companhia Vale do Rio Doce, sendo portanto, atendida com recursos provenientes do Fundo para o Desenvolvimento Regional com Recursos da Desestatização (FRD II) do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) para aquisição de equipamentos. Enfatizamos que o projeto não foi implementado em consequência do posicionamento adotado pelo BNDES (gestor do recurso) no primeiro semestre de 2020 de suspender a aprovação e liberação de novos projetos, situação esta que permanece atualmente. Com relação à execução financeira, do valor programado de R\$ 887.000,00¹ para atender a Região Araguaia, foram utilizados R\$ 3.204,63². Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da <i>Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal</i> na Região Araguaia encerra o exercício de 2021 com status de <i>Abaixo do Programado</i>					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO CARAJÁS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: MARABÁ E PARAUAPEBAS					
PRODUTO	MUNICÍPIO ATENDIDO	UNIDADE	UND	META 2021	2 MUNICÍPIOS ATENDIDOS
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Para o ano de 2021, foi programada a execução da <i>Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal</i> apenas nos municípios de Marabá e Parauapebas, na Região Carajás. Ressaltamos que esta Região de Integração faz parte da área de atuação da Companhia Vale do Rio Doce, sendo portanto, atendida com recursos provenientes do Fundo para o Desenvolvimento Regional com Recursos da Desestatização (FRD II) do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) para aquisição de equipamentos cujo beneficiário seria o município de Parauapebas. Enfatizamos que o projeto não foi implementado em consequência do posicionamento adotado pelo BNDES (gestor do recurso) no primeiro semestre de 2020 de suspender a aprovação e liberação de novos projetos, situação está que permanece atualmente. Já no município de Marabá, visando a qualidade de vida da população, a Sedop executou os serviços “Melhorias Urbanas no Bairro Cabelo Seco” obra concluída no decorrer do ano de 2021. Com relação à execução financeira, do valor programado de R\$ 320.000,00¹ para atender a Região Carajás, foram utilizados R\$ 6.268,61². Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da <i>Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal</i> na Região Carajás encerra o exercício de 2021 com status de <i>Abaixo do Programado</i>					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO GUAJARÁ					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: BELÉM					
PRODUTO	MUNICÍPIO ATENDIDO	UNIDADE	UN	META 2021	1 MUNICÍPIO ATENDIDO
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Para o ano de 2021, foi programada a execução da <i>Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal</i> no município de Belém, na Região Guajará. No município de Belém, a Sedop executou os serviços de “Limpeza de Vias e Logradouros” que tem como objetivo mitigar os efeitos das fortes chuvas que atingem a região metropolitana. A execução dos serviços segue conforme cronograma planejado com previsão de conclusão em 2022. Outra situação que merece ser destacada é que, embora não tenha sido contemplado nos instrumentos de planejamento, a Sedop executou física e financeiramente a obra de “Limpeza de Vias e Logradouros”, no município de Ananindeua que segue conforme cronograma. Faz-se necessário esclarecer que a alimentação no sistema desta ação na Região Guajará, no decorrer do ano de 2021 ficou desatualizada, por isso no sistema SigPlan – Monitoramento não há registro da meta física alcançada, o que leva a ação obter o desempenho físico Abaixo do Esperado. Sendo assim, informamos que para o encerramento do exercício de 2021, o sistema SigPlan- Monitoramento será devidamente atualizado, de modo a garantir a unidade da informação. Com relação à execução financeira, do valor programado de R\$ 60.000,00¹ para atender a Região Guajará, foram utilizados R\$ 11.939.000,00². Esta divergência ocorre principalmente devido a limitação do teto orçamentário disponibilizado para a Sedop, o qual não traduz a real necessidade para execução da obra. Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da <i>Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal</i> na Região Guajará encerra o exercício de 2021 com status de <i>Abaixo do Programado</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO MARAJÓ					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA					
PRODUTO	MUNICÍPIO ATENDIDO	UNIDADE	UM	META 2021	1 MUNICÍPIO ATENDIDO
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Para o ano de 2021, foi programada a execução da <i>Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal</i> no município de São Sebastião da Boa Vista, na Região do Marajó, através da obra “Construção do Prédio da Câmara Municipal” que apresenta à execução dos serviços conforme cronograma. Faz-se necessário esclarecer que a alimentação no sistema desta ação na Região Marajó, no decorrer do ano de 2021 ficou desatualizada, por isso no sistema SigPlan – Monitoramento não há registro da meta física alcançada, o que leva a ação obter o desempenho físico Abaixo do Esperado. Sendo assim, informamos que para o encerramento do exercício de 2021, o sistema SigPlan- Monitoramento será devidamente atualizado, de modo a garantir a unidade da informação. Com relação à execução financeira, do valor programado de R\$ 100.000,00¹ para atender a Região do Marajó, foram utilizados R\$ 935.492,00². Esta divergência ocorre principalmente devido a limitação do teto orçamentário disponibilizado para a Sedop, o qual não traduz a real necessidade para execução da obra. Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da <i>Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal</i> na Região do Marajó encerra o exercício de 2021 com status de <i>Abaixo do Programado</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO RIO CAPIM					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: ABEL FIGUEIREDO					
PRODUTO	MUNICÍPIO ATENDIDO	UNIDADE	UN	META 2021	1 MUNICÍPIO ATENDIDO

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Para o ano de 2021, foi programada a execução da <i>Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal</i> apenas no município de Abel Figueiredo, na Região do Rio Capim. Ressaltamos que esta Região de Integração faz parte da área de atuação da Companhia Vale do Rio Doce, sendo portanto, atendida com recursos provenientes do Fundo para o Desenvolvimento Regional com Recursos da Desestatização (FRD II) do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES). Enfatizamos que o projeto não foi implementado em consequência do posicionamento adotado pelo BNDES (gestor do recurso) no primeiro semestre de 2020 de suspender a aprovação e liberação de novos projetos, situação esta que permanece atualmente. Entretanto, antes da suspensão do repasse do recurso, a Sedop conseguiu a aprovação e repasse do investimento para a aquisição de 2 ônibus escolares os quais foram entregues ao município de Abel Figueiredo no segundo semestre de 2021. Com relação à execução financeira, do valor programado de R\$ 813.000,00¹ para atender a Região do Rio Capim, foram utilizados R\$ 3.685,94². Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da <i>Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal</i> na Região do Rio Capim encerra o exercício de 2021 com status de <i>Conforme Programado</i>					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

6.4.4. Ação 8887. Capacitação de Agentes Públicos

REGIÃO BAIXO AMAZONAS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: SANTARÉM					
PRODUTO	AGENTE CAPACITADO	UNIDADE	UN	META 2021	2 AGENTES CAPACITADOS
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Reconhecendo a importância de capacitação dos servidores lotados nos núcleos regionais da Sedop, a Ação 8887. Capacitação de Agentes Públicos visa oportunizar o acesso ao aperfeiçoamento e, por conseguinte, maior eficiência no desenvolvimento das ações institucionais. Com orçamento de R\$ 550,00 previsto para o ano de 2021 e tendo como meta a capacitação de 02 agentes públicos, esta ação não realizou o programado para 2021, considerando os Decretos Governamentais de medidas de enfrentamento a pandemia de Covid-19 e possui status Abaixo do Esperado. Entretanto, ressaltamos o compromisso em reverter este cenário assim que possível, uma vez que a atual gestão reconhece a relevância de promover ações de capacitação para que os servidores possam atender com qualidade os diferentes setores da sociedade.					

REGIÃO CARAJÁS					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: MARABÁ					
PRODUTO	AGENTE CAPACITADO	UNIDADE	UND	META 2021	3 AGENTES CAPACITADOS
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Reconhecendo a importância de capacitação dos servidores lotados nos núcleos regionais da Sedop, a Ação 8887. Capacitação de Agentes Públicos visa oportunizar o acesso ao aperfeiçoamento e, por conseguinte, maior eficiência no desenvolvimento das ações institucionais. Com orçamento de R\$ 550,00 previsto para o ano de 2021 e tendo como meta a capacitação de 03 agentes públicos, esta ação não realizou o programado para 2021, considerando os Decretos Governamentais de medidas de enfrentamento a pandemia de Covid-19 e possui status Abaixo do Esperado. Entretanto, ressaltamos o compromisso em reverter este cenário assim que possível, uma vez que a atual gestão reconhece a relevância de promover ações de capacitação para que os servidores possam atender com qualidade os diferentes setores da sociedade.					

REGIÃO GUAJARÁ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: BELÉM					
PRODUTO	AGENTE CAPACITADO	UNIDADE	UND	META 2021	62 AGENTES CAPACITADOS
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Reconhecendo a importância de capacitação dos servidores lotados nos núcleos regionais da Sedop, a Ação 8887. Capacitação de Agentes Públicos visa oportunizar o acesso ao aperfeiçoamento e, por conseguinte, maior eficiência no desenvolvimento das ações institucionais. Em 2021, a SEDOP realizou Palestras referentes à prevenção de saúde e qualidade de vida dos servidores, incluindo campanhas de vacinas em parceria com a SEDAP e SEPLAD tipo Tríplice Viral, H1N1 e Sarampo. Foram capacitados 34 servidores, destacando 1 Pós Graduação Latu Sensu em Gestão Pública e Governança, em Andamento. Desta forma, tivemos uma representação de 34% dentro da ação de Capacitação de Agentes Públicos, ficando prejudicada a meta estabelecida devido a Pandemia Covid-19, respeitando os Decretos Governamentais. Faz-se necessário esclarecer que a alimentação no sistema desta ação na Região Araguaia, no decorrer do ano de 2021 ficou desatualizada, por isso no sistema SigPlan – Monitoramento não há registro da meta física alcançada, o que leva a ação obter o desempenho físico Abaixo do Esperado. Sendo assim, informamos que para o encerramento do exercício de 2021, o sistema SigPlan- Monitoramento será devidamente atualizado, de modo a garantir a unidade da informação. Com orçamento de R\$ 1.400,00 previsto para o ano de 2021 e tendo como meta a capacitação de 62 agentes públicos, esta ação não realizou o programado para 2021, considerando os Decretos Governamentais de medidas de enfrentamento a pandemia de Covid-19 e possui status Abaixo do Esperado. Entretanto, ressaltamos o compromisso em reverter este cenário assim que possível, uma vez que a atual gestão reconhece a relevância de promover ações de capacitação para que os servidores possam atender com qualidade os diferentes setores da sociedade.					

6.4.5. Ação 8233. Edição e Publicação de Atos da Administração Pública

REGIÃO GUAJARÁ					
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: BELÉM.					
PRODUTO	ATO PUBLICADO	UNIDADE	UN	META 2021	2.400 ATOS PUBLICADOS
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Com objetivo de contribuir com o fortalecimento da gestão e da governança com transparência, a Ação 8233. Edição e Publicação de Atos da Administração Pública integra o conjunto de ações que cooperam com um dos objetivos do Programa Governança Pública que é de “Prover A Governabilidade Do Poder Executivo”. Na ação Edição e Publicação de atos Administrativos, esta secretaria editou e publicou, até o mês de novembro de 2021, aproximadamente, 1.550 atos no Diário Oficial do Estado, com média/mês de, aproximadamente, 130 atos, gerando um custo, até o momento, de R\$ 90.579,81, conforme limites orçamentários e financeiros programados, respeitando ao Princípio da Publicidade na Administração Pública, assim como a transparência à sociedade. Faz-se necessário esclarecer que a alimentação no sistema desta ação na Região Guajará, no decorrer do ano de 2021 ficou desatualizada, por isso no sistema SigPlan – Monitoramento não há registro da meta física alcançada, o que leva a ação obter o desempenho físico Abaixo do Esperado. Sendo assim, informamos que para o encerramento do exercício de 2021, o sistema SigPlan- Monitoramento será devidamente atualizado, de modo a garantir a unidade da informação. Ressaltamos que em decorrência da Pandemia Covid-19 minimizamos o fluxo de viagens aos servidores, preservando-os sua saúde e qualidade de vida, conseqüentemente, diminuindo a quantidade de publicações referentes às diárias, porém, fazemos destaques para a diminuição de custos com publicações, não havendo prejuízos aos resultados planejados. Por fim, a Sedop informa que o desempenho físico e financeiro da ação encerra do exercício de 2021 com status <i>Conforme o Programado</i>.					

6.4.6. Ação 8238. Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação

REGIÃO GUAJARÁ					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: BELÉM					
PRODUTO	SERVIÇO REALIZADO	UNIDADE	UN	META 2021	1 SERVIÇO REALIZADO
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
A ação Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação tem em sua essência a função principal de prover a Sedop infraestrutura computacional de alta disponibilidade e soluções de tecnologia de informação e comunicação para a implementação e a gestão dos programas finalísticos. Em 2021, a Sedop manteve o contrato de transmissão de dados com a PRODEPA bem como adquiriu licenças de software. Com relação à execução financeira, do valor programado de R\$ 450.000,00¹, entretanto foram utilizados R\$ 213.084,82². Por fim, ressaltamos que o desempenho físico e financeiro da Ação 8238. Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação na Região Guajará durante o ano de 2021 foi Conforme o Programado.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

6.5. PROGRAMA 1297:

MANUTENÇÃO DA GESTÃO

AÇÕES GOVERNAMENTAIS:

4668. ABASTECIMENTO DE UNIDADES MÓVEIS

8311. CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

8312. CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE

8338. OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

8339. OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE RECURSOS HUMANOS

6.5.1. Ação 4668. Abastecimento de Unidades Móveis

REGIÃO BAIXO AMAZONAS					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: SANTARÉM.					
PRODUTO	UNIDADE ABASTECIDA	UNIDADE	UN	META 2021	02 UNIDADES ABASTECIDAS
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Pertencente ao Programa Manutenção da Gestão, cujo objetivo é <i>Viabilizar a Gestão Administrativa do Estado</i>, a <i>Ação 4668. Abastecimento de Unidades Móveis</i>, faz parte do conjunto de ações que, embora colaborem para consecução dos objetivos dos programas finalísticos, tem como função principal prover as Secretarias Estaduais dos meios administrativos para a implementação e a gestão dos programas finalísticos. Para o desenvolvimento desta ação, a Sedop tem como premissa a redução dos gastos mantendo sempre a qualidade e segurança dos servidores. No que diz respeito ao desempenho desta ação durante o ano de 2021 na Região Baixo Amazonas, a Sedop apresenta as seguintes considerações: # <u>Quanto a Meta Física</u>: Foi programado atender o município de Santarém com o quantitativo de 02 Unidades Abastecidas, meta esta devidamente cumprida, de modo a garantir assistência as necessidades de deslocamento dos servidores da Sedop. # <u>Quanto a Meta Financeira</u>: Para o ano de 2021, foi programado o orçamento de R\$ 8.800,00¹ para atender a Região Baixo Amazonas. Entretanto, faz-se necessário esclarecer que os Sistemas de Gestão do Orçamento não estão parametrizados por Regiões de Integração, motivando que a execução financeira dessa ação concentre-se na Região do Guajará de modo não haver desempenho financeiro nesta região. Feitas as considerações acima, por mais que esta ação não tenha tido execução financeira durante o ano de 2021 na Região Baixo Amazonas, a obtenção da meta física estabelecida, confere a ação o status de <i>Conforme o Programado</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO CARAJÁS					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: MARABÁ.					
PRODUTO	UNIDADE ABASTECIDA	UNIDADE	UN	META 2021	01 UNIDADE ABASTECIDA
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Pertencente ao Programa Manutenção da Gestão, cujo objetivo é <i>Viabilizar a Gestão Administrativa do Estado</i>, a Ação 4668. <i>Abastecimento de Unidades Móveis</i>, faz parte do conjunto de ações que, embora colaborem para consecução dos objetivos dos programas finalísticos, tem como função principal prover as Secretarias Estaduais dos meios administrativos para a implementação e a gestão dos programas finalísticos. Para o desenvolvimento desta ação, a Sedop tem como premissa a redução dos gastos mantendo sempre a qualidade e segurança dos servidores. No que diz respeito ao desempenho desta ação durante o ano de 2021 na Região Carajás, a Sedop apresenta as seguintes considerações: # <u>Quanto a Meta Física</u>: Foi programado atender o município de Marabá com o quantitativo de 01 Unidade Abastecida, meta esta devidamente cumprida, de modo a garantir assistência as necessidades de deslocamento dos servidores da Sedop. # <u>Quanto a Meta Financeira</u>: Para o ano de 2021, foi programado o orçamento de R\$ 24.800,00¹ para atender a Região Carajás. Entretanto, faz-se necessário esclarecer que os Sistemas de Gestão do Orçamento não estão parametrizados por Regiões de Integração, motivando que a execução financeira dessa ação concentre-se na Região do Guajará de modo não haver desempenho financeiro nesta região. Feitas as considerações acima, por mais que esta ação não tenha tido execução financeira durante o ano de 2021 na Região Carajás, a obtenção da meta física estabelecida, confere a ação o status de <i>Conforme o Programado</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO GUAJARÁ					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: BELÉM.					
PRODUTO	UNIDADE ABASTECIDA	UNIDADE	UN	META 2021	17 UNIDADES ABASTECIDAS
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Pertencente ao Programa Manutenção da Gestão, cujo objetivo é <i>Viabilizar a Gestão Administrativa do Estado</i>, a <i>Ação 4668. Abastecimento de Unidades Móveis</i>, faz parte do conjunto de ações que, embora colaborem para consecução dos objetivos dos programas finalísticos, tem como função principal prover as Secretarias Estaduais dos meios administrativos para a implementação e a gestão dos programas finalísticos. Para o desenvolvimento desta ação, a Sedop tem como premissa a redução dos gastos mantendo sempre a qualidade e segurança dos servidores. No que diz respeito ao desempenho desta ação durante o ano de 2021 na Região Guajará, a Sedop apresenta as seguintes considerações: # <u>Quanto a Meta Física</u>: Foi programado atender o município de Belém com o quantitativo de 17 Unidades Abastecidas, entretanto foi garantido a assistência as necessidades dos servidores da Sedop para deslocamentos com o quantitativo de 13 veículos. # <u>Quanto a Meta Financeira</u>: Faz-se necessário esclarecer que os Sistemas de Gestão do Orçamento não estão parametrizados por Regiões de Integração, motivando que a execução financeira da Região Baixo Amazonas e Carajás seja feita na Região Guajará. Mesmo com este cenário, do orçamento de R\$ 266.400,00¹ planejado para atendimento desta ação na Região Guajará, foram utilizados R\$ 153.183,24² o que equivale a cerca de 58% do valor programado, ficando a média mensal no valor de R\$ 13.925,74. Considerando o valor médio de consumo, o ano de 2021 encerra o exercício com o total de R\$ 167.108,98, gerando uma economia de R\$ 99.291,02. Finalizando, o desempenho físico e financeiro da <i>Ação 4668. Abastecimento de Unidades Móveis</i> na Região Guajará, exercício 2021, é considerado <i>Conforme o Programado</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

6.5.2. Ação 8311. Concessão de Auxílio Alimentação

REGIÃO BAIXO AMAZONAS					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: SANTARÉM.					
PRODUTO	SERVIDOR BENEFICIADO	UNIDADE	UN	META 2021	02 SERVIDORES BENEFICIADOS
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Pertencente ao Programa Manutenção da Gestão, cujo objetivo é <i>Viabilizar a Gestão Administrativa do Estado</i>, a Ação 8311. Concessão de Auxílio Alimentação, propicia ao servidor público estadual receber este benefício para subsidiar suas despesas com refeição durante sua jornada de trabalho. Quanto ao desempenho físico, em 2021 esta Ação Governamental contemplou em média 02 servidores/mês no Núcleo Regional de Santarém, garantindo desta forma o cumprimento da meta estabelecida para a Região Baixo Amazonas. No que diz respeito ao desempenho financeiro, para o ano de 2021 foi programado o orçamento de R\$ 16.000,00¹ para atender a Região Baixo Amazonas. Entretanto, faz-se necessário esclarecer que o Sistema de Gestão Integrada de Recursos Humanos – SIGIRH não está parametrizado por Regiões de Integração, não sendo possível desta forma, realizar movimentações financeiras fora da Região de Integração do Guajará. Por este motivo, não houve movimentação financeira na Região Baixo Amazonas durante o ano de 2021. Sendo assim, por mais que esta ação não tenha tido execução financeira durante o ano de 2021 na Região Baixo Amazonas, a obtenção da meta física estabelecida, confere a ação o status de <i>Conforme o Programado</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO CARAJÁS					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: MARABÁ.					
PRODUTO	SERVIDOR BENEFICIADO	UNIDADE	UN	META 2021	03 SERVIDORES BENEFICIADOS
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Pertencente ao Programa Manutenção da Gestão, cujo objetivo é <i>Viabilizar a Gestão Administrativa do Estado, a Ação 8311. Concessão de Auxílio Alimentação</i>, propicia ao servidor público estadual receber este benefício para subsidiar suas despesas com refeição durante sua jornada de trabalho. Quanto ao desempenho físico, em 2021 esta Ação Governamental contemplou em média 03 servidores/mês no Núcleo Regional de Marabá, garantindo desta forma o cumprimento da meta estabelecida para a Região Carajás. No que diz respeito ao desempenho financeiro, para o ano de 2021 foi programado o orçamento de R\$ 23.000,00¹ para atender a Região Carajás. Entretanto, faz-se necessário esclarecer que o Sistema de Gestão Integrada de Recursos Humanos – SIGIRH não está parametrizado por Regiões de Integração, não sendo possível desta forma, realizar movimentações financeiras fora da Região de Integração do Guajará. Por este motivo, não houve movimentação financeira na Região Carajás durante o ano de 2021. Sendo assim, por mais que esta ação não tenha tido execução financeira durante o ano de 2021 na Região Carajás, a obtenção da meta física estabelecida, confere a ação o status de <i>Conforme o Programado</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO GUAJARÁ					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: BELÉM.					
PRODUTO	SERVIDOR BENEFICIADO	UNIDADE	UN	META 2021	224 SERVIDORES BENEFICIADOS
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Pertencente ao Programa Manutenção da Gestão, cujo objetivo é <i>Viabilizar a Gestão Administrativa do Estado, a Ação 8311. Concessão de Auxílio Alimentação</i>, propicia ao servidor público estadual receber este benefício para subsidiar suas despesas com refeição durante sua jornada de trabalho. Quanto a meta física estabelecida, o quantitativo de 224 servidores levava em consideração novas contratações através de Concurso público, o que não foi possível acontecer no exercício de 2021. Sendo assim, a média 153 servidores/mês no município de Belém, garante o cumprimento da meta estabelecida para a Região Guajará. No que diz respeito ao desempenho financeiro, do orçamento de R\$ 1.207.503,00¹ programado para atender a Região Guajará, foram utilizados R\$ 1.027.531,45² evidenciando a harmonia entre <i>Orçamento Planejado e Orçamento Executado</i>. É necessário esclarecer que o Sistema de Gestão Integrada de Recursos Humanos – SIGIRH não está parametrizado por Regiões de Integração, não sendo possível desta forma, realizar movimentações financeiras fora da Região de Integração do Guajará. Por este motivo, as movimentações financeiras relacionadas as Regiões de Integração Baixo Amazonas e do Carajás estão concentradas na Região do Guajará. Esclarecemos que a alimentação no sistema desta região no decorrer do ano de 2021 ficou desatualizada, sendo assim, informamos que para o encerramento do exercício de 2021, o sistema SigPlan- Monitoramento será devidamente atualizado, de modo a garantir a unidade da informação. Finalizando, o desempenho físico e financeiro da <i>Ação 8311. Concessão de Auxílio Alimentação</i> na Região Guajará, exercício 2021, é considerado <i>Conforme o Programado</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021

6.5.3. Ação 8312. Concessão de Auxílio Transporte

REGIÃO BAIXO AMAZONAS					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: SANTARÉM.					
PRODUTO	SERVIDOR BENEFICIADO	UNIDADE	UN	META 2021	02 SERVIDORES BENEFICIADOS
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Pertencente ao Programa Manutenção da Gestão, cujo objetivo é <i>Viabilizar a Gestão Administrativa do Estado</i>, a <i>Ação 8312. Concessão de Auxílio Transporte</i>, propicia ao servidor público estadual receber este benefício para custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual nos deslocamentos realizados pelo servidor de sua residência para o local de trabalho e vice-versa. Quanto a meta física estabelecida, no primeiro semestre de 2021 houve remoção/exoneração de servidor, passando a meta física para 01 Servidor Beneficiado por esta ação na Região Baixo Amazonas. Sendo assim, a média 1 servidor/mês no Núcleo Regional de Santarém, garante o cumprimento da meta estabelecida para a Região Baixo Amazonas. No que diz respeito ao desempenho financeiro, para o ano de 2021 foi programado o orçamento de R\$ 415,00¹ para atender a Região Baixo Amazonas. Entretanto, faz-se necessário esclarecer que o Sistema de Gestão Integrada de Recursos Humanos – SIGIRH não está parametrizado por Regiões de Integração, não sendo possível desta forma, realizar movimentações financeiras fora da Região de Integração do Guajará. Por este motivo, não houve movimentação financeira na Região Baixo Amazonas durante o ano de 2021. Outra situação que merece ser esclarecida é que a alimentação no sistema desta região no decorrer do ano de 2021 ficou desatualizada, sendo assim, informamos que para o encerramento do exercício de 2021, o sistema SigPlan- Monitoramento será devidamente atualizado, de modo a garantir a unidade da informação. Por fim, por mais que esta ação não tenha tido execução financeira durante o ano de 2021 na Região Baixo Amazonas, a obtenção da meta física, confere a ação o status de <i>Conforme o Programado</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO CARAJÁS					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: MARABÁ.					
PRODUTO	SERVIDOR BENEFICIADO	UNIDADE	UN	META 2021	03 SERVIDORES BENEFICIADOS
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Pertencente ao Programa Manutenção da Gestão, cujo objetivo é <i>Viabilizar a Gestão Administrativa do Estado, a Ação 8312. Concessão de Auxílio Transporte</i>, propicia ao servidor público estadual receber este benefício para custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual nos deslocamentos realizados pelo servidor de sua residência para o local de trabalho e vice-versa. Quanto a meta física estabelecida, no primeiro semestre de 2021 houve remoção/exoneração de servidores, passando a meta física para 01 Servidor Beneficiado por esta ação na Região Carajás. Sendo assim, a média 1 servidor/mês no Núcleo Regional de Marabá, garante o cumprimento da meta estabelecida para a Região Carajás. No que diz respeito ao desempenho financeiro, para o ano de 2021 foi programado o orçamento de R\$ 622,00¹ para atender a Região Carajás. Entretanto, faz-se necessário esclarecer que o Sistema de Gestão Integrada de Recursos Humanos – SIGIRH não está parametrizado por Regiões de Integração, não sendo possível desta forma, realizar movimentações financeiras fora da Região de Integração do Guajará. Por este motivo, não houve movimentação financeira na Região Carajás durante o ano de 2021. Outra situação que merece ser esclarecida é que a alimentação no sistema desta região no decorrer do ano de 2021 ficou desatualizada, sendo assim, informamos que para o encerramento do exercício de 2021, o sistema SigPlan- Monitoramento será devidamente atualizado, de modo a garantir a unidade da informação. Por fim, por mais que esta ação não tenha tido execução financeira durante o ano de 2021 na Região Carajás, a obtenção da meta física, confere a ação o status de <i>Conforme o Programado</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO GUAJARÁ					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: BELÉM.					
PRODUTO	SERVIDOR BENEFICIADO	UNIDADE	UN	META 2021	224 SERVIDORES BENEFICIADOS
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Pertencente ao Programa Manutenção da Gestão, cujo objetivo é <i>Viabilizar a Gestão Administrativa do Estado, a Ação 8312. Concessão de Auxílio Transporte</i>, propicia ao servidor público estadual receber este benefício para custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual nos deslocamentos realizados pelo servidor de sua residência para o local de trabalho e vice-versa. Quanto a meta física estabelecida, o quantitativo de 224 servidores levava em consideração novas contratações através de Concurso público, o que não foi possível acontecer no exercício de 2021. Sendo assim, a média 134 servidores/mês no município de Belém, garante o cumprimento da meta estabelecida para a Região Guajará. No que diz respeito ao desempenho financeiro, do orçamento de R\$ 236.905,00¹ programado para atender a Região Guajará, foram utilizados R\$ 195.263,11² o que equivale a cerca de 82% do orçamento planejado. É necessário esclarecer que o Sistema de Gestão Integrada de Recursos Humanos – SIGIRH não está parametrizado por Regiões de Integração, não sendo possível desta forma, realizar movimentações financeiras fora da Região de Integração do Guajará. Por este motivo, as movimentações financeiras relacionadas as Regiões de Integração Baixo Amazonas e do Carajás estão concentradas na Região do Guajará. Tornamos ciente que a alimentação no sistema desta região no decorrer do ano de 2021 ficou desatualizada, sendo assim, informamos que para o encerramento do exercício de 2021, o sistema SigPlan- Monitoramento será devidamente atualizado, de modo a garantir a unidade da informação. Finalizando, o desempenho físico e financeiro da <i>Ação 8312. Concessão de Auxílio Transporte</i> na Região Guajará, exercício 2021, é considerado <i>Conforme o Programado</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021

6.5.4. Ação 8338. Operacionalização das Ações Administrativas

REGIÃO BAIXO AMAZONAS					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: SANTARÉM.					
PRODUTO	CONTRATO MANTIDO	UNIDADE	UN	META 2021	02 CONTRATOS MANTIDOS
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Pertencente ao Programa Manutenção da Gestão, cujo objetivo é <i>Viabilizar a Gestão Administrativa do Estado, a Ação 8338. Operacionalização das Ações Administrativas</i>, contribui com o Governo do Estado na manutenção de contratos administrativos, os quais tem como função principal, prover os meios administrativos para implementação e a gestão dos programas finalísticos. Quanto a execução da meta física, no exercício de 2021, os contratos mantidos com as empresas prestadora dos serviços de energia elétrica e telefonia fixa, passaram a ser executados no centro de custo da Região Baixo Amazonas, perfazendo um total de 2 contratos mantidos. No que diz respeito ao desempenho financeiro, para o ano de 2021 foi programado o orçamento de R\$ 9.000,00¹ para atender a Região Baixo Amazonas. No entanto houve necessidade de majorar o orçamento inicial em R\$ 19.885,62, passando o valor atualizado para R\$ 28.885,62². Esta divergência <i>Orçamento Planejado X Orçamento Executado</i> deu-se, em grande parte, devido o valor estabelecido no teto orçamentário disponibilizado para a Sedop ser insuficiente para a real necessidade de manutenção dos contratos. Outra situação que merece ser esclarecida é que a alimentação no sistema desta região no decorrer do ano de 2021 ficou desatualizada, sendo assim, informamos que para o encerramento do exercício de 2021, o sistema SigPlan- Monitoramento será devidamente atualizado, de modo a garantir a unidade da informação. Feitas as considerações acima, e levando em conta a atualização do sistema SIGPLAN – Módulo Monitoramento para encerramento do exercício, a Sedop considera que a <i>Ação 8338. Operacionalização das Ações Administrativas</i> na Região Baixo Amazonas, no ano de 2021, teve o desempenho físico e financeiro <i>Conforme o Programado</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO CARAJÁS					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: MARABÁ.					
PRODUTO	CONTRATO MANTIDO	UNIDADE	UN	META 2021	02 CONTRATOS MANTIDOS
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Pertencente ao Programa Manutenção da Gestão, cujo objetivo é <i>Viabilizar a Gestão Administrativa do Estado, a Ação 8338. Operacionalização das Ações Administrativas</i>, contribui com o Governo do Estado na manutenção de contratos administrativos, os quais tem como função principal, prover os meios administrativos para implementação e a gestão dos programas finalísticos. Quanto a execução da meta física, no exercício de 2021, os contratos mantidos com as empresas prestadora dos serviços de energia elétrica e telefonia fixa, passaram a ser executados no centro de custo da Região Carajás, perfazendo um total de 2 contratos mantidos. No que diz respeito ao desempenho financeiro, para o ano de 2021 foi programado o orçamento de R\$ 9.000,00¹ para atender a Região Carajás. Do valor programado, foram utilizados cerca de R\$ 6.591,58², o que equivale a 73% do valor programado. Outra situação que merece ser esclarecida é que a alimentação no sistema desta região no decorrer do ano de 2021 ficou desatualizada, sendo assim, informamos que para o encerramento do exercício de 2021, o sistema SigPlan- Monitoramento será devidamente atualizado, de modo a garantir a unidade da informação. Feitas as considerações acima, e levando em conta a atualização do sistema SIGPLAN – Módulo Monitoramento para encerramento do exercício, a Sedop considera que a <i>Ação 8338. Operacionalização das Ações Administrativas</i> na Região Carajás, no ano de 2021, teve o desempenho físico e financeiro <i>Conforme o Programado</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

REGIÃO GUAJARÁ					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: BELÉM.					
PRODUTO	CONTRATO MANTIDO	UNIDADE	UN	META 2021	11 CONTRATOS MANTIDOS
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Pertencente ao Programa Manutenção da Gestão, cujo objetivo é <i>Viabilizar a Gestão Administrativa do Estado, a Ação 8338. Operacionalização das Ações Administrativas</i>, contribui com o Governo do Estado na manutenção de contratos administrativos, os quais tem como função principal, prover os meios administrativos para implementação e a gestão dos programas finalísticos. Quanto a execução da meta física, no exercício de 2021, foram mantidos 19 Contratos Administrativos necessários para garantir o pleno funcionamento da Sedop e ultrapassando a meta física estabelecida em 8 contratos administrativos. No que diz respeito ao desempenho financeiro, para o ano de 2021 foi programado o orçamento de R\$ 2.141.497,00¹ para atender a Região Guajará. No entanto houve necessidade de majorar o orçamento inicial em R\$ 1.492.408,31, passando o valor atualizado para R\$ 3.633.905,31. Esta divergência <i>Orçamento Planejado X Orçamento Executado</i> deu-se, em grande parte, devido o valor estabelecido no teto orçamentário disponibilizado para a Sedop ser insuficiente para a real necessidade de manutenção dos contratos. Outra situação que merece ser esclarecida é que a alimentação no sistema desta região no decorrer do ano de 2021 ficou desatualizada, sendo assim, informamos que para o encerramento do exercício de 2021, o sistema SigPlan- Monitoramento será devidamente atualizado, de modo a garantir a unidade da informação. Feitas as considerações acima, e levando em conta a atualização do sistema SIGPLAN – Módulo Monitoramento para encerramento do exercício, a Sedop considera que a <i>Ação 8338. Operacionalização das Ações Administrativas</i> na Região Guajará, no ano de 2021, teve o desempenho físico e financeiro <i>Conforme o Programado</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

6.5.5. Ação 8339. Operacionalização das Ações de Recursos Humanos

REGIÃO BAIXO AMAZONAS					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: SANTARÉM.					
PRODUTO	SERVIDOR REMUNERADO	UNIDADE	UN	META 2021	02 SERVIDORES REMUNERADOS
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Pertencente ao Programa Manutenção da Gestão, cujo objetivo é <i>Viabilizar a Gestão Administrativa do Estado</i>, a Ação 8339. Operacionalização das Ações de Recursos Humanos tem como objetivo desenvolver ações voltadas à gestão de recursos humanos. No que diz respeito a execução da meta física, no exercício de 2021, permanece o quantitativo de 2 servidores lotados no Núcleo de Santarém, cumprindo desta forma em 100% a meta física estabelecida para a Região Baixo Amazonas. Quanto a execução financeira, informamos que o Sistema de Gestão Integrada de Recursos Humanos – SIGIRH não está parametrizado por Regiões de Integração e a referida ação concentra-se na Região do Guajará, por isso, a execução financeira referente à remuneração dos servidores é efetivada na Região de Integração Guajará, sendo este o motivo de não haver movimentação financeira na região do Baixo Amazonas durante o ano de 2021. Ressaltamos que a regularização desta situação está além da governabilidade da Sedop. Outra situação que merece ser esclarecida é que a alimentação no sistema desta região no decorrer do ano de 2021 ficou desatualizada, sendo assim, informamos que para o encerramento do exercício de 2021, o sistema SigPlan- Monitoramento será devidamente atualizado, de modo a garantir a unidade da informação. Feitas as considerações acima, e levando em conta a atualização do sistema SIGPLAN – Módulo Monitoramento para encerramento do exercício, a Sedop considera que a 8339. Operacionalização das Ações de Recursos Humanos na Região Baixo Amazonas, no ano de 2021, teve o desempenho físico <i>Conforme o Programado</i>.					

REGIÃO CARAJÁS					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: MARABÁ.					
PRODUTO	SERVIDOR REMUNERADO	UNIDADE	UN	META 2021	03 SERVIDORES REMUNERADOS
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Pertencente ao Programa Manutenção da Gestão, cujo objetivo é <i>Viabilizar a Gestão Administrativa do Estado, a Ação 8339. Operacionalização das Ações de Recursos Humanos</i> tem como objetivo desenvolver ações voltadas à gestão de recursos humanos. No que diz respeito a execução da meta física, no exercício de 2021, permanece o quantitativo de 3 servidores lotados no Núcleo de Marabá, cumprindo desta forma em 100% a meta física estabelecida para a Região Carajás. Quanto a execução financeira, informamos que o Sistema de Gestão Integrada de Recursos Humanos – SIGIRH não está parametrizado por Regiões de Integração e a referida ação concentra-se na Região Guajará, por isso, a execução financeira referente à remuneração dos servidores é efetivada na Região de Integração Guajará, sendo este o motivo de não haver movimentação financeira na Região Carajás durante o ano de 2021. Ressaltamos que a regularização desta situação está além da governabilidade da Sedop. Outra situação que merece ser esclarecida é que a alimentação no sistema desta região no decorrer do ano de 2021 ficou desatualizada, sendo assim, informamos que para o encerramento do exercício de 2021, o sistema SigPlan- Monitoramento será devidamente atualizado, de modo a garantir a unidade da informação. Feitas as considerações acima, e levando em conta a atualização do sistema SIGPLAN – Módulo Monitoramento para encerramento do exercício, a Sedop considera que a 8339. <i>Operacionalização das Ações de Recursos Humanos</i> na Região Carajás, no ano de 2021, teve o desempenho físico <i>Conforme o Programado</i>.					

REGIÃO GUAJARÁ					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: BELÉM.					
PRODUTO	SERVIDOR REMUNERADO	UNIDADE	UN	META 2021	256 SERVIDORES REMUNERADOS
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021					
Pertencente ao Programa Manutenção da Gestão, cujo objetivo é <i>Viabilizar a Gestão Administrativa do Estado, a Ação 8339. Operacionalização das Ações de Recursos Humanos</i> tem como objetivo desenvolver ações voltadas à gestão de recursos humanos. Nessa ação, a Secretaria monitorou o alcance das metas institucionais, indicando possíveis ajustes e garantindo a mais eficiente locação dos recursos financeiros e humanos para alcançar o melhor desempenho da gestão de governança do órgão, em cumprimento à missão institucional. Quanto a meta física estabelecida, o quantitativo de 256 servidores levava em consideração novas contratações através de Concurso público, o que não foi possível acontecer no exercício de 2021. Sendo assim, a média 184 servidores/mês no município de Belém, garante o cumprimento da meta estabelecida para a Região Guajará. No que diz respeito ao desempenho financeiro, do orçamento programado de R\$ 10.253.656,00¹ para atender a Região Guajará, foram utilizados cerca de R\$ 9.213.534,36² para o desenvolvimento desta ação. Destacamos que apesar dos reajustes financeiros em decorrência da equiparação salarial dos servidores, pagamentos retroativos referentes à abono de permanência e a liberação de folhas de desligados do ano de 2021, a Sedop conseguiu manter o equilíbrio orçamentário e financeiro. Outra situação que merece ser esclarecida é que a alimentação no sistema desta região no decorrer do ano de 2021 ficou desatualizada, sendo assim, informamos que para o encerramento do exercício de 2021, o sistema SigPlan- Monitoramento será devidamente atualizado, de modo a garantir a unidade da informação. Feitas as considerações acima, e levando em conta a atualização do sistema SIGPLAN – Módulo Monitoramento para encerramento do exercício, a Sedop considera que a <i>Ação 8339. Operacionalização das Ações de Recursos Humanos</i> na Região Guajará, no ano de 2021, teve o desempenho físico e financeiro <i>Conforme o Programado</i>.					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – NOVEMBRO/2021.
