

SEDOP

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

Relatório de Gestão 2022

Secretaria de
Desenvolvimento Urbano
e Obras Públicas

 GOVERNO DO
PARÁ
POR TODO O PARÁ

Helder Zahluth Barbalho
Governador do Estado do Pará

Benedito Ruy Santos Cabral
Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

Valdir Parry Acatauassu
Secretário Adjunto de Gestão de Desenvolvimento Urbano

Arnaldo Dopazo Antônio José
Secretário Adjunto de Gestão de Obras Públicas

Cínthia dos Santos Figueiredo
Coordenadora do Núcleo de Controle Interno

Maria Samara Lima Ramos
Diretora de Planejamento

Ângelo do Nascimento Gonçalves
Diretor Administrativo

Victória Germano Silva
Diretora Financeira

José Henrique Tavares da Silva
Diretor Técnico

Cristina de Farias Guedes Vieira
Diretora de Fiscalização e Acompanhamento de Obras

Lázaro César da Silva Lima Júnior
Diretor de Planejamento de Obras e Conformidade

Alexandre José Almeida de Alencar
Diretor de Política Setorial

Janete do Socorro Batista de Lima
Diretora de Planejamento Metropolitano e Gestão Territorial

Vanessa Catete Blois
Diretora de Descentralização Administrativa e Relações Comunitárias

Maurício Nunes
Consultor Jurídico

Lilian Celina Guedes de Ascui
Núcleo de Comunicação

Elaboração

Maria Samara Lima Ramos
Diretora de Planejamento

Ellen Né da Silva
Maria Cláudia Demétrio Gaia
Coordenadoria de Planejamento Estratégico e Orçamentário

APRESENTAÇÃO	5
CAPÍTULO I	7
PRINCIPAIS DESTAQUES E ENTREGAS DA SEDOP	7
1.1. PROGRAMA DESENVOLVIMENTO URBANO – HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MOBILIDADE	8
1.1.1. PRINCIPAIS DESTAQUES – ANO 2019	8
1.1.1.1. OBRAS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	8
1.1.1.2. OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	10
1.1.2. PRINCIPAIS DESTAQUES – ANO 2020	11
1.1.2.1. OBRAS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	11
1.1.2.2. OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	13
1.1.2.3. INSTRUMENTOS ELABORADOS	15
1.1.3. PRINCIPAIS DESTAQUES – ANO 2021	17
1.1.3.1. OBRAS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17
1.1.3.2. OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	18
1.1.3.3. INSTRUMENTOS ELABORADOS	20
1.1.4. PRINCIPAIS DESTAQUES – ANO 2022	21
1.1.4.1. MACRODRENAGEM DA BACIA DO TUCUNDUBA	21
1.1.4.2. OBRAS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	23
1.1.4.3. OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	25
1.1.4.4. INSTRUMENTOS ELABORADOS	27
1.2. PROGRAMA GOVERNANÇA PÚBLICA	28
1.2.1. PRINCIPAIS DESTAQUES – ANO 2020	28
1.2.1.1. OBRAS CIVIS	28
1.2.1.2. EQUIPAMENTOS ENTREGUES	29
1.2.2. PRINCIPAIS DESTAQUES – ANO 2021	30
1.2.2.1. OBRAS CIVIS	30
1.2.2.2. EQUIPAMENTOS ENTREGUES	32
1.2.3. PRINCIPAIS DESTAQUES – ANO 2022	33
1.2.3.1. OBRAS CIVIS	33
CAPÍTULO II	38
O QUE FIZEMOS EM 2022?	38
2.1. COMPROMISSOS REGIONAIS E PROJETOS PRIORITÁRIOS	39
2.1.1. MACRODRENAGEM DA BACIA DO TUCUNDUBA	39
2.1.2. APOIO À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS DE UTILIZAÇÃO PÚBLICA	52
2.1.3. IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	54

2.1.4.	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	57
2.2.	AÇÕES QUE CONTRIBUEM PARA O ALCANCE DAS METAS DOS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)	63
2.2.1.	ALINHAMENTO DAS AÇÕES DA SEDOP COM AS METAS ODS	63
2.3.	DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SEDOP	67
2.3.1.	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO URBANO – HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MOBILIDADE	67
2.3.1.1.	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	67
2.3.1.2.	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	93
2.3.1.3.	CONSTRUÇÃO DE PARQUES URBANOS	97
2.3.1.4.	OFERTA DE UNIDADE HABITACIONAL	104
2.3.1.5.	IMPLANTAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	107
2.3.1.6.	PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS	116
2.3.1.7.	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GOVERNANÇA METROPOLITANA	144
2.3.1.8.	APOIO ÀS AÇÕES DO CONCIDADES	154
2.3.1.9.	APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO	159
2.3.1.10.	APOIO TÉCNICO-INSTITUCIONAL NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO	174
2.3.2.	PROGRAMA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO	196
2.3.2.1.	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	196
2.3.3.	PROGRAMA ESPORTE E LAZER	212
2.3.3.1.	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	212
2.3.4.	PROGRAMA GOVERNANÇA PÚBLICA	231
2.3.4.1.	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS ESTADUAIS	231
2.3.4.2.	APOIO À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS DE UTILIZAÇÃO PÚBLICA	234
2.3.4.3.	FORTELECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL	247
2.3.4.4.	CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS	267
2.3.4.5.	EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	270
2.3.4.6.	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	271
2.3.5.	PROGRAMA MANUTENÇÃO DA GESTÃO	272
2.3.5.1.	ABASTECIMENTO DE UNIDADES MÓVEIS	272
2.3.5.2.	CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	275
2.3.5.3.	CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE	278
2.3.5.4.	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	281
2.3.5.5.	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE RECURSOS HUMANOS	284
	CAPÍTULO III	287
	O QUE IREMOS FAZER EM 2023?	287

3.1.	PERSPECTIVAS DE AÇÕES E PROJETOS	288
	CAPÍTULO IV	290
	MENSAGEM DE GOVERNO 2023?	290

APRESENTAÇÃO

O presente Relatório Anual de Gestão tem como objetivo apresentar as principais ações e atividades realizadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop) e discorrer sobre os desempenhos financeiros, físicos e qualitativos das ações governamentais sob a responsabilidade desta secretaria no exercício de 2022.

Seguindo as orientações da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD), o Relatório de Gestão - referente ao ano de 2022 - está estruturado de modo a demonstrar o atendimento das diretrizes estabelecidas no PPA 2020/2023 – Ano 2022, da seguinte maneira:

- ✓ Capítulo I – Principais Destaques da SEDOP – Anos 2019 a 2022;
- ✓ Capítulo II – O que fizemos em 2022?
- ✓ Capítulo III – O que iremos fazer em 2023?
- ✓ Capítulo IV – Mensagem de Governo 2023.

O primeiro capítulo inicia com a apresentação dos principais produtos entregues pela SEDOP à sociedade paraense no período de 2019 a 2022. Para melhor visualização destes produtos, foram elaboradas tabelas que consolidam as informações mais relevantes dos produtos entregues em cada ano, bem como o registro fotográfico que melhor representa estas entregas à sociedade.

No segundo capítulo, faz-se uma avaliação dos desempenhos físico e financeiro das Ações Governamentais, com destaque aos Compromissos Regionais e aos Projetos Prioritários, além das ações que contribuem para o alcance das metas do Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). É importante ressaltar que, em 2022, a Sedop esteve presente nas 12 Regiões de Integração do Estado do Pará, tanto por meio do desenvolvimento de ações voltadas para a execução de obras de infraestrutura, quanto do desenvolvimento de ações direcionadas à política de desenvolvimento urbano e seus instrumentos.

No terceiro capítulo, são apresentados os principais projetos e ações programadas pela Sedop para serem desenvolvidas ao longo de 2023. Por fim, o último capítulo sintetiza objetivamente os capítulos anteriores com ênfase às realizações mais relevantes no cenário

estadual, subsidiando, desta forma, a consolidação da Mensagem de Governo para ser encaminhada à Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa).

Ciente da importância deste documento como instrumento que contribui para a Prestação de Contas do Governo do Estado do Pará para o exercício de 2022, a Sedop ressalta a objetividade e clareza das informações prestadas no presente relatório.

CAPÍTULO I

PRINCIPAIS DESTAQUES E ENTREGAS DA SEDOP



1.1. PROGRAMA DESENVOLVIMENTO URBANO – HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MOBILIDADE

1.1.1. PRINCIPAIS DESTAQUES – ANO 2019

1.1.1.1. OBRAS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PRINCIPAIS ENTREGAS - 2019

Nº DE OBRAS CONCLUÍDAS	05
Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	04
Nº DE PESSOAS ATENDIDAS	36.264
Nº DE LIGAÇÕES DOMICILIARES REALIZADAS	6.002
Nº DE REGIÕES DE INTEGRAÇÃO COM OBRAS CONCLUÍDAS	04
INVESTIMENTO REALIZADO ¹	R\$ 14.532.958,93



FOTO 01: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ

¹ FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO – INVESTIMENTOS REALIZADOS E REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO – DEZEMBRO/2021.



FOTO 02: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA

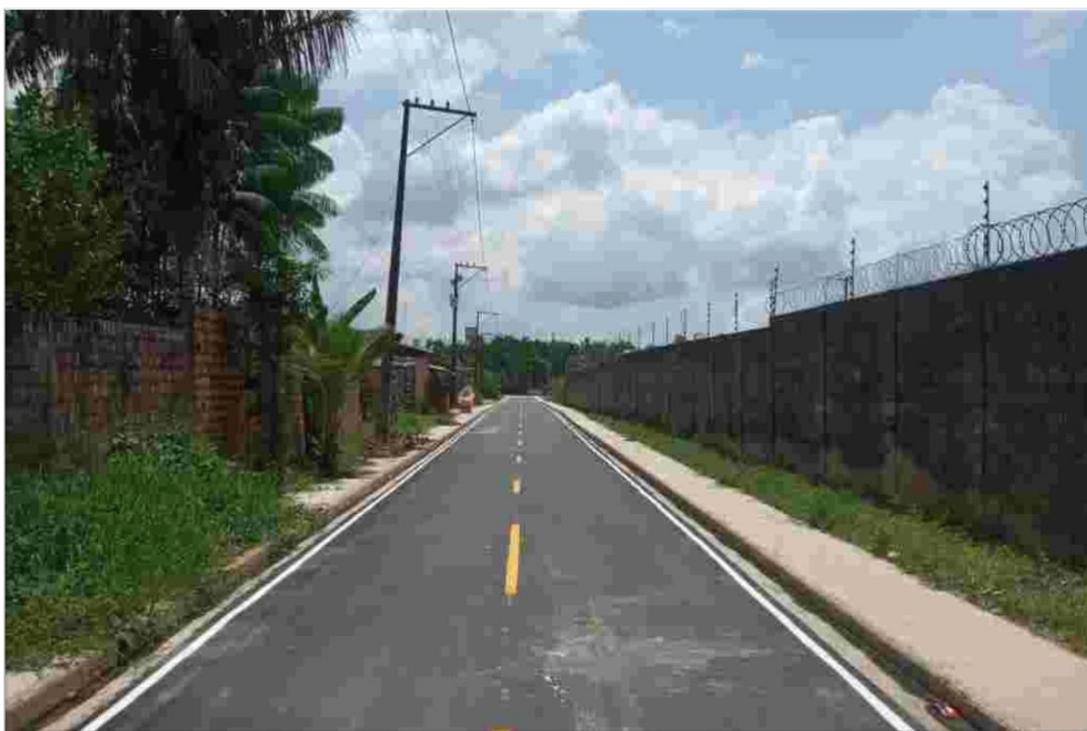


FOTO 03: RESERVATÓRIO ELEVADO DE 500M³
MUNICÍPIO DE VIGIA

1.1.1.2. OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

PRINCIPAIS ENTREGAS - 2019

Nº DE OBRAS EXECUTADAS	04
Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	02
Nº DE KM EXECUTADOS	65
Nº DE REGIÕES DE INTEGRAÇÃO ATENDIDAS	02
INVESTIMENTO REALIZADO ¹	R\$ 49.876.358,72



**FOTO 04: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA**

¹ FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO – INVESTIMENTOS REALIZADOS E REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO – DEZEMBRO/2021.

1.1.2. PRINCIPAIS DESTAQUES – ANO 2020

1.1.2.1. OBRAS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PRINCIPAIS ENTREGAS – 2020

Nº DE OBRAS CONCLUÍDAS	04
Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	04
Nº DE PESSOAS ATENDIDAS	33.201
Nº DE LIGAÇÕES DOMICILIARES REALIZADAS	4.372
Nº DE REGIÕES DE INTEGRAÇÃO COM OBRAS CONCLUÍDAS	03
INVESTIMENTO REALIZADO ¹	R\$ 27.249.807,84



**FOTO 05: RESERVATÓRIO ELEVADO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ**

¹ FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO – INVESTIMENTOS REALIZADOS E REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO – DEZEMBRO/2021.



FOTO 06: CASA DE BOMBAS
MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS



FOTO 07: RESERVATÓRIO ELEVADO
MUNICÍPIO DE TRACUATEUA

1.1.2.2. OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

PRINCIPAIS ENTREGAS - 2020

Nº DE OBRAS EXECUTADAS	108
Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	93
Nº DE KM EXECUTADOS	709
Nº DE REGIÕES DE INTEGRAÇÃO ATENDIDAS	12
INVESTIMENTO REALIZADO ¹	R\$ 690.692.929,20



**FOTO 08: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS
MUNICÍPIO DE PORTEL**

¹ FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO – INVESTIMENTOS REALIZADOS E REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO – DEZEMBRO/2021.



**FOTO 09: ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA BRASIL
MUNICÍPIO DE CASTANHAL**



**FOTO 10: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AVENIDA BRASIL
MUNICÍPIO DE CASTANHAL**

1.1.2.3. INSTRUMENTOS ELABORADOS

PRINCIPAIS ENTREGAS - 2020

Nº DE INSTRUMENTOS ELABORADOS	08
Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	08
Nº DE REGIÕES DE INTEGRAÇÃO ATENDIDAS	06
INVESTIMENTO REALIZADO ¹	R\$ 1.491.344,24



FOTO 11: CADERNO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE MOBILIDADE URBANA ELABORADOS PELA SEDOP

FOTO 12: ENTREGA DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA



¹ FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO – INVESTIMENTOS REALIZADOS E REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO – DEZEMBRO/2021.



FOTO 13: AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
MUNICÍPIO DE XINGUARA



FOTO 14: REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
MUNICÍPIO DE CASTANHAL

1.1.3. PRINCIPAIS DESTAQUES – ANO 2021

1.1.3.1. OBRAS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PRINCIPAIS ENTREGAS - 2021

Nº DE OBRAS CONCLUÍDAS	05
Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	05
Nº DE PESSOAS ATENDIDAS	44.723
Nº DE LIGAÇÕES DOMICILIARES REALIZADAS	4.910
Nº DE REGIÕES DE INTEGRAÇÃO COM OBRAS CONCLUÍDAS	04
INVESTIMENTO REALIZADO ¹	R\$ 11.134.409,98




**FOTO 15: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
MUNICÍPIO DE OURÉM**

¹ FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO – INVESTIMENTOS REALIZADOS E REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO – DEZEMBRO/2021.

1.1.3.2. OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

PRINCIPAIS ENTREGAS - 2021

Nº DE OBRAS EXECUTADAS	109
Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	100
Nº DE KM EXECUTADOS	914,10
Nº DE REGIÕES DE INTEGRAÇÃO ATENDIDAS	12
INVESTIMENTO REALIZADO ¹	R\$ 329.518.667,51

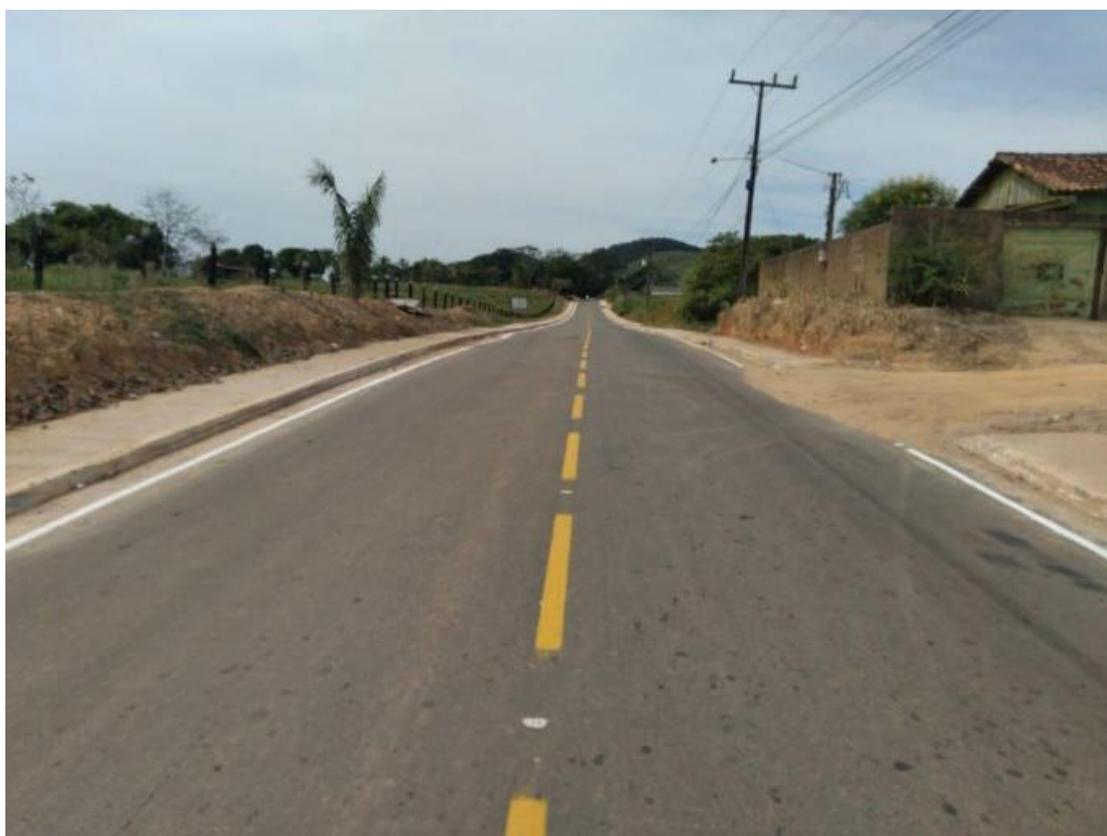

**FOTO 16: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
MUNICÍPIO DE BANNACH**

¹ FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO – INVESTIMENTOS REALIZADOS E REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO – DEZEMBRO/2021.



**FOTO 17: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
MUNICÍPIO DE CURRALINHO**



**FOTO 18: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS**

1.1.3.3. INSTRUMENTOS ELABORADOS

PRINCIPAIS ENTREGAS - 2021

Nº DE INSTRUMENTOS ELABORADOS	07
Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	07
Nº DE REGIÕES DE INTEGRAÇÃO ATENDIDAS	05
INVESTIMENTO REALIZADO ¹	R\$ 555.123,96



FOTO 19: REUNIÃO TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA NO MUNICÍPIO DE JURUTI

FOTO 20: AUDIÊNCIA PÚBLICA DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR NO MUNICÍPIO DE MARAPANIM



¹ FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO – INVESTIMENTOS REALIZADOS E REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO – DEZEMBRO/2021.

1.1.4. PRINCIPAIS DESTAQUES – ANO 2022

1.1.4.1. MACRODRENAGEM DA BACIA DO TUCUNDUBA

PRINCIPAIS ENTREGAS - 2022

EMPREGOS GERADOS	1.200 vagas
Nº DE PESSOAS BENEFICIADAS	250.000
ÁREA DE ABRANGÊNCIA	04 bairros (Guamá, Terra-Firme, Canudos e Marco)
BENFEITORIAS	- Correção da estrutura do canal p/vazão da água; - Pavimentação asfáltica; - Construção de praças, parques infantis e quadra de esporte.
VALOR DA OBRA	R\$ 250.000.000,00
INVESTIMENTO REALIZADO ¹	R\$ 130.653.162,81



**FOTO 21: MACRODRENAGEM DA BACIA DO TUCUNDUBA
VISTA AÉREA DO TERCEIRO TRECHO CONCLUÍDO**

¹ FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO – INVESTIMENTOS REALIZADOS E REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO – DEZEMBRO/2022.



FOTO 22: MACRODRENAGEM DA BACIA DO TUCUNDUBA – TERCEIRO TRECHO ENTREGUE
MUNICÍPIO DE BELÉM

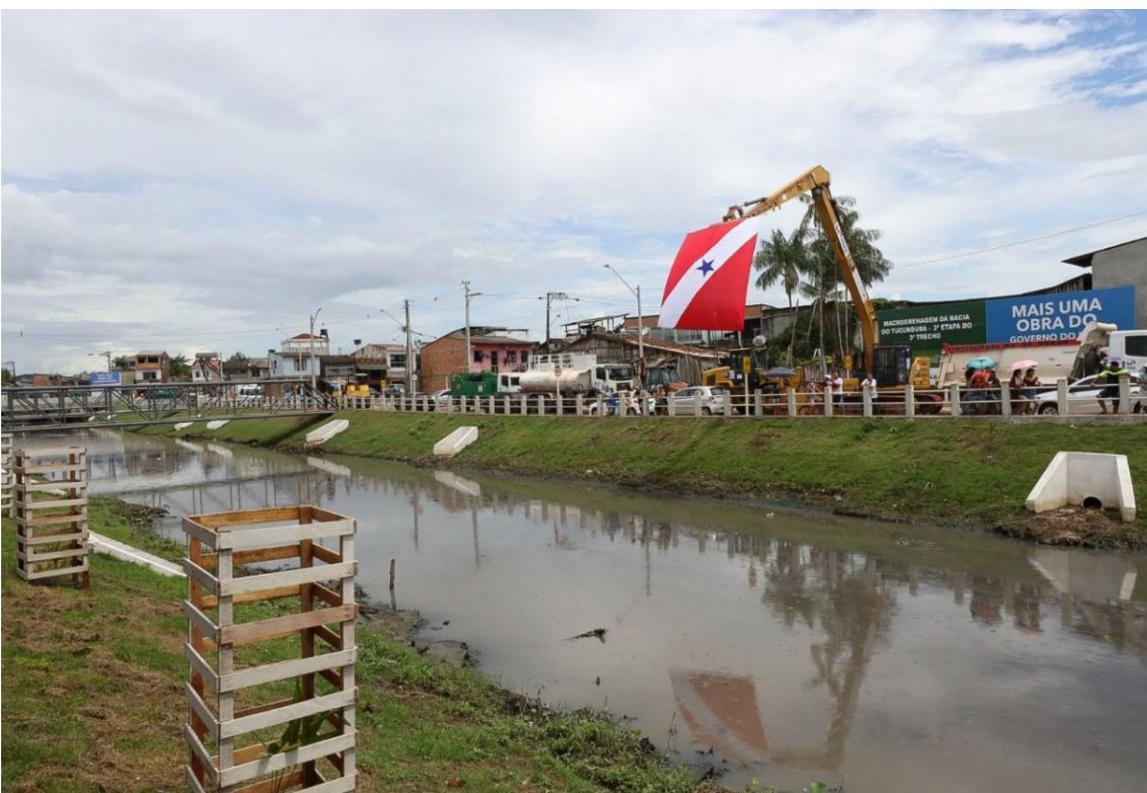


FOTO 23: MACRODRENAGEM DA BACIA DO TUCUNDUBA – TERCEIRO TRECHO – PASSARELA INSTALADA
MUNICÍPIO DE BELÉM

1.1.4.2. OBRAS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PRINCIPAIS ENTREGAS – 2022

Nº DE OBRAS CONCLUÍDAS	02
Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	02
Nº DE PESSOAS ATENDIDAS	44.000
Nº DE LIGAÇÕES DOMICILIARES REALIZADAS	3.704
Nº DE REGIÕES DE INTEGRAÇÃO COM OBRAS CONCLUÍDAS	02
INVESTIMENTO REALIZADO ¹	R\$ 40.019.310,38

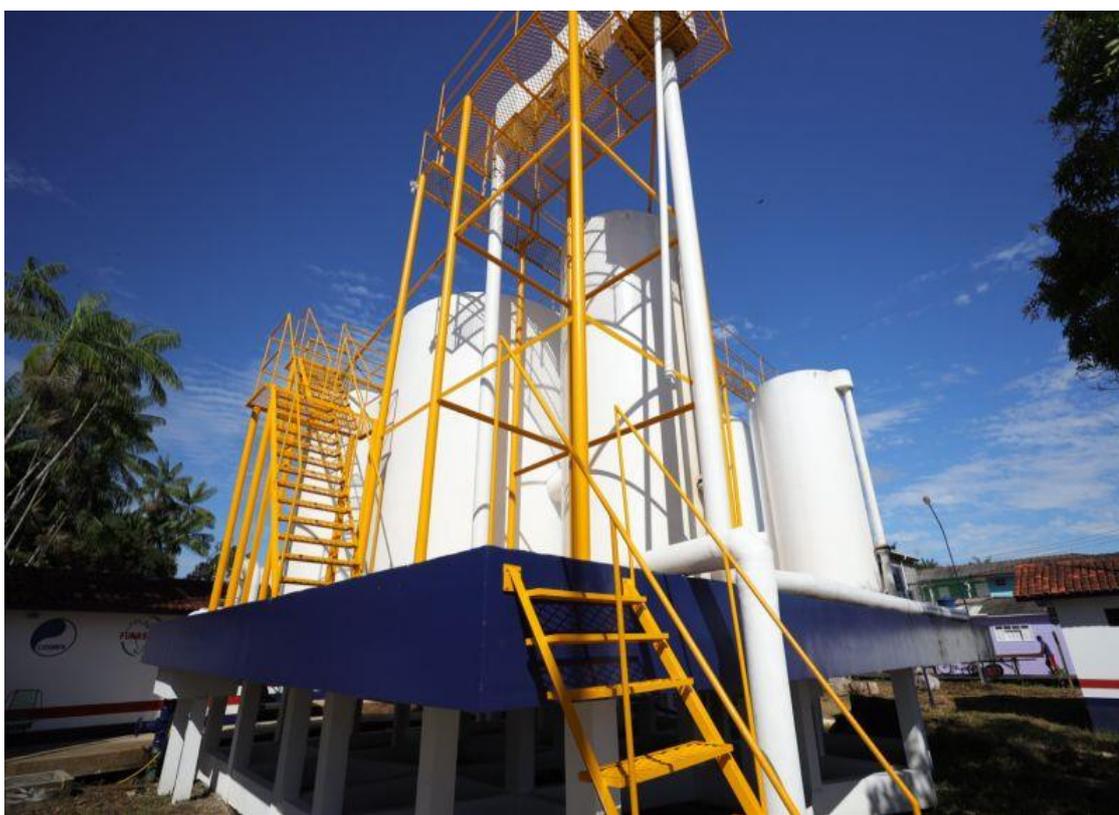


FOTO 24: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
MUNICÍPIO DE AFUÁ

¹ FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO – INVESTIMENTOS REALIZADOS E REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO – DEZEMBRO/2022.



FOTO 25: RESERVATÓRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

1.1.4.3. OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

PRINCIPAIS ENTREGAS – 2022

Nº DE OBRAS EXECUTADAS	128
Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	104
Nº DE KM EXECUTADOS	922
Nº DE REGIÕES DE INTEGRAÇÃO ATENDIDAS	12
INVESTIMENTO REALIZADO ¹	R\$ 1.002.160.682,32



**FOTO 26: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU**

¹ FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO – INVESTIMENTOS REALIZADOS E REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO – DEZEMBRO/2022.



**FOTO 27: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
MUNICÍPIO DE MARAPANIM**

1.1.4.4. INSTRUMENTOS ELABORADOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PRINCIPAIS ENTREGAS – 2022

Nº DE INSTRUMENTOS ELABORADOS	11
Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	11
Nº DE REGIÕES DE INTEGRAÇÃO ATENDIDAS	07
INVESTIMENTO REALIZADO ¹	R\$ 41.470,56



FOTO 28: REUNIÃO TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS



FOTO 29: REUNIÃO TÉCNICA PARA REVISÃO DO CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO MUNICÍPIO DE PORTEL

¹ FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO – INVESTIMENTOS REALIZADOS E REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO – DEZEMBRO/2022.

1.2. PROGRAMA GOVERNANÇA PÚBLICA

1.2.1. PRINCIPAIS DESTAQUES – ANO 2020

1.2.1.1. OBRAS CIVIS

PRINCIPAIS ENTREGAS – 2020

Nº DE OBRAS CONCLUÍDAS	13
Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	10
Nº DE REGIÕES DE INTEGRAÇÃO ATENDIDAS	07
INVESTIMENTO REALIZADO ¹	R\$ 59.851.190,16



**FOTO 30: CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM CONCRETO ARMADO
MUNICÍPIO DE AFUÁ**

¹ FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO – INVESTIMENTOS REALIZADOS E REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO – DEZEMBRO/2021.

1.2.1.2. EQUIPAMENTOS ENTREGUES

PRINCIPAIS ENTREGAS - 2020

Nº DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES	05
Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	01
Nº DE REGIÕES DE INTEGRAÇÃO ATENDIDAS	01
INVESTIMENTO REALIZADO ¹	R\$ 1.768.495,00



FOTO 31: ENTREGA DE CAMINHÕES COLETORES COMPACTADORES DE LIXO
MUNICÍPIO DE MARABÁ

¹ FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO – INVESTIMENTOS REALIZADOS E REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO – DEZEMBRO/2021.

1.2.2. PRINCIPAIS DESTAQUES – ANO 2021

1.2.2.1. OBRAS CIVIS

PRINCIPAIS ENTREGAS - 2021

Nº DE OBRAS CONCLUÍDAS	24
Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	20
Nº DE REGIÕES DE INTEGRAÇÃO ATENDIDAS	11
INVESTIMENTO REALIZADO ¹	R\$ 113.624.004,61



FOTO 32:
VISTA AÉREA DA
REVITALIZAÇÃO DA ORLA
MUNICÍPIO DE CURUÇÁ



FOTO 33:
REVITALIZAÇÃO DA ORLA –
EQUIPAMENTO URBANO
MUNICÍPIO DE CURUÇÁ

¹ FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO – INVESTIMENTOS REALIZADOS E REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO – DEZEMBRO/2021.



FOTO 34: REFORMA DO COMPLEXO RODOVIÁRIO
MUNICÍPIO DE CAPANEMA



FOTO 35: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR
MUNICÍPIO DE CAPANEMA

1.2.2.2. EQUIPAMENTOS ENTREGUES

PRINCIPAIS ENTREGAS - 2021

Nº DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES	02
Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	01
Nº DE REGIÕES DE INTEGRAÇÃO ATENDIDAS	01
INVESTIMENTO REALIZADO ¹	R\$ 539.000,00



**FOTO 36: ENTREGA DE DOIS MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES
MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO**

¹ FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO – INVESTIMENTOS REALIZADOS E REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO – DEZEMBRO/2021.

1.2.3. PRINCIPAIS DESTAQUES – ANO 2022

1.2.3.1. OBRAS CIVIS

PRINCIPAIS ENTREGAS – 2022

Nº DE OBRAS CONCLUÍDAS	10
Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	08
Nº DE REGIÕES DE INTEGRAÇÃO ATENDIDAS	07
INVESTIMENTO REALIZADO ¹	R\$ 21.741.657,00



FOTO 37:
FEIRA DO PRODUTOR RURAL
MUNICÍPIO DE URUARÁ

FOTO 38:
ORLA DA BEIRA – MAR DA
PRAIA GRANDE
MUNICÍPIO DE SALVATERRA



¹ FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO – INVESTIMENTOS REALIZADOS E REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO – DEZEMBRO/2022.



FOTO 39:
ORLA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ



FOTO 40:
ORLA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

1.3. PROGRAMA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO

1.3.1. PRINCIPAIS DESTAQUES – ANO 2022

1.3.1.1. OBRAS CIVIS

PRINCIPAIS ENTREGAS – 2022

Nº DE OBRAS CONCLUÍDAS	06
Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	05
Nº DE REGIÕES DE INTEGRAÇÃO ATENDIDAS	02
INVESTIMENTO REALIZADO ¹	R\$ 87.719.881,10



FOTO 41:
ORLA DA PRAIA DO MAÇARICO
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS



FOTO 42:
ORLA DA PRAIA DO MAÇARICO
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS

¹ FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO – INVESTIMENTOS REALIZADOS E REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO – DEZEMBRO/2022.

FOTO 43:
MUSEU DA MARUJADA
MUNICÍPIO DE BRAGANÇA



FOTO 44:
ORLA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI

1.4. PROGRAMA ESPORTE E LAZER

1.4.1. PRINCIPAIS DESTAQUES – ANO 2022

1.4.1.1. OBRAS CIVIS

PRINCIPAIS ENTREGAS – 2022

Nº DE OBRAS CONCLUÍDAS	04
Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	04
Nº DE REGIÕES DE INTEGRAÇÃO ATENDIDAS	04
INVESTIMENTO REALIZADO ¹	R\$ 8.316.456,11



FOTO 45:
PRAÇA NA VILA FÁTIMA
MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ

¹ FONTE: SIGPLAN RELATÓRIO – INVESTIMENTOS REALIZADOS E REALIZAÇÃO POR PROGRAMA E AÇÃO – DEZEMBRO/2022.

CAPÍTULO II

O QUE FIZEMOS EM 2022?



2.1. COMPROMISSOS REGIONAIS E PROJETOS PRIORITÁRIOS

2.1.1. MACRODRENAGEM DA BACIA DO TUCUNDUBA

O início do ano de 2022 foi marcado pela entrega do 3º Trecho da segunda etapa do Projeto de Saneamento Integrado da Bacia do Tucunduba, localizado entre a Rua 2 de Junho e a Travessa Vileta.



FOTO 46: MACRODRENAGEM DO TUCUNDUBA – TERCEIRO TRECHO
MUNICÍPIO DE BELÉM

Considerado Compromisso Regional e Projeto Prioritário, a obra de Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba beneficia cerca de duzentos e cinquenta mil moradores dos bairros do Guamá, Terra Firme, Canudos e Marco, cujo objetivo principal foi a revitalização das áreas alagáveis da Bacia do Tucunduba.

É importante ressaltar que, no desenvolvimento das intervenções físicas e ambientais necessárias para garantir a execução das obras, priorizou-se a participação social dos moradores do entorno, garantindo, desta forma, a gestão participativa no Projeto, principalmente pelo fato de a atual gestão entender que o mesmo nasceu do anseio da comunidade local de ter melhoria de condições de vida através da implantação de serviços de infraestrutura urbana.

Além da revitalização das áreas alagáveis, o que possibilita que a área contemplada recupere parte de suas condições naturais e de reequilíbrio com o ecossistema, o projeto também contemplou a urbanização da área, com pavimentação asfáltica e construção de praças, parques infantis e quadras de esporte.

A tabela a seguir apresenta de maneira sintetizada, os principais serviços finalizados e entregues a população relacionados ao 3º trecho.

Nº	TABELA 01: 3º TRECHO DA 2ª ETAPA DA MACRODRENAGEM DA BACIA DO TUCUNDUBA - SERVIÇOS ENTREGUES EM 2022-
1	09 Pontes em Concreto Armado com Protensão.
2	04 Passarelas Metálicas.
3	01 Quadra Poliesportiva.
4	1.414 metros de Terraplanagem.
5	1.414 metros de Pavimentação Asfáltica.
6	1.414 metros de Meio-Fio e Calçada.
7	2.631 metros de Rede de Abastecimento de Água.
8	10.129 metros de Rede de Esgotamento Sanitário.
9	1.851 metros de Rede de Drenagem Pluvial.
10	02 Estações Elevatórias.
11	528 Benfeitorias Demolidas.
12	2.226 Benfeitorias atendidas com ligações domiciliares.
13	Fornecimento de 123.673 m³ para o Programa de Aterro de Quintais.

Fonte: DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS – DIFIS/ SEDOP – DEZEMBRO/2022.

É importante ressaltar que, embora no ano de 2021 tenha sido efetivado a entrega dos dois primeiros trechos do Projeto de Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba (perímetro entre a Rua São Domingos e a Rua 2 de junho), no que se refere ao 1º trecho – compreendido entre a Rua São Domingos e a Rua dos Mundurucus, foram realizados serviços remanescentes direcionados para a conclusão da Estação de Tratamento do Riacho Doce, no decorrer do ano de 2022.

Os serviços concentraram-se na conclusão do Sistema de Esgotamento Sanitário, os quais estão relacionados à construção de três Estações Elevatórias de Esgoto, e na conclusão da Estação de Tratamento de Esgoto, onde foram realizados serviços, como a montagem de equipamentos (tubulações externas), implantação de rede elétrica externa, instalação de esquadrias, pintura e urbanização.

No ano de 2022, houve avanço na execução dos serviços relacionados ao 4º trecho do Projeto de Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba. As obras, que se concentram nos Canais União e Timbó (275 metros de extensão), contam com investimento de R\$ 47.681.949,03, e têm sua conclusão prevista para o segundo semestre de 2023.

Estas obras vão garantir que os canais também recebam serviços de correção e urbanização, garantindo mais qualidade de vida para a população e solução para o problema dos alagamentos em diversos bairros. As vias marginais receberão obras de infraestrutura, com a drenagem pluvial e redes de água e de esgoto.

Dentre os serviços executados durante o ano de 2022, relacionadas às obras do 4º trecho, destacam-se:

Nº	TABELA 02: MACRODRENAGEM DA BACIA DO TUCUNDUBA - CANAIS UNIÃO E TIMBÓ - SERVIÇOS EXECUTADOS EM 2022 -
1	Construção de 05 pontes.
3	240 metros de Canal Revestido em placas de concreto.
4	200 metros de Terraplanagem.
5	200 metros de Pavimentação Asfáltica.
6	210 metros de Rede de Água.
7	300 metros de Rede de Esgoto.
8	150 metros de Rede de Drenagem Pluvial.
9	100 metros de Rede de Drenagem Auxiliar.
10	102 Benfeitorias demolidas.
11	120 metros de meio-fio.
12	66.891,06 m ³ de Aterro de Quintal.

FONTE: DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS – DIFIS/ SEDOP – DEZEMBRO/2022.

Neste mesmo ano, também foram iniciados os serviços correspondentes à obra de macrodrenagem do Canal Mundurucus. A obra tem o objetivo de restaurar e requalificar cerca de 680 metros de extensão do canal, no trecho compreendido entre a Travessa Teófilo Conduru e a Avenida Tucunduba, o qual foi se deteriorando com o tempo, acarretando impactos negativos para o sistema de drenagem que envolve os bairros pelos quais passa o Canal do Tucunduba. Os principais serviços iniciados na execução desta obra durante o ano de 2022 estão consolidados na tabela abaixo:

Nº	TABELA 03: MACRODRENAGEM DA BACIA DO TUCUNDUBA – CANAL MUNDURUCUS - SERVIÇOS EXECUTADOS EM 2022 -
1	Mobilização do Canteiro de Obras.
3	Execução de Projetos Executivos.
4	Sistema Viário – Terraplanagem nas Marginais do Canal.
5	Sondagem nas Marginais do Canal.
6	Rede de Drenagem Auxiliar.
7	Rede de Drenagem Pluvial.

FONTE: DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS – DIFIS/ SEDOP – DEZEMBRO/2022.

Para a execução dos serviços relatados acima, a Sedop investiu R\$ 130.653.162,81¹ ao longo de 2022. Ressalta-se que este valor está relacionado tanto à execução da obra física, quanto às atividades necessárias para o desenvolvimento do Projeto Técnico Social (PTS), uma vez que é inerente às obras de grande porte que o componente social seja respeitado, considerando que o mesmo é parte intrínseca ao desenvolvimento da obra.

Exemplo disso pode ser constatado na execução do 4º trecho – Macrodrenagem do Canal União e Timbó - na proposta do serviço para melhorar a vazão e escoamento das águas das chuvas, onde, na busca de soluções eficazes para o problema dos alagamentos em diversos bairros do município de Belém será ampliado a largura do Canal União, que passará dos três metros atuais para oito metros. Esta medida impactará diretamente o cotidiano dos moradores da área, uma vez que, para a implementação desta proposta, ocorrerá a desapropriação de cerca de 51 imóveis.

Neste sentido, assim como na execução dos trechos anteriores, a Sedop assegurou a participação popular no processo, da mesma forma, para a execução dos serviços relacionados ao 4º trecho – Macrodrenagem Canal União e Timbó, a inclusão social dos moradores do entorno é garantida, como por exemplo, através da realização de encontros com os técnicos da Sedop, onde são apresentados aos moradores todas as informações relacionadas ao projeto e prestados esclarecimentos sobre a execução das obras.

Do valor total de R\$ 130.653.162,81, cerca de 7 % foram direcionados ao desenvolvimento de ações voltadas para o estabelecimento do Projeto Técnico Social (PTS), tais como o pagamento referentes às indenizações pecuniárias às famílias que tiveram seus imóveis

¹ FONTE: SIGPLAN – MÓDULO MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

desapropriados. A tabela a seguir, consolida as principais atividades desenvolvidas no ano de 2022 relacionadas ao Projeto Técnico Social:

Nº	TABELA 04: MACRODRENAGEM DA BACIA DO TUCUNDUBA - PROJETO TÉCNICO SOCIAL (PTS)
1	Atividades de mobilização, sensibilização e organização da comunidade.
2	Plantão Social para realizar atendimentos aos moradores sobre suas reais necessidades, orientando-os a buscar soluções para os problemas apresentados.
3	Visita técnica na área do Projeto de Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba.
4	Atendimento a demanda espontânea das famílias que fazem parte do Projeto de Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba.
5	Acompanhamento na área do Projeto junto a empresa terceirizada.
6	Negociação de 101 famílias que foram desapropriadas em função da execução da obra no 4º Trecho – Canais União e Timbó.
7	Remanejamento de benfeitorias consideradas frentes de trabalho no 4º Trecho – Canais União e Timbó.
8	1.136 famílias atendidas pelo Programa Aterro de Quintal – PAQUIN.
9	Encaminhamento de 12 famílias desapropriadas para o recebimento do benefício auxílio moradia, enquanto aguardam unidades habitacionais do Residencial Liberdade.
10	Levantamento cadastral de famílias a serem desapropriadas para a implementação do Projeto de Macrodrenagem do Canal Mundurucus.
11	261 levantamentos cadastrais realizados relacionados as famílias a serem desapropriadas para implementação do Projeto Lago Verde.
12	1.925 levantamentos realizados para elaboração dos Boletins de Cadastro Imobiliário – BCI e Boletins de Cadastro de Logradouro – BCL para o Projeto de Regularização Fundiária.
13	Ação de Plantio de mudas de Açaí no Talude do canal do Tucunduba.
14	Ação de educação ambiental realizada na EEEFM Acácio Felício Sobral – Oficina de Fanzine.
15	Ação Sócio – Educativa – Programação de Grafiteagem.

FONTE: RELATÓRIO INSTITUCIONAL DIRETORIA DE MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA (DIMAC/SEDOP) – DEZEMBRO/2022.

Para melhor compreensão do desempenho da meta física da *Ação 7480. Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba* no decorrer do ano de 2022, no final deste item, encontra-se o Registro Fotográfico dos serviços desenvolvidos nesta ação governamental, tanto no que diz respeito à execução das obras quanto no que se refere às atividades voltadas para o Projeto Técnico Social (PTS).

No que diz respeito ao desempenho financeiro, o valor de R\$ 83.059.249,00¹, programado para atender esta ação durante o ano de 2022, foi acrescido de R\$ 47.593.913,81, totalizando R\$ 130.653.162,81². Esta majoração deve-se, dentre outras situações, principalmente, à limitação

¹ FONTE: SIGPLAN – MÓDULO MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN – MÓDULO MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

do teto orçamentário disponibilizado para a Sedop, o qual ficou aquém da real necessidade para a execução da obra.

Além da limitação do teto orçamentário, esta divergência *Orçamento Planejado X Orçamento Executado* também justifica-se pela necessidade de cumprir os cronogramas físicos das obras, mantendo a evolução das mesmas em consonância com os respectivos cronogramas de modo a garantir o cumprimento do Compromisso Regional assumido pelo Governo do Estado do Pará de *Concluir a Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba* na vigência do PPA 2020/2023.

Diante do cenário apresentado e, conforme pode ser constatado no Sistema Integrado de Planejamento do Pará – SigPlan - Módulo Monitoramento, o desempenho físico e financeiro da Ação 7480. Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba no exercício de 2022 apresenta o status *Conforme Programado*.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROJETO SANEAMENTO INTEGRADO DA BACIA DO TUCUNDUBA

3º TRECHO – RUA 2 DE JUNHO E TRAVESSA VILETA



FOTO 47: SERVIÇO DE CONCRETAGEM DE PONTE



FOTO 48: PONTE METÁLICA INSTALADA



FOTO 49: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA



FOTO 50: URBANIZAÇÃO DO ESPAÇO – CONSTRUÇÃO DE PRAÇA



FOTO 51: URBANIZAÇÃO DO ESPAÇO – CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA



FOTO 52: URBANIZAÇÃO DO ESPAÇO – ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA PARA A POPULAÇÃO

4º TRECHO – CANAIS UNIÃO E TIMBÓ



FOTO 53: MOLDAGEM DAS ESTACAS PARA OS CANAIS



FOTO 54 MOLDAGEM DAS PLACAS PARA OS CANAIS



FOTO 55: REVESTIMENTO DOS CANAIS



FOTO 56: LANÇAMENTO DE VIGA "T"



FOTO 57: SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM



FOTO 58: SERVIÇO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL



FOTO 59: EXECUÇÃO DE MEIO-FIO E SARIETA



FOTO 60: REMANEJAMENTO DA REDE ELÉTRICA

CANAL MUNDURUCUS



FOTO 61: EXECUÇÃO DA ÁREA DE VIVÊNCIA



FOTO 62: EXECUÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO



FOTO 63: EXECUÇÃO DO COLCHÃO DRENANTE



FOTO 64: EXECUÇÃO DE DRENAGEM AUXILIAR

PROJETO TÉCNICO SOCIAL (PTS) – AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS



FOTO 65: AÇÃO SOCIOEDUCATIVA – EDUCAÇÃO AMBIENTAL
PLANTIO DE MUDA DE AÇAÍ NO TALUDE DO CANAL DO TUCUNDUBA



FOTO 66: AÇÃO SOCIOEDUCATIVA – EDUCAÇÃO INCLUSIVA
PROGRAMAÇÃO DE GRAFITAGEM NO PROJETO TUCUNDUBA

PROJETO TÉCNICO SOCIAL (PTS) – PROGRAMA ATERRO DE QUINTAL (PAQUIN)



FOTO 67: LEVANTAMENTO CADASTRAL



FOTO 68: ATENDIMENTO NO PLANTÃO SOCIAL



FOTO 69: ENTREGA DO KIT PAQUIN



FOTO 70: ENTREGA DE MATERIAL ARENOSO



**FOTO 71: ATERRAMENTO DE LOTES
TRAVESSA TIMBÓ QUADRA 31 - ANTES**



**FOTO 72: ATERRAMENTO DE LOTES
TRAVESSA TIMBÓ QUADRA 31 - DEPOIS**

2.1.2. APOIO À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS DE UTILIZAÇÃO PÚBLICA

Reconhecendo a importância dos espaços públicos como forma de promoção social e melhoria da qualidade de vida da população, o Governo do Estado, através do Programa Governança Pública desenvolve a Ação Governamental 7556. Apoio à Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública a qual possui os seguintes objetivos:

1. Ampliar o investimento de obras e espaços sociais nos municípios paraenses;
2. Subsidiar a manutenção/adequação de edificações em espaços comunitários.

Com ênfase no objetivo nº 1 e com a prerrogativa de que a saúde é um direito social assegurado pela Constituição Federal, o Governo do Estado do Pará, através da Sedop, celebrou convênio no ano de 2020 com a Prefeitura Municipal de Santarém no valor de R\$ 25.000.000 (vinte e cinco milhões de reais) para a “Conclusão do Hospital Materno Infantil”, no Município de Santarém.

A obra, que até então estava unicamente sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Santarém, foi iniciada em 2013 e desde 2015 estava paralisada, sendo finalmente retomada em 2020 após parceria com o Governo Estadual. Considerado um Projeto Prioritário, o hospital será referência em obstetrícia e pediatria, contará com cerca de 128 leitos e 34 consultórios, incluindo 36 leitos de internação intensiva (Unidade de Terapia Intensiva – UTI e Unidade de Cuidados Intermediários – UCI). Além dos municípios da Região de Integração Baixo Amazonas, o hospital beneficiará municípios vizinhos de outras Regiões de Integração.

Ocorre que, mesmo com a retomada da obra no ano de 2020, com o advento da pandemia, obstáculos no fornecimento de materiais e outros insumos necessários para o andamento da obra impactaram diretamente na diminuição do ritmo da mesma.

Já em 2021 e 2022, além da evolução muito aquém do programado, foi necessário um acompanhamento e reformulação do plano de trabalho com ajustes nos cronogramas físico e de desembolso.

Ressaltamos que se trata de uma obra que envolve verba federal advinda de contrato de repasse celebrado entre o município e o Ministério da Saúde/CAIXA; e verba estadual, por meio do Convênio nº 002/2020, celebrado entre a SEDOP e o Município de Santarém. Atualmente, o projeto apresenta uma execução de aproximadamente 73% da obra física. A execução desta obra

é uma tarefa complexa, pois envolve as três esferas de governo e uma multiplicidade de regulações normativas.

A SEDOP informa que, diante de pendências na prestação de contas do convênio, a Prefeitura Municipal de Santarém foi notificada quanto à urgência de regularizar esta situação, sendo informada quanto às possíveis consequências, caso não apresente as documentações necessárias para a aprovação da mesma.

Por fim, reconhecendo a importância deste projeto prioritário para a Região do Baixo Amazonas, a SEDOP continuará empenhada para que o Governo do Estado entregue esta obra à população.

2.1.3. IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS

A execução de obras no âmbito da *Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos*, vem ao encontro do anseio do Governo do Estado do Pará de alcançar um dos objetivos estabelecidos no PPA 2020/2023 para o Programa 1498. Indústria, Comércio, Serviços e Turismo, que é justamente o de “Promover o Turismo como Atividade Econômica”.

Prova disto é que, nesta ação, a Sedop é a Unidade Orçamentária responsável por executar três obras consideradas como Projetos Prioritários. A tabela abaixo apresenta estas obras de maneira consolidada por Região de Integração, Município, Descrição da Obra e Valor do Investimento:

TABELA 05: PROJETOS PRIORITÁRIOS – AÇÃO 7658			
REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	INVESTIMENTO (R\$)
BAIXO AMAZONAS	SANTARÉM	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES SEBASTIÃO TAPAJÓS.	R\$ 77.406.510,31
RIO CAETÉ	SALINÓPOLIS	REQUALIFICAÇÃO DA ORLA DO ATALAIA – URBANIZAÇÃO.	R\$ 98.300.030,98
	SALINÓPOLIS	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E URBANIZAÇÃO DA ORLA NA AVENIDA BEIRAMAR, NA PRAIA DO MAÇARICO.	R\$ 102.276.160,25
TOTAL INVESTIMENTO			R\$ 277.982.701,54

No que diz respeito ao “**Centro de Convenções Sebastião Tapajós**”, o mesmo está sendo construído em um terreno de 110.525,97 m², e terá uma área construída superior a 10 mil m², com ambiente climatizado, auditório com 400 lugares, camarins, área VIP, sala de imprensa, banheiros, praça de alimentação com mais de 350 lugares, ambulatório, estacionamento com mais de 500 vagas, salas de controle técnico e departamento administrativo.

Com conclusão prevista para o ano de 2023, trata-se de um empreendimento de grande porte concebido, principalmente, para fomentar atividades e negócios voltados não só para o turismo local, como também para atender a este tipo de demanda de todos os demais municípios que fazem parte do Polo Turístico Tapajós, o qual contempla 19 municípios das Regiões de Integração Baixo Amazonas e Tapajós.



FOTO 73: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE CONVENÇÕES SEBASTIÃO TAPAJÓS
MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Quanto ao projeto Prioritário **“Requalificação da Orla do Atalaia – Urbanização”**, no primeiro semestre de 2022 foi realizado o processo licitatório para contratação de empresa para executar a obra, tendo a empresa vencedora celebrado contrato com a Sedop em junho de 2022. Entretanto, para que a obra possa ser iniciada, condicionantes para concessão do licenciamento ambiental e licença de instalação precisam ser atendidas pelo órgão municipal.

Outro Projeto Prioritário executado através da *Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos*, no decorrer do ano de 2022, foi a obra **“Construção de Muro de Arrimo e Urbanização da Orla na Avenida Beira-Mar”**, na Praia do Maçarico, que foi concluída em dezembro do mesmo ano. Ao longo do ano, foram investidos cerca de R\$ 82.301.237,26¹ necessários para a execução dos serviços.

Foram revitalizados, aproximadamente, 800 metros na linha da Praia do Maçarico, e urbanizada uma área em torno de 16.000 m². A proposta de intervenção visa tornar o local um elemento de integração urbana e social, reorganizando seu traçado e trazendo um espaço de convivência e lazer para a população local e para os turistas.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.



FOTO 74: ORLA DA AVENIDA BEIRA-MAR, NA PRAIA DO MAÇARICO
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS



FOTO 75: ORLA DA AVENIDA BEIRA-MAR, NA PRAIA DO MAÇARICO
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS

2.1.4. CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER

Apoiar a construção e adequação de espaços públicos de qualidade, que permitam a realização de atividades de integração, lazer, convívio social e, fundamentalmente, que oportunizem uma vida melhor para a sociedade paraense, constitui a essência do desenvolvimento da *Ação 7659. Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer*.

Nesta ação, a Sedop também é a Unidade Orçamentária responsável por executar três obras classificadas como Projetos Prioritários, as quais estão retratadas na tabela abaixo:

TABELA 06: PROJETOS PRIORITÁRIOS – AÇÃO 7659			
REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	INVESTIMENTO (R\$)
BAIXO AMAZONAS	SANTARÉM	REFORMA E CONCLUSÃO DO ESTÁDIO COLOSSO DO TAPAJÓS.	R\$ 103.350.831,86
	SANTARÉM	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE SEGURANÇA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE SANTARÉM.	R\$ 17.630.887,75
GUAJARÁ	BELÉM	REFORMA GERAL DO ESTÁDIO OLÍMPICO DO PARÁ (MANGUEIRÃO).	R\$ 226.822.846,84
TOTAL INVESTIMENTO			R\$ 347.804.566,45

A obra **“Reforma e Conclusão do Estádio Colosso do Tapajós”** teve seu contrato extinto por decurso de prazo em 2016, passou por novo processo licitatório em 2021, sendo retomada no final do segundo semestre de 2021. Prevista para ser concluída no segundo semestre de 2023, a obra encontra-se em execução com desempenho em conformidade com o cronograma físico e financeiro estabelecido para o exercício de 2022.

Quanto à **“Implantação do Sistema de Refrigeração e Adequação da Área de Segurança no Ginásio Poliesportivo de Santarém”** os serviços foram concluídos em junho de 2022, conforme programado. É importante ressaltar que o projeto original não previa a climatização do espaço, sendo assim, para instalação do sistema de refrigeração, houve a necessidade de reduzir 300 lugares, ou seja, o ginásio passará a contar com 4.700 lugares.

Com previsão de entrega para o primeiro semestre de 2023, a obra **“Reforma Geral do Estádio Olímpico do Pará – Mangueirão”**, no decorrer do ano de 2022, apresentou evolução física em consonância com o planejamento estabelecido no cronograma físico e financeiro.

Para garantir a celeridade necessária para o cumprimento do prazo de entrega deste Projeto Prioritário, a obra conta com um efetivo de mais de mil trabalhadores, atuando em três turnos, sendo devidamente acompanhados pela equipe técnica da Sedop de modo a assegurar que todos os prazos sejam cumpridos.

Além de ser uma obra emblemática para a população paraense, a reforma e modernização de uma obra desta magnitude, contribui para geração de emprego e renda no Estado do Pará, fortalecendo a economia e proporcionando o desenvolvimento social.



FOTO 76: SERVIÇOS DE REFORMA DO MANGUEIRÃO EM FASE FINAL – TESTE DE ILUMINAÇÃO
MUNICÍPIO DE BELÉM

O projeto em execução atende a todos os padrões exigidos pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pela Norma Brasileira que trata da acessibilidade às edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos (NBR 9050/2020), garantindo que eventos nacionais e internacionais sejam realizados com segurança e conforto para a toda a população, sem distinção.

Durante o ano de 2022 foram investidos R\$ 149.530.287,09¹ na execução do serviço de reforma geral, e R\$ 39.441.076,69² destinados à aquisição e instalação de equipamentos como cadeiras com assento rebatível, poltronas, placar eletrônico, elevadores dentre outros.

Para melhor compreensão da evolução da obra no decorrer do ano de 2022, a seguir encontra-se o Registro Fotográfico dos serviços desenvolvidos.

¹ SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REFORMA GERAL DO ESTÁDIO OLÍMPICO DO PARÁ - MANGUEIRÃO



FOTO 77: REMOÇÃO DO ANTIGO GRAMADO PARA INÍCIO DOS TRABALHOS DE DRENAGEM

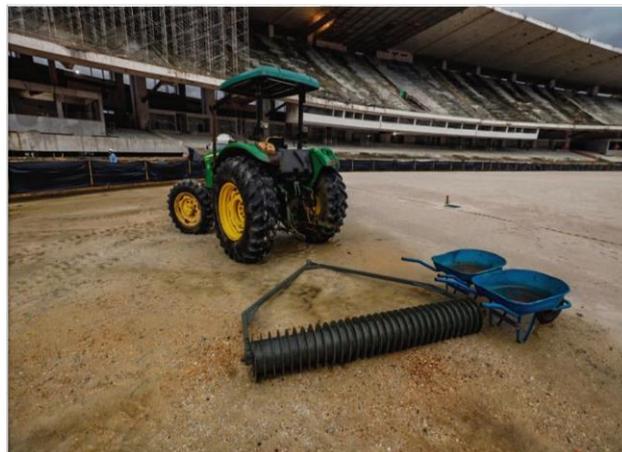


FOTO 78: PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA RECEBIMENTO DA NOVA GRAMA

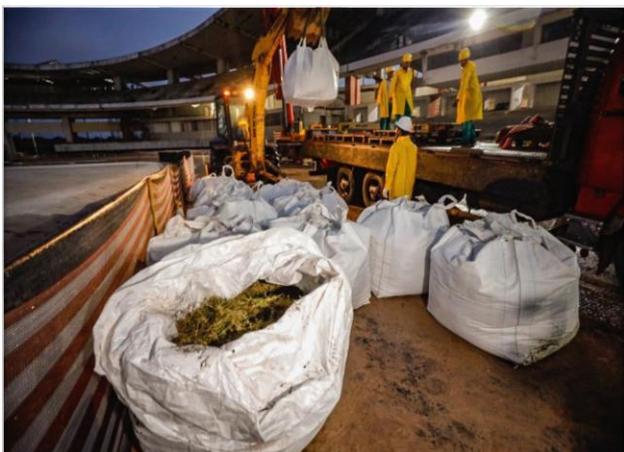


FOTO 79: RECEBIMENTO DA GRAMA *BERMUDA CELEBRATION* PARA INÍCIO DO PLANTIO

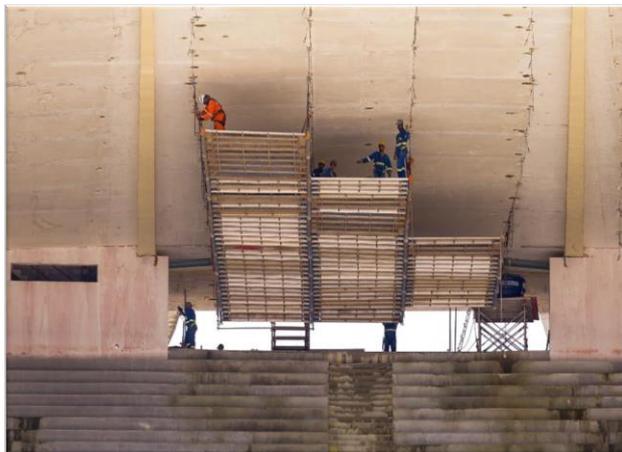


FOTO 80: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL



FOTO 81: NOVA ARQUIBANCADA INSTALADA

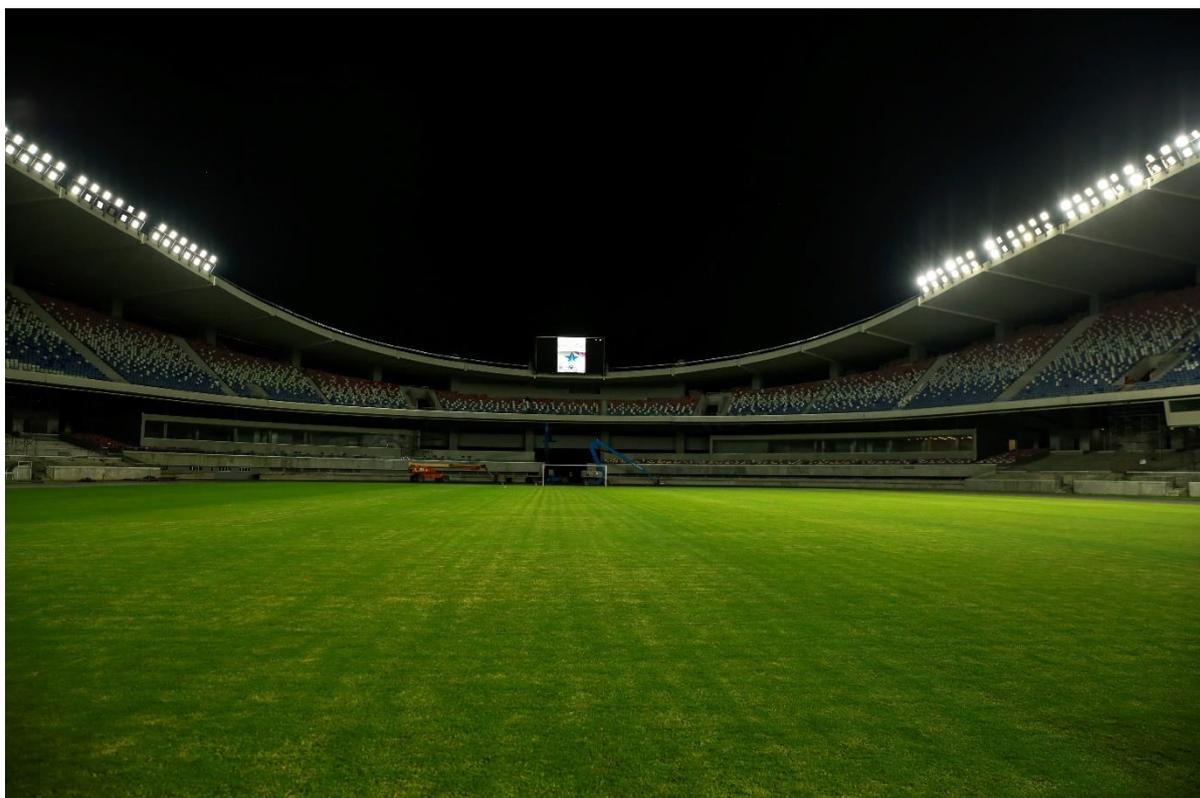


FOTO 82: TESTE DE ILUMINAÇÃO DOS GRAMADOS

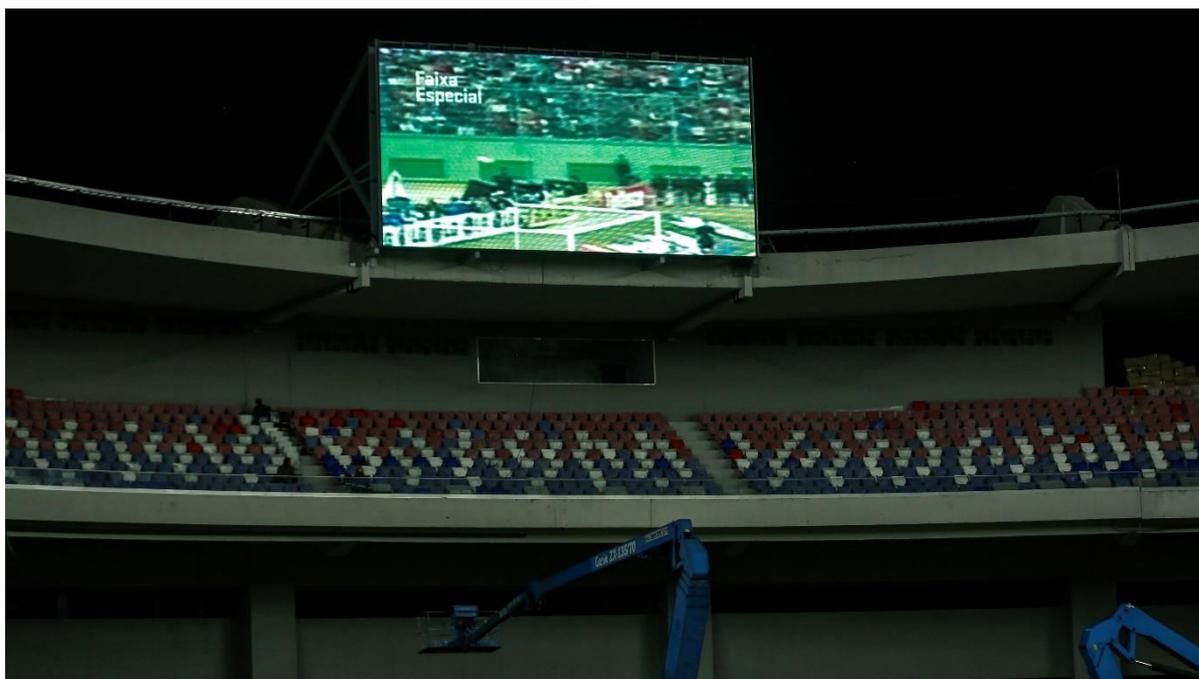


FOTO 83: TESTE DOS PLACARES ELETRÔNICOS E DA SONORIZAÇÃO

2.2. AÇÕES QUE CONTRIBUEM PARA O ALCANCE DAS METAS DOS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)

2.2.1. ALINHAMENTO DAS AÇÕES DA SEDOP COM AS METAS ODS

Dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis (ODS), que constam na Agenda 2030¹, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP) coopera com o Governo do Pará para o alcance de 23 metas, através da execução de Ações Governamentais que impactam diretamente em 10 ODS. A tabela abaixo relaciona os 10 ODS com as respectivas ações governamentais:

PROGRAMA GOVERNAMENTAL		
1489. DESENVOLVIMENTO URBANO – HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MOBILIDADE		
OBJETIVO 02: PROMOVER E DISPONIBILIZAR AOS USUÁRIOS O ACESSO A SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO		
SÍMBOLO	OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)	AÇÕES GOVERNAMENTAIS
	OBJETIVO 01: ERRADICAÇÃO DA POBREZA	AÇÃO 7480. MACRODRENAGEM DA BACIA DO TUCUNDUBA
	OBJETIVO 03: SAÚDE E BEM-ESTAR	AÇÃO 7567. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
	OBJETIVO 06: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO	AÇÃO 7568. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
	OBJETIVO 09: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA	AÇÃO 7642: OFERTA DE UNIDADE HABITACIONAL
	OBJETIVO 11: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	AÇÃO 7644. IMPLANTAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS
	OBJETIVO 12: CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS	AÇÃO 8692. APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO

¹ A Agenda 2030 é um compromisso global assumido em 2015 por 193 países, incluindo o Brasil. A agenda é coordenada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e propõe a ação de governos, de instituições, de empresas e da sociedade em geral para o enfrentamento dos maiores desafios do mundo contemporâneo. (Fonte: www.agenda2030.com.br).

PROGRAMA GOVERNAMENTAL		
1489. DESENVOLVIMENTO URBANO – HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MOBILIDADE		
OBJETIVO 03: DISPONIBILIZAR O ACESSO AOS SERVIÇOS URBANOS DE MOBILIDADE E ORDENAMENTO TERRITORIAL		
SÍMBOLO	OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)	AÇÕES GOVERNAMENTAIS
	OBJETIVO 01: ERRADICAÇÃO DA POBREZA	AÇÃO 7608. CONSTRUÇÃO DE PARQUES URBANOS AÇÃO 7645. PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS AÇÃO 7646. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GOVERNANÇA METROPOLITANA AÇÃO 8463. APOIO ÀS AÇÕES DO CONCIDADES AÇÃO 8694. APOIO TÉCNICO-INSTITUCIONAL NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO
	OBJETIVO 03: SAÚDE E BEM-ESTAR	
	OBJETIVO 06: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO	
	OBJETIVO 09: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA	
	OBJETIVO 10: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	
	OBJETIVO 11: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	

PROGRAMA GOVERNAMENTAL		
1508. GOVERNANÇA PÚBLICA		
OBJETIVO 03: PROMOVER A GESTÃO REGIONALIZADA		
SÍMBOLO	OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)	AÇÕES GOVERNAMENTAIS
	OBJETIVO 09: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA	AÇÃO 7556. APOIO À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS DE UTILIZAÇÃO PÚBLICA AÇÃO 8890. FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL
	OBJETIVO 11: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	
	OBJETIVO 17: PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO	

PROGRAMA GOVERNAMENTAL		
1499. ESPORTE E LAZER		
OBJETIVO 01: AMPLIAR O ACESSO AO ESPORTE E AO LAZER, PROMOVEDO A CIDADANIA E A INCLUSÃO SOCIAL		
SÍMBOLO	OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)	AÇÕES GOVERNAMENTAIS
	OBJETIVO 01: ERRADICAÇÃO DA POBREZA	AÇÃO 7556. APOIO À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS DE UTILIZAÇÃO PÚBLICA AÇÃO 8890. FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL
	OBJETIVO 10: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	

PROGRAMA GOVERNAMENTAL		
1498. INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO		
OBJETIVO 03: PROMOVER O TURISMO COMO ATIVIDADE ECONÔMICA		
SÍMBOLO	OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)	AÇÕES GOVERNAMENTAIS
	OBJETIVO 08: TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO	AÇÃO 7658. IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS

Para o desenvolvimento destes programas, foi necessário investir mais de dois Bilhões de Reais, mais precisamente R\$ 2.194.240.077,54¹ ao longo do ano de 2022, distribuídos em quatro programas: 1) Desenvolvimento Urbano – Habitação, Saneamento e Mobilidade; 2) Esporte e Lazer; 3) Governança Pública e 4) Indústria, Comércio, Serviços e Turismo.

Os principais resultados deste investimento, bem como sua relação com o alcance das metas e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) estão consolidados na tabela abaixo.

PROGRAMA 1489. DESENVOLVIMENTO URBANO – HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MOBILIDADE

OBJETIVO 2: PROMOVER E DISPONIBILIZAR AOS USUÁRIOS O ACESSO AO SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO.

AÇÃO	PRINCIPAIS ENTREGAS	OBJETIVO ODS	META ODS
7480. MACRODRENAGEM DA BACIA DO TUCUNDUBA	<ul style="list-style-type: none"> - CORREÇÃO DA ESTRUTURA DO CANAL PARA VAZÃO DA ÁGUA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES INFANTIS E QUADRA DE ESPORTE 	<ul style="list-style-type: none"> 1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3. SAÚDE E BEM-ESTAR 6. ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO 9. INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 	1.4, 1.5, 3.3, 3.9, 6.1, 6.3, 9.1 e 11.5.
7567. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	3.704 LIGAÇÕES DOMICILIARES REALIZADAS	<ul style="list-style-type: none"> 1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3. SAÚDE E BEM-ESTAR 6. ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO 	1.4, 1.5, 3.3, 3.9, 6.1, 6.2 e 6.3
8692. APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO	01 INSTRUMENTO ELABORADO	<ul style="list-style-type: none"> 1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3. SAÚDE E BEM-ESTAR 6. ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO 	1.4, 1.5, 3.3, 3.9, 6.1, 6.2 e 6.3

¹ FONTE SIGPLAN MONITORAMENTO – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA – DEZEMBRO/2022.

OBJETIVO 3: DISPONIBILIZAR O ACESSO AOS SERVIÇOS URBANOS DE MOBILIDADE E ORDENAMENTO TERRITORIAL

AÇÃO	PRINCIPAIS ENTREGAS	OBJETIVO ODS	META ODS
7645. PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS	920 KM DE VIAS PAVIMENTADAS	1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3. SAÚDE E BEM-ESTAR 10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	1.4, 3.6, 10.2 e 11.2
8694. APOIO TÉCNICO-INSTITUCIONAL NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO	11 INSTRUMENTOS ELABORADOS	10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	10.3, 11.2, 11.3 e 11.a

PROGRAMA 1508. GOVERNANÇA PÚBLICA

OBJETIVO 3: PROMOVER A GESTÃO REGIONALIZADA

AÇÃO	PRINCIPAIS ENTREGAS	OBJETIVO ODS	META ODS
7556. APOIO À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS DE UTILIZAÇÃO PÚBLICA	04 OBRAS REALIZADAS	11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	11.7
8890. FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL	04 MUNICÍPIO ATENDIDO	9. INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 17. PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO	9.1, 11.7 e 17.7

OBJETIVO 4: PROVER A GOVERNABILIDADE DO PODER EXECUTIVO

AÇÃO	PRINCIPAIS ENTREGAS	OBJETIVO ODS	META ODS
7552. CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS ESTADUAIS	02 OBRAS REALIZADAS	16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES	16.6

2.3. DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SEDOP

2.3.1. PROGRAMA DESENVOLVIMENTO URBANO – HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MOBILIDADE

2.3.1.1. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO ARAGUAIA					
MUNICÍPIOS PLANEJADOS: FLORESTA DO ARAGUAIA, SÃO FÉLIX DO XINGU.					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2022	NÃO FOI PREVISTO CONCLUSÃO DE OBRA EM 2022

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Em 2022, para a Região Araguaia, a Sedop planejou atender os municípios de Floresta do Araguaia e São Félix do Xingu com obras de sistema de abastecimento de água. Desde a elaboração do PPA 2020/2023, os referidos municípios foram inseridos como proposição para ampliar a área de atuação do Governo do Estado na Região Araguaia, sendo mantidos até o exercício atual como esforço da Sedop em contemplar, nos instrumentos de planejamento, municípios paraenses com os menores índices de atendimento com rede de abastecimento de água.

Embora para o ano de 2022 não tenham sido estabelecidas metas (números de ligações domiciliares), o fato das tratativas previstas para início das obras nos municípios de Floresta do Araguaia e São Félix do Xingu não terem se concretizado, certifica o baixo desempenho físico da Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água na Região Araguaia no ano de 2022.

Ainda sobre o baixo desempenho físico, é preciso ressaltar que o mesmo está diretamente ligado à baixa ou nenhuma evolução das obras nesta região e não diretamente à obtenção de meta física, uma vez que as mesmas não foram programadas para o ano de 2022.

Quanto ao desempenho financeiro, como as obras previstas não puderam ser iniciadas em 2022, a execução orçamentária nesta região traduziu-se no apoio técnico prestado aos profissionais da Sedop com despesas referentes a passagens, diárias, etc.

Finalizando, e tendo em vista que a execução física e financeira da *Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água* na Região Araguaia não aconteceu conforme o programado nos instrumentos de Planejamento Público (PPA 2020/2023 e LOA 2022), o conceito conferido a mesma para o ano de 2022 foi *Abaixo do Esperado*.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO BAIXO AMAZONAS					
MUNICÍPIOS PLANEJADOS: BELTERRA, FARO, ÓBIDOS, PRAINHA					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2022	5.865 LIGAÇÕES

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Os municípios planejados pela Sedop para a execução de obras de sistema de abastecimento de água na Região Baixo Amazonas, em 2022, foram: Belterra, Faro, Óbidos e Prainha. No que diz respeito ao município de Belterra, não foi estabelecida meta física (número de ligações domiciliares) para o ano de 2022.

É necessário esclarecer que, no que diz respeito às ações governamentais voltadas para à realização de obras de Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário, as metas físicas são estabelecidas mediante a previsão de conclusão das obras. Como não foi programada a conclusão de obra no município de Belterra, para o ano de 2022, não houve número de ligações domiciliares estabelecidas como meta física a ser alcançada pelo município.

Segundo orientações da Seplad, não havendo meta física programada, para que não houvesse incoerência no Sistema (SigPlan) entre *Meta Física Programada X Orçamento Programado*, instituiu-se que, os municípios que não teriam produtos alcançados no exercício atual, teriam como meta estabelecida uma unidade, o que acabou sendo contabilizado equivocadamente para o número total de ligações domiciliares na Região do Baixo Amazonas.

Outra situação que necessita de esclarecimento por impactar diretamente na meta estabelecida, é o atendimento de municípios não programados que, por estarem relacionados a emendas parlamentares, são inseridos pela Seplad nos instrumentos de planejamento na fase de aprovação dos mesmos. Um exemplo disso, nesta região, é o município de Alenquer, o qual foi contemplado com a meta física de uma unidade, tal como foi feito com o município de Belterra, conforme explicado acima.

Sendo assim, embora o sistema apresente como meta física estabelecida pela Sedop para a Região Baixo Amazonas o número de 5.867, a meta física correta é de 5.865 ligações domiciliares, nesta região, para o ano de 2022. Feito os devidos esclarecimentos, a seguir será apresentada a evolução das obras em execução na Região do Baixo Amazonas.

No município de Belterra, não houve avanço nas tratativas para que a obra fosse iniciada, conforme o planejado para o ano de 2022, permanecendo o processo na fase de início de elaboração do projeto básico e executivo.

Em Prainha, por conta do tempo demandado para realizar a compatibilização do projeto com a situação atual da obra, não houve possibilidade de seguir com o cronograma físico e financeiro proposto para o ano de 2022. No entanto, o processo licitatório já foi iniciado, estando na fase de habilitação das empresas e, com este cenário, a previsão de conclusão passa para 2023.

Com relação à obra prevista para ser concluída no município de Faro, a mesma manteve o status de paralisada, devido a não finalização do processo licitatório para posterior retomada das obras.

Em Óbidos, após a finalização do processo licitatório, a obra foi iniciada no segundo semestre de 2021. No entanto, a mesma encontra-se com evolução aquém do planejado no cronograma físico e financeiro, o que acaba por postergar a sua conclusão para o ano de 2023.

Por outro lado, a Sedop também atendeu os municípios de Juruti e Santarém com execução de obras de sistema de abastecimento de água, embora não tenham sido contemplados nos instrumentos de planejamento da Sedop para o ano de 2022. Em ambos os municípios, foram celebrados convênios com as Prefeituras Municipais, as quais são responsáveis pela consecução dos objetos pactuados.

No município de Juruti, trata-se da *“Construção de cinco microssistemas localizados nas comunidades Alemanha, Aparecida, Cipó, Miri Central e Areal III”*, que beneficiará cerca de 1.850 pessoas. Em Santarém, a obra é de *“Implantação, Ampliação e Reforma de Sistema de Abastecimento de Água em Comunidades Rurais – Pindaroba, Paisandu, Flamenginho, Vila Nova, Pajurá, Lírio dos Vales e São Pedro”* que, após concluída, beneficiará 5.085 pessoas. As obras serão executadas através de destaque orçamentário com recursos oriundos de demanda governamental e têm conclusão prevista para o segundo semestre de 2023.

Diante desta perspectiva, a meta de 5.865 ligações domiciliares previstas para Região do Baixo Amazonas no ano de 2022 não foi alcançada, certificando o baixo desempenho físico da Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água na região.

Com relação à execução financeira, a dotação programada de R\$ 6.489.851,00¹ para o desenvolvimento desta ação na Região do Baixo Amazonas, no exercício de 2022, foi atualizada para R\$ 6.701.713,97², ultrapassando em R\$ 211.862,97 o orçamento programado.

Por fim, diante deste contexto, a *Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água* não teve o desempenho físico e financeiro em consonância com o que foi programado para a Região do Baixo Amazonas em 2022, atribuindo desta forma ao desenvolvimento desta ação um desempenho *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO CARAJÁS					
MUNICÍPIOS PLANEJADOS: PALESTINA DO PARÁ, PIÇARRA, SÃO JOÃO DO ARAGUAIA					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2022	711 LIGAÇÕES

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Para o ano de 2022, a Sedop programou o atendimento dos municípios de Palestina do Pará, Piçarra e São João do Araguaia na Região Carajás. No entanto, apenas para o município de Piçarra foi planejada a conclusão da obra de Sistema de Abastecimento de Água, proporcionando 711 ligações domiciliares para a população local.

Nos municípios de Palestina do Pará e São João do Araguaia, não houve previsão para conclusão de obras em 2022. No entanto, vale a pena esclarecer que, segundo orientação da Seplad, para que não houvesse incoerência no Sistema SigPlan de Meta Física Programada (0 Ligação) com Orçamento Programado, instituiu-se que, os municípios que não teriam produtos alcançados no exercício atual, teriam como meta estabelecida uma unidade, o que acabou sendo contabilizado, equivocadamente, para o número total de ligações domiciliares na Região Carajás.

Neste sentido, embora o sistema apresente como meta física estabelecida pela Sedop, para a Região do Carajás, o número de 713, a meta física correta é de *711 ligações domiciliares nesta região para o ano de 2022*. Feito os devidos esclarecimentos, a seguir será apresentada a evolução das obras em execução.

Com relação à obra em desenvolvimento no município de Palestina do Pará, apesar de ter sido retomada no primeiro semestre de 2022, não teve a evolução física no decorrer do ano em conformidade com o planejado no cronograma físico e financeiro, atingindo o percentual de execução física de 62,41%, Abaixo do Esperado.

Quanto à *“Implantação do Sistema de Abastecimento de Água”* no município de Piçarra, a conclusão da obra que estava prevista para dezembro de 2022 não aconteceu. A obra não teve evolução satisfatória e o contrato com a empresa executora está em processo de rescisão. A prefeitura Municipal já iniciou o processo para celebrar convênio com a Sedop, objetivando a conclusão do sistema de abastecimento de água no ano de 2023.

Esta situação impactou diretamente na não obtenção da meta física estabelecida para a região, que seria alcançada justamente com a conclusão da obra no município de Piçarra, através da entrega de 711 ligações domiciliares à população até dezembro de 2022.

Quanto à obra programada para o município de São João do Araguaia, a mesma faz parte da relação de obras novas mantidas pela Sedop, desde a elaboração do PPA 2020/2023, com o intuito de ampliar a área de atuação do Governo do Estado na Região dos Carajás. No entanto, as tratativas previstas para que a obra iniciasse em 2022 não se concretizaram, postergando para outro momento o atendimento do município por esta ação.

Outro município que, embora não tenha sido planejado pela Sedop para ser atendido durante o ano de 2022, teve execução e conclusão da obra de *“Construção de Microssistema de Abastecimento de Água Vila Palmares, Zona Sul”*, foi Parauapebas.

Executada através de destaque orçamentário com recursos oriundos de emenda parlamentar, o microssistema utiliza o lençol subterrâneo como manancial e a captação da água é feita através de um poço com uma bomba submersa instalada que transfere a água para um reservatório de 10m³. Apesar de não contemplar ligações domiciliares, a população local é atendida através de um chafariz construído junto ao reservatório, o qual possui quatro torneiras como pontos de fornecimento de água potável para uso comum da comunidade. Esse microssistema tem capacidade para atender cerca de 181 pessoas até o ano de 2030.

No que diz respeito ao desempenho financeiro, para o ano de 2022 foram programados R\$ 1.872.824,00¹ para o atendimento das obras planejadas para a Região dos Carajás, sendo executados R\$ 2.329.528,08², majorando o orçamento programado em R\$ 456.704,08, o que se justifica pela limitação do Teto Orçamentário disponibilizado para a Sedop, o qual ficou abaixo da real necessidade para a execução das obras, sendo indispensável, desta forma, o acréscimo supracitado.

Por fim, levando em conta o contexto apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água* na Região Carajás, no exercício de 2022, ficou *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO GUAJARÁ

MUNICÍPIO PLANEJADO: BELÉM

PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2022	101 LIGAÇÕES
----------------	-------------------------------------	----------------	-----------	------------------	---------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Na Região do Guajará, o desenvolvimento da *Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água* planejado para o ano de 2022, concentrou-se no município de Belém, para a execução da obra de *“Conclusão da Reabilitação da Rede de Distribuição de Água do 4º Setor”* e para o início das obras de Sistema de Abastecimento de Água, atendendo a população das ilhas do Combu, Murutucu e Ilha Grande.

No que diz respeito à *“Conclusão da reabilitação da rede de distribuição de água do 4º Setor”*, em 2022, permaneceu o mesmo status informado no Relatório de Gestão - Ano de 2021, no qual é informado que a Cosanpa realizou a substituição das redes de distribuição existentes, como também, as ligações domiciliares, o que motivou o cancelamento do contrato.

Quanto à construção de sistema de abastecimento de água para beneficiar a população residente nas ilhas do Combu, Murutucu e Ilha Grande, a empresa responsável pela elaboração dos Projetos Básicos e Executivos já concluiu o projeto básico e está em fase de elaboração do projeto executivo.

Ainda no município de Belém, estão em execução os serviços remanescentes e complementares para *“Conclusão do sistema de captação e reservação de água na Comunidade Pantanal”*. Embora a obra não tenha sido contemplada nos instrumentos de planejamento da Sedop, a mesma apresenta evolução de acordo com o cronograma físico e financeiro e tem previsão para ser concluída em 2023.

Outro município da Região do Guajará que não foi contemplado nos instrumentos de planejamento, mas teve execução de obra em 2022, foi Ananindeua. Trata-se da obra de *“Recuperação de Rede de Água Danificada na Avenida Independência – Setor PAAR”*, a qual, embora tenha sido retomada no ano de 2021, encontra-se com evolução física Abaixo do Esperado, postergando desta forma sua conclusão para o ano de 2023.

Quanto à execução financeira, do valor programado de R\$ 1.704.901,00¹ para atender a região, foram utilizados R\$ 1.375.799,17², o que corresponde a 80,6% do orçamento programado.

Por fim, levando em consideração todas as situações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água* na Região Guajará, durante o ano de 2022, esteve *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO GUAMÁ					
MUNICÍPIOS PLANEJADOS: MARACANÃ E SÃO FRANCISCO DO PARÁ					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2022	NÃO FOI PREVISTO CONCLUSÃO DE OBRA EM 2022

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Na Região de Integração do Guamá, os municípios de Maracanã e São Francisco do Pará foram programados para serem atendidos com obras de sistema de abastecimento de água. Entretanto, ressalta-se que, como não foi programada a conclusão de obras nestes municípios para o ano de 2022, não ficou estabelecida meta física para a região, uma vez que a proposição de metas é diretamente proporcional à conclusão de obras.

Ressaltamos ainda que, segundo a orientação da Seplad, para que não houvesse incoerência no Sistema SigPlan de Meta Física Programada (0 Ligação) com Orçamento Programado, instituiu-se que, os municípios que não teriam produtos alcançados no exercício atual, deveriam ter como meta estabelecida uma unidade, o que acabou sendo contabilizado, equivocadamente, no SigPlan como total de duas ligações domiciliares na Região do Guamá.

Com relação à obra desenvolvida no município de Maracanã, em 2022, a mesma seguiu em conformidade com o cronograma físico e financeiro e tem conclusão prevista para o primeiro semestre de 2023.

No que diz respeito ao município de São Francisco do Pará, os embargos que impedem a continuidade desta obra ainda não foram solucionados, o que mantém a obra com status de *paralisada*. Mais uma vez, ressaltamos que a resolutividade destes embargos não está completamente sob a governabilidade da Sedop.

Ainda em 2022, foram executadas obras em municípios que não estavam programados, como em Santo Antônio do Tauá. Trata-se de uma das obras de Sistema de Abastecimento de Água, contempladas com recurso PAC Funasa, e que, após anos paralisada, pôde finalmente ser concluída, beneficiando cerca de 30.488 habitantes dos bairros do Pina, Barro Branco, Barcelona, da Quinta, Churupita e Sol Nascente, através da captação de dois poços e um reservatório de 1.000 m³, com rede de distribuição de 10.222,5 m e 1.975 ligações domiciliares.

Outros municípios não programados, mas atendidos pela Sedop com obras de sistema de abastecimento de água, encontram-se relacionados na tabela abaixo:

Nº	MUNICÍPIO	Nº CONVÊNIO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR GLOBAL
1	COLARES	232/2022	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO JANGOLÂNDIA	R\$ 378.682,12
2	MAGALHÃES BARATA	244/2022	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE CAFEZAL	R\$ 522.996,43
3	SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	209/2022	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$ 6.148.752,43
TOTAL				R\$ 7.050.430,98

Em todos estes municípios, foram celebrados Convênios de Cooperação Técnica com a Sedop, a qual tem como obrigação principal a transferência do recurso oriundo de demanda governamental para as prefeituras municipais, enquanto que estas são responsáveis pela consecução do objeto pactuado no convênio. As obras foram iniciadas no segundo semestre de 2022 e encontram-se com a evolução em conformidade com o cronograma físico e financeiro, com conclusão prevista para 2023.

Além dos municípios atendidos por convênios, também houve execução de obra no município de Terra Alta (execução direta), através da contratação de empresa de engenharia especializada para a “Conclusão do Sistema de Abastecimento de Água”. A obra segue com evolução física e financeira conforme programado no cronograma e tem previsão para ser concluída em 2023.

Para a implementação da *Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água na Região do Guamá*, durante o ano de 2022, foi programado orçamento no valor de R\$ 632.676,00¹, tendo sido executado o montante de R\$ 3.040.470,86, o que representa uma majoração de R\$ 2.407.794,86, que se justifica pela necessidade de atender os municípios citados.

Finalizando, embora não tenha sido estabelecida meta física a ser alcançada nesta região para o ano de 2022, a conclusão da obra no município de Santo Antônio do Tauá possibilitou a entrega de 1.975 ligações domiciliares à população local e contribuiu para que o desempenho da *Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água na Região Guamá* no exercício de 2022 fosse *Conforme Programado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO LAGO DE TUCURUÍ

MUNICÍPIOS PLANEJADOS: BREU BRANCO, GOIANÉSIA DO PARÁ E NOVO REPARTIMENTO

PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2022	NÃO FOI PREVISTO CONCLUSÃO DE OBRA EM 2022
---------	------------------------------	---------	----	-----------	--

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Na Região de Integração do Lago de Tucuruí, os municípios planejados para o exercício de 2022 foram Breu Branco, Goianésia do Pará e Novo Repartimento. Entretanto, vale a pena ressaltar que, como não foi programada a conclusão de obras nestes municípios, para o ano de 2022, não ficou estabelecida meta física para a região, uma vez que, a proposição das metas é diretamente proporcional à conclusão de obras.

Ressaltamos que, segundo orientação da Seplad, para que não houvesse incoerência no Sistema SigPlan de Meta Física Programada (0 Ligação) com Orçamento Programado, instituiu-se que, os municípios que não teriam produtos alcançados no exercício atual, teriam como meta estabelecida uma unidade, o que acabou sendo contabilizado equivocadamente no SigPlan como total de três ligações domiciliares na Região do Lago de Tucuruí.

Com relação à obra referente ao município de Breu Branco, a mesma faz parte da relação de obras contempladas pelo TC PAC Funasa e continua aguardando início de um novo processo licitatório. Ressaltamos, ainda, que a resolutividade dos embargos que impedem a continuidade das obras não está exclusivamente sob a governabilidade da Sedop.

Quanto à obra relacionada ao município de Goianésia do Pará, a mesma teve o processo licitatório finalizado, contrato celebrado com a empresa vencedora e ordem de serviço assinada em outubro de 2021, com previsão de conclusão para o 1º semestre de 2023.

No que diz respeito à obra programada para o município de Novo Repartimento, a mesma faz parte da relação de obras novas, com o intuito de ampliar a área de atuação do Governo do Estado na Região Lago de Tucuruí. No entanto, as tratativas previstas para que a obra iniciasse em 2022 não se concretizaram. Embora para o ano de 2022 não tenham sido estabelecidas metas (número de ligações domiciliares), o fato de as obras não terem tido o desenvolvimento de acordo com o programado, certifica o baixo desempenho físico da *Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água* na Região Lago de Tucuruí.

Com relação ao desempenho financeiro, do orçamento programado para o desenvolvimento desta ação na Região Lago de Tucuruí, no valor de R\$ 5.021.613,00¹, foram utilizados R\$ 1.651.738,63², correspondente a cerca de 32,8% do valor orçamentário planejado.

Por último, considerando o cenário apresentado na Região Lago de Tucuruí, o desempenho físico e financeiro da Ação 7567. *Realização de Obras de Abastecimento de Água* durante o exercício de 2022 esteve *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO MARAJÓ

MUNICÍPIOS PLANEJADOS: ANAJÁS, BAGRE, OEIRAS DO PARÁ, PORTEL, SALVATERRA E SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.

PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2022	5.826 LIGAÇÕES
---------	------------------------------	---------	----	-----------	----------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Na Região de Integração do Marajó, em 2022, os municípios com metas planejadas pela SEDOP para o desenvolvimento de obras de abastecimento de água foram Anajás, com 2.428 ligações domiciliares, Oeiras do Pará, com 2.200 ligações domiciliares, e São Sebastião da Boa Vista, com 1.198 ligações domiciliares.

Em Bagre, Portel e Salvaterra, não houve obra prevista para ser concluída em 2022 e, conseqüentemente, não houve o estabelecimento de meta física. No entanto, vale a pena esclarecer que, segundo orientação da Seplad, para que não houvesse incoerência no Sistema SigPlan entre *Meta Física Programada X Orçamento Programado*, instituiu-se que, os municípios que não teriam produtos alcançados no exercício atual, teriam como meta estabelecida uma unidade, o que acabou sendo contabilizado equivocadamente para o número total de ligações domiciliares na Região do Marajó.

Outra situação que necessita de esclarecimento, por impactar diretamente na meta estabelecida, são os municípios não programados, mas que, por se tratarem de emendas parlamentares, são inseridos pela Seplad nos instrumentos de planejamento na fase de aprovação dos mesmos. Um exemplo disso, nesta região, é o município de Breves, com meta de 100 ligações domiciliares, e os municípios de Muaná e Oeiras do Pará, contemplados com meta física de uma unidade cada.

Sendo assim, embora o sistema apresente como meta física estabelecida pela Sedop para a Região do Marajó o número de 5.931, a meta física correta é de 5.826 ligações domiciliares nesta região para 2022. Feito os devidos esclarecimentos, a seguir será apresentada a evolução das obras.

No que diz respeito à obra no município de Anajás, embora tenha sido retomada em 2021, com previsão de entrega para 2022, a continuidade está diretamente ligada à montagem da Estação de Tratamento de Água (ETA) de uma outra obra em execução no referido município. Como as duas obras se complementam, o atraso na montagem da ETA, interferiu diretamente na continuidade da obra em questão, uma vez que, para realizar as

etapas referentes às testagens no sistema de captação, reservação, tratamento e distribuição, a ETA precisa estar devidamente instalada.

Esta situação interferiu no cumprimento do cronograma físico e financeiro programado para o ano de 2022, contribuindo desta forma para que a “Conclusão do Sistema de Abastecimento de Água” fosse adiada para 2023.

Quanto ao município de Bagre, foi celebrado um convênio de Cooperação Técnica com a Sedop, cujo objeto é “*Implantação de Sistema de Abastecimento de Água – 1ª Etapa*”, no qual a Prefeitura Municipal é a responsável pela consecução do objeto pactuado. A obra foi iniciada no segundo semestre de 2022 e tem conclusão prevista para 2023.

Em Oeiras do Pará, a obra foi retomada em 2021 e seguiu com evolução conforme o programado durante o ano de 2022, sendo concluída no mês de setembro, beneficiando cerca de 11.000 pessoas. É importante registrar que a obra teve como objetivo ampliar a capacidade dos reservatórios e do sistema de produção já existentes, não havendo incremento no número de ligações domiciliares, sendo este o motivo da informação não estar inserida no campo físico do SigPlan – Monitoramento.

Com relação à obra prevista no município de Portel, a mesma é de proposição da Sedop, objetivando ampliar a área de atuação do Governo do Estado na Região do Marajó, contemplando, nos instrumentos de planejamento, municípios paraenses com os menores índices de atendimento com rede de abastecimento de água. No entanto, não houve avanço nas tratativas de modo a configurar o início da obra.

Quanto à obra que envolve a construção de Sistema de Abastecimento de Água em Salvaterra, a empresa responsável pela elaboração dos projetos já concluiu o Projeto Básico e está em fase de elaboração do Projeto Executivo.

No que diz respeito ao município de São Sebastião da Boa Vista, foi concluído o contrato, porém não houve a conclusão de ligações. Para alcançar a etapa de execução de ligações domiciliares foi iniciado um novo contrato a fim de viabilizar a conclusão da obra.

Ainda em 2022, houve execução de duas obras no município de Afuá e duas em Soure, municípios estes que, embora não tenham sido programados nos instrumentos de planejamento, concretizaram suas demandas no decorrer do ano, requerendo atendimento por parte da Sedop.

No município de Afuá, foi concluído, com recurso do tesouro estadual, o sistema de abastecimento de água (PAC Funasa), depois de mais de uma década de paralisação. Com 1.729 ligações domiciliares, o sistema possibilitou o acesso à água de qualidade a cerca de 14.500 moradores do município.

As demais obras, tanto de Afuá quanto de Soure, são objetos de convênios de Cooperação Técnica com obras já iniciadas e conclusão prevista para 2023. A tabela a seguir sintetiza as principais informações relacionadas a estes convênios:

Nº	MUNICÍPIO	Nº CONVÊNIO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR GLOBAL
1	AFUÁ	049/2022	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO CAPIM MARINHO	R\$ 7.103.939,83
2	SOURE	138/2022	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA 4ª RUA	R\$ 549.894,27
	SOURE	48/2022	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DOS BAIRROS	R\$ 1.898.715,63
TOTAL				R\$ 9.552.549,73

Com relação ao desempenho financeiro, a dotação inicial para o desenvolvimento desta ação na Região Marajó, no valor de R\$ 4.249.691,00¹, foi atualizada para R\$ 14.092.372,70², ultrapassando R\$ 9.842.681,70 do valor orçamentário planejado. O montante ultrapassado é justificado pela limitação do teto orçamentário disponibilizado para a Sedop, o qual ficou abaixo da real necessidade para a execução dos serviços relacionados às obras, sendo indispensável, desta forma, o acréscimo supracitado.

Por último, considerando o alcance de apenas 29,63% da meta estabelecida, com a entrega de 1.729 ligações domiciliares no município de Afuá, em 2022, a *Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água* na Região Marajó apresentou o desempenho físico e financeiro *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO RIO CAETÉ

MUNICÍPIO PLANEJADO: QUATIPURU

PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2022	380 LIGAÇÕES
----------------	------------------------------	----------------	----	------------------	--------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Em 2022, na Região de Integração do Rio Caeté, o único município programado pela Sedop e com meta estabelecida foi o município de Quatipuru com 380 ligações domiciliares. Os demais municípios são municípios não programados, mas que, por se tratarem de emendas parlamentares, foram inseridos pela Seplad nos instrumentos de planejamento da Sedop na fase de aprovação dos mesmos. São eles: Augusto Corrêa, com 86 ligações domiciliares, Bragança, com 172 ligações, Salinópolis, 650 ligações, São João de Pirabas, 01 ligação, e Tracuateua com 86 ligações.

Sendo assim, embora o sistema apresente como meta física para a Região Rio Caeté, o número de 1.375, a meta física estabelecida pela Sedop foi de 380 ligações domiciliares nesta região para o ano de 2022. Com os devidos esclarecimentos, a seguir será apresentada a evolução das obras na Região do Rio Caeté.

A obra de *“Implantação do Sistema de Abastecimento de Água”* no município de Quatipuru, mesmo apresentando evolução física no decorrer do ano de 2022, manteve-se com desempenho Abaixo do Esperado no cronograma físico e financeiro, interferindo diretamente no fato da obra não ter sido concluída e, conseqüentemente, do município não ter sido beneficiado com as 380 ligações domiciliares. A expectativa é que a obra seja concluída no ano de 2023.

Outro município não programado, mas que foi atendido pela Sedop com obras de sistema de abastecimento de água, encontra-se na tabela abaixo:

Nº	MUNICÍPIO	Nº CONVÊNIO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR GLOBAL
1	WISEU	11/2022	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO FERNANDES BELO	R\$ 5.844.417,46
TOTAL				R\$ 5.844.417,46

Neste município, foi celebrado um convênio de Cooperação Técnica com a Sedop, a qual tem como obrigação principal a transferência do recurso oriundo de demanda governamental para a Prefeitura Municipal, enquanto que esta é a responsável pela consecução do objeto

pactuado no convênio. A obra foi iniciada no segundo semestre e encontra-se com a evolução em conformidade com o cronograma físico e financeiro, com conclusão prevista para 2023.

Com relação à execução financeira, o valor programado de R\$ 3.320.000,00¹ para atender a Região Rio Caeté, foi atualizado para R\$ 5.999.819,85², ultrapassando o valor orçamentário planejado em R\$ 2.679.819,85. Esta divergência ocorre principalmente devido à limitação do teto orçamentário disponibilizado para a Sedop, o qual não traduz a real necessidade para a execução da obra.

Por fim, considerando que a meta física acordada para a região não foi alcançada, e que esta situação influencia diretamente no baixo desempenho da *Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água* na Região Rio Caeté, o status obtido na referida região no exercício de 2022 foi *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO RIO CAPIM					
MUNICÍPIOS PLANEJADOS: IRITUIA E NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2022	NÃO FOI PREVISTO CONCLUSÃO DE OBRA EM 2022.
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022					
<p>Irituia e Nova Esperança do Piriá foram os municípios programados pela Sedop para serem atendidos pela <i>Ação 7567. Realização de obras de Sistema de Abastecimento de Água</i>. Entretanto, vale a pena ressaltar que, como não foi programada a conclusão de obras nestes municípios, para o ano de 2022, não ficou estabelecida meta física para a Região de Integração Rio Capim, uma vez que, a proposição das metas é diretamente proporcional à conclusão de obras.</p> <p>Ressaltamos que, segundo orientação da Seplad, para que não houvesse incoerência no Sistema SigPlan de Meta Física Programada (0 Ligação) com Orçamento Programado, instituiu-se que, os municípios que não teriam produtos alcançados no exercício atual, teriam como meta estabelecida uma unidade, o que acabou sendo contabilizado equivocadamente no SigPlan como total de duas ligações domiciliares na Região Rio Capim.</p> <p>No ano de 2022, a obra de <i>“Conclusão do Sistema de Abastecimento de Água”</i>, no município de Irituia, permaneceu com status de paralisada, tendo como medida adotada a contratação de empresa especializada para revisão e elaboração dos projetos executivos para posterior início do processo licitatório. Já foram concluídos os projetos executivos e todos os documentos necessários para início do processo licitatório em 2023.</p> <p>A obra de Nova Esperança do Piriá, executada através de contrato de repasse com a Caixa Econômica Federal (CEF), após ter passado por um novo processo licitatório no ano de 2020, foi retomada em 2021 chegando à evolução física de 90%. No entanto, o projeto não alcançou a funcionalidade devido a adutora de água bruta, já existente, encontrar-se danificada.</p> <p>Esta situação fez com que a Sedop realizasse um novo processo licitatório no ano de 2022, objetivando dar funcionalidade a este projeto. No primeiro semestre, a nova empresa iniciou os serviços para conclusão com funcionalidade do sistema de abastecimento de água. A obra encontra-se em execução com conclusão prevista para 2023.</p>					

Outros municípios não programados, mas que foram atendidos pela Sedop com obras de sistema de abastecimento de água, encontram-se discriminados na tabela abaixo:

Nº	MUNICÍPIO	Nº CONVÊNIO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR GLOBAL
1	OURÉM	171/2022	IMPLANTAÇÃO DE MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NO BAIRRO JACAL	R\$ 314.128,72
2	ULIANÓPOLIS	103/2022	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NO BAIRRO BELA VISTA	R\$ 4.296.970,10
TOTAL				R\$ 4.611.098,82

Nestes municípios, foram celebrados convênios de Cooperação Técnica com a Sedop, a qual tem como obrigação principal a transferência do recurso oriundo de demanda governamental para as prefeituras municipais, enquanto que estas são as responsáveis pela consecução do objeto pactuado no convênio. As obras foram iniciadas no segundo semestre e encontram-se com a evolução em conformidade com o cronograma físico e financeiro, com conclusão prevista para 2023.

Embora para o ano de 2022 não tenham sido estabelecidas metas (número de ligações domiciliares), o fato de as obras não terem tido o desenvolvimento de acordo com o programado, certifica o baixo desempenho físico da *Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água* na Região Rio Capim.

Com relação ao desempenho financeiro, do valor de R\$ 1.675.500,00¹ programado para atender esta região em 2022, foram utilizados R\$ 1.532.608,61², o que representa 91,4%.

Finalizando, considerando as informações acima expostas, informamos que o desempenho físico e financeiro da *Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água* na Região Rio Capim encerra o exercício de 2022 com status *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO TAPAJÓS					
MUNICÍPIOS PLANEJADOS: ITAITUBA, JACAREACANGA E TRAIRÃO					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2022	NÃO FOI PREVISTO CONCLUSÃO DE OBRA EM 2022.

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Na Região de Integração Tapajós, os municípios planejados foram Itaituba, Jacareacanga e Trairão. Entretanto, vale a pena ressaltar que, como não foi programada a conclusão de obras nestes municípios, para o ano de 2022, não ficou estabelecida meta física para a Região Tapajós, uma vez que a proposição das metas é diretamente proporcional à conclusão de obras.

Ressaltamos que, seguindo orientação da Seplad, para que não houvesse incoerência no Sistema SigPlan de Meta Física Programada (0 Ligação) com Orçamento Programado, instituiu-se que, os municípios que não teriam produtos alcançados no exercício atual, teriam como meta estabelecida uma unidade, o que acabou sendo contabilizado equivocadamente no SigPlan como total de três ligações domiciliares na Região Tapajós.

Com exceção do município de Jacareacanga e Rurópolis, os demais municípios atendidos por esta ação na Região Tapajós constam no PPA 2020/2023, como proposições de obras novas de sistema de abastecimento de água. Os referidos municípios foram inseridos, objetivando ampliar a área de atuação do Governo do Estado nesta região, sendo mantidos até o exercício atual como esforço da Sedop em contemplar, nos instrumentos de planejamento, municípios paraenses com os menores índices de atendimento com rede de abastecimento de água.

Quanto à obra no município de Jacareacanga, em 2022 foi celebrado contrato com empresa especializada para a revisão e elaboração dos projetos executivos. Atualmente, os projetos e demais documentos necessários para licitação da obra encontram-se em análise pelos técnicos da SEDOP para posterior início do processo licitatório. Sendo assim, em 2022 a obra continuou com o status de paralisada.

A solução técnica adotada na Região Tapajós para Trairão e Rurópolis (este último não programado para atendimento nesta ação) foi a construção de microssistema simplificado de abastecimento de água. Apesar desta obra não contemplar ligações domiciliares, foram concluídos microssistemas simplificados tanto em Trairão – atendendo as comunidades de Três Boeiras e Vila Planalto – quanto em Rurópolis – atendendo as comunidades de Flor da Selva e Tambor. Neste tipo de solução a população local é atendida através de um chafariz construído

junto ao reservatório, o qual possui torneiras como pontos de fornecimento de água potável para uso comum da comunidade. Estes microsistemas, somados, têm capacidade para atender cerca de 1.200 pessoas.

Embora para o ano de 2022 não tenham sido estabelecidas metas (número de ligações domiciliares), o fato das tratativas previstas para início das obras no município de Itaituba não terem se concretizado, aliado à manutenção do status de paralisada da obra em Jacareacanga, certifica o baixo desempenho físico da Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água na Região Tapajós.

Em contrapartida, no município de Novo Progresso, mesmo não tendo sido programado, foi celebrado convênio de Cooperação Técnica com a Sedop, a qual tem como obrigação principal a transferência do recurso oriundo de demanda governamental para a prefeitura, enquanto que esta é a responsável pela consecução do objeto pactuado no convênio. A obra foi iniciada no segundo semestre e encontra-se com a evolução em conformidade com o cronograma físico e financeiro, tendo conclusão prevista para 2023. A tabela abaixo consolida as principais informações sobre este convênio:

Nº	MUNICÍPIO	Nº CONVÊNIO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR GLOBAL
1	NOVO PROGRESSO	170/2022	CONSTRUÇÃO DE TRÊS MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE NOVA FRONTEIRA, TERRA NOSSA E BAIRRO VENEZA.	R\$ 667.021,59
TOTAL				R\$ 667.021,67

No que diz respeito ao desempenho financeiro de R\$ 2.196.826,00¹ programado para atender esta região em 2022, foram utilizados cerca de R\$ 1.260.170,49², o que corresponde cerca de 57,6% da meta financeira estabelecida.

Por fim, considerando que as informações acima expostas contribuíram para o baixo desempenho físico e financeiro da Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água, a Região Tapajós encerra o exercício de 2022 com o status *Merece Atenção*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO TOCANTINS					
MUNICÍPIOS PLANEJADOS: ACARÁ E TAILÂNDIA					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2022	NÃO FOI PREVISTO CONCLUSÃO DE OBRA EM 2022.

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Os municípios planejados para a execução de obras de sistema de abastecimento de água na Região de Integração Tocantins, em 2022, foram Acará e Tailândia. Para nenhum destes municípios foi programada a conclusão de obras no exercício de 2022.

No entanto, vale a pena esclarecer que, seguindo orientação da Seplad, para que não houvesse incoerência no Sistema SigPlan entre *Meta Física Programada* (0 Ligação) X Orçamento Programado, instituiu-se que, os municípios que não teriam produtos alcançados no exercício atual, teriam como meta estabelecida uma unidade, o que acabou sendo contabilizado equivocadamente para o número total de ligações domiciliares na Região Tocantins.

Outra situação que necessita de esclarecimento são os municípios não programados, mas que, por se tratarem de emendas parlamentares, são inseridos pela Seplad nos instrumentos de planejamento na fase de aprovação dos mesmos. Um exemplo disso, nesta região, são os municípios de Abaetetuba, Baião, Barcarena, Cametá, Igarapé-Miri e Mocajuba. Além destes, há uma obra prevista tanto para Acará, quanto para Tailândia. Cada um destes oito municípios estão contemplados com a meta física de uma unidade.

No que diz respeito ao município de Acará, o mesmo foi inserido como proposição para ampliar a área de atuação do Governo do Estado na Região do Tocantins, sendo mantido até o exercício atual como esforço da Sedop em contemplar nos instrumentos de planejamento, municípios paraenses com os menores índices de atendimento com rede de abastecimento de água. Entretanto, as tratativas para início das obras não avançaram, contribuindo desta forma para o baixo desempenho físico da *Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água* nesta região.

Quanto ao município de Tailândia, é atendido com duas obras de Sistema de Abastecimento de Água, uma financiada com recursos da Funasa (área rural) e outra com recursos da Caixa Econômica Federal. Em relação à obra financiada pela Funasa, sua execução

seguiu no decorrer do ano de 2022, em desacordo com os serviços programados no cronograma físico e financeiro.

Em relação à obra executada com recursos financiados pela Caixa, por sua vez, embora no ano de 2021 tenham sido iniciados seus serviços preliminares, em 2022 a empresa não finalizou os serviços contratados, e a obra voltou a ficar paralisada, tendo o contrato vencido por decurso de prazo. Como medida de continuidade à obra, a Sedop está realizando a revisão de projeto com redução de metas para atender e dar funcionalidade necessária para que o sistema de abastecimento de água possa ser finalizado. Atualmente, o contrato de repasse está vigente e a expectativa é que a obra seja concluída no segundo semestre de 2023.

Com relação à execução financeira, do valor de R\$ 3.045.425,00¹ programado para atender a Região do Tocantins no decorrer do ano de 2022, houve movimentação orçamentária no valor de R\$ 115.712,70², o que corresponde a cerca de 3,7% do orçamento planejado para a região. Este baixo desempenho financeiro reflete a baixa evolução que as obras programadas para a Região Tocantins tiveram no decorrer do ano de 2022.

Como consequência, considerando os aspectos acima relatados, a *Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água* na Região do Tocantins apresentou um desempenho físico e financeiro no exercício de 2022 *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO /2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO XINGU					
MUNICÍPIO PLANEJADO: PLACAS					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2022	NÃO FOI PREVISTO CONCLUSÃO DE OBRA EM 2022.

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Em 2022, na Região de Integração do Xingu, o único município programado pela Sedop para ser atendido pela *Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água* foi o município de Placas. O município de Vitória do Xingu trata-se de emenda parlamentar e foi inserido pela Seplad nos instrumentos de planejamento da Sedop na fase de aprovação dos mesmos.

Nesta região, não houve previsão de obra para ser concluída em 2022 e, conseqüentemente, não houve meta a ser alcançada. Entretanto, vale a pena esclarecer que, segundo orientação da Seplad, para que não houvesse incoerência no Sistema SigPlan entre *Meta Física Programada (O Ligação) X Orçamento Programado*, instituiu-se que, os municípios que não teriam produtos alcançados no exercício atual, teriam como meta estabelecida uma unidade, o que acabou sendo contabilizado equivocadamente para o número de duas ligações domiciliares para a Região do Xingu.

Com relação ao município de Placas, o mesmo faz parte dos que foram beneficiados com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) com financiamento oriundo da FUNASA. A obra não teve evolução satisfatória em 2022 e o contrato com a empresa executora está em processo de rescisão. Foi elaborado um levantamento dos serviços necessários para a sua conclusão e o novo processo licitatório já está em andamento, na fase de habilitação das empresas. Espera-se que esta obra seja concluída em 2023.

Apesar de a obra programada em Placas não ter tido a evolução esperada para o ano de 2022, o município foi atendido através de demanda espontânea com a execução e conclusão do *“Sistema Simplificado de Água na Vila Seca e Vila da Palha”* na área rural do município. Trata-se de dois microssistemas que utilizam o lençol subterrâneo como manancial, no qual, a captação de água é feita através de um poço com uma bomba submersa instalada que transfere água para um reservatório de 10m³.

Apesar desta obra não contemplar ligações domiciliares, a população local é atendida através de um chafariz construído junto ao reservatório, o qual possui quatro torneiras como

pontos de fornecimento de água potável para uso comum da comunidade. Estes microssistemas têm capacidade para atender cerca de 370 pessoas.

Outro município não programado, mas que foi atendido pela Sedop com obra de sistema de abastecimento de água, encontra-se discriminado na tabela abaixo:

Nº	MUNICÍPIO	Nº CONVÊNIO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR GLOBAL
1	VITÓRIA DO XINGU	27/2022	CONSTRUÇÃO DE CINCO MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZADO NAS COMUNIDADES DE JOA, SÃO FRANCISCO, RAMAL DOS COCOS, KM 20 E TUBA PORTO DE BELO MONTE.	R\$ 1.215.534,30
TOTAL				R\$ 1.215.554,31

Neste município, foi celebrado convênio de Cooperação Técnica com a Sedop, a qual tem como obrigação principal a transferência do recurso oriundo de demanda governamental para a Prefeitura Municipal, enquanto que esta é responsável pela consecução do objeto pactuado no convênio. A obra foi iniciada no segundo semestre e encontra-se com a evolução em conformidade com o cronograma físico e financeiro, com conclusão prevista para 2023.

Quanto à execução financeira, a dotação de R\$ 430.000,00¹ programada para atender a Região Xingu, no decorrer do ano de 2022, foi atualizada para R\$ 1.918.342,07², ultrapassando o valor planejado em cerca de R\$ 1.488.342,07, o que se justifica pela limitação do teto orçamentário disponibilizado à Sedop no momento da elaboração do orçamento para o ano de 2022 e pelos destaques orçamentários recebidos relacionados aos convênios celebrados com as prefeituras.

Por último, considerando que a obra programada na Região Xingu não teve a evolução esperada para o ano de 2022, a *Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água* apresentou o desempenho físico e financeiro *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

2.3.1.2. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO BAIXO AMAZONAS					
MUNICÍPIO PLANEJADO: BELTERRA					
PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2022	NÃO FOI PREVISTO CONCLUSÃO DE OBRA EM 2022.
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022					
<p>Dentre os municípios que integram a Região do Baixo Amazonas, a Sedop programou o atendimento do município de Belterra, através da <i>Ação 7568. Realização de Obras de Esgotamento Sanitário</i>.</p> <p>Nesta região, não houve previsão de obra para ser concluída em 2022 e, conseqüentemente, não houve meta a ser alcançada. Entretanto, vale a pena esclarecer que, segundo orientação da Seplad, para que não houvesse incoerência no Sistema SigPlan entre <i>Meta Física Programada (0 Ligação) X Orçamento Programado</i>, instituiu-se que, os municípios que não teriam produtos alcançados no exercício atual, teriam como meta estabelecida uma unidade, o que acabou sendo contabilizado equivocadamente o número de uma ligação domiciliar planejada para a Região Baixo Amazonas.</p> <p>No que se refere à obra que envolve de sistema de esgotamento sanitário no município de Belterra, a empresa responsável pela elaboração dos projetos já concluiu o projeto básico e está em fase de elaboração do Executivo.</p> <p>No que diz respeito à execução financeira, embora a <i>Ação 7568. Realização de Obras de Sistema de Esgotamento Sanitário</i> tenha recebido um aporte orçamentário de R\$ 770.000,00¹, em 2022, não houve etapa concluída para pagamento referente à execução de serviços.</p> <p>Sendo assim, tendo em conta, principalmente, que a obra não foi iniciada, o desempenho físico e financeiro da <i>Ação 7568. Realização de Obras de Esgotamento Sanitário</i> na Região Baixo Amazonas no ano de 2022 apresentou o status <i>Abaixo do Esperado</i>.</p>					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO - DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO GUAJARÁ

MUNICÍPIO PLANEJADO: BELÉM

PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2022	NÃO FOI PREVISTO CONCLUSÃO DE OBRA EM 2022.
---------	------------------------------	---------	----	-----------	---

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

A obra de Sistema de Esgotamento Sanitário, programada para 2022, inclui o atendimento de três ilhas próximas ao município de Belém, como a Ilha do Combu, Murutucu e Ilha Grande.

Nesta região, não houve previsão obra para ser concluída em 2022 e, conseqüentemente, não houve meta a ser alcançada. Entretanto, vale a pena esclarecer que, segundo orientação da Seplad, para que não houvesse incoerência no Sistema SigPlan entre *Meta Física Programada (O Ligação) X Orçamento Programado*, instituiu-se que, os municípios que não teriam produtos alcançados no exercício atual, teriam como meta estabelecida uma unidade, o que acabou sendo contabilizado equivocadamente o número de uma ligação domiciliar planejada para a Região Guajará.

No que diz respeito à construção do Sistema de Esgotamento Sanitário para beneficiar a população residente nas ilhas do Combu, Murutucu e Grande, a empresa responsável pela elaboração dos projetos já concluiu o Projeto Básico e está em fase de elaboração do Projeto Executivo.

Ainda em Belém, mesmo não programado, foi celebrado o convênio de Cooperação Técnica Sedop/Prefeitura Municipal nº 116/2022, cujo objeto é “*Dragagem, Limpeza e Desobstrução de Macro e Microdrenagem*”. Cabe à Sedop a obrigação de transferir o recurso oriundo de demanda governamental para a prefeitura para que seja executado o objeto pactuado no convênio. Ressaltamos, ainda, que a implementação do objeto do convênio não terá como produto *Nº de ligações domiciliares*, portanto, não será alimentado no campo físico do sistema SigPlan.

Quanto à execução financeira, a dotação de R\$ 252.311,00¹ programada para atender a Região do Guajará, em 2022, foi atualizada para R\$ 26.666.966,64², ultrapassando o valor

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

planejado em R\$ 26.414.655,64, evidenciando, desta forma, o descompasso *Orçamento Planejado X Orçamento Executado* fomentado tanto pela limitação do teto orçamentário disponibilizado à Sedop no momento da elaboração do orçamento para o ano de 2022, quanto pelo destaque orçamentário recebido relacionado ao convênio celebrado com a Prefeitura Municipal de Belém.

Finalizando, considerando os motivos acima apresentados, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7568. Realização de Obras de Esgotamento Sanitário* na Região Guajará, exercício de 2022, apresentou o status Abaixo do Esperado.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO MARAJÓ

MUNICÍPIOS PLANEJADOS: SALVATERRA E SOURE

PRODUTO	LIGAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2022	3.912 LIGAÇÕES
---------	------------------------------	---------	----	-----------	----------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Na Região do Marajó, em 2022, a Sedop planejou implementar a *Ação 7568. Realização de Obras de Esgotamento Sanitário* nos municípios de Salvaterra e Soure. Entretanto, apenas Salvaterra foi prevista a conclusão de obra com meta física de 3.912 ligações domiciliares.

Faz-se necessário esclarecer que, segundo orientação da Seplad, para que não houvesse incoerência no Sistema SigPlan entre *Meta Física Programada (0 Ligação) X Orçamento Programado*, instituiu-se que, os municípios que não teriam produtos alcançados no exercício atual, teriam como meta estabelecida uma unidade, como é o caso do município de Soure, o que acabou por contabilizar equivocadamente o número de 3.913 ligações domiciliares planejadas para a Região Marajó.

Com relação à obra de sistema de esgotamento sanitário de Salvaterra, a empresa responsável pela elaboração dos projetos já concluiu o projeto básico e está em fase de elaboração do executivo, ou seja, a obra não foi iniciada. Desta forma, a meta física, que seria atingida com a conclusão da obra, não foi cumprida.

Quanto ao sistema de esgotamento sanitário para o município de Soure, em 2022, não houve avanço na resolutividade das pendências referentes à obra. Sendo assim, a mesma manteve o status de paralisada no decorrer do ano e continua aguardando novo processo licitatório para continuidade dos serviços.

Com relação à execução financeira, embora a ação tenha recebido aporte orçamentário no valor de R\$ 2.716.671,00¹, como a obra de Salvaterra não pôde ser iniciada e a obra do município de Soure não teve a evolução física esperada para o ano de 2022, o desempenho físico e, conseqüentemente, o desempenho financeiro da *Ação 7568. Realização de Obras de Esgotamento Sanitário* na Região Marajó em 2022 apresenta o status *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO - DEZEMBRO/2022.

2.3.1.3. CONSTRUÇÃO DE PARQUES URBANOS

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO ARAGUAIA					
MUNICÍPIO DE DEMANDA ESPONTÂNEA: RIO MARIA					
PRODUTO	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2022	AÇÃO NÃO PLANEJADA PARA ESTA REGIÃO.
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022					
<p>Embora a Região de Integração Araguaia não tenha sido contemplada nos instrumentos de planejamento da Sedop para implementação da <i>Ação 7608. Construção de Parques Urbanos</i>, em 2022, houve execução orçamentária na referida ação para o município de Rio Maria, relacionada ao atendimento de destaque orçamentário oriundo de Demanda Governamental.</p> <p>Sendo assim, foram celebrados dois convênios de Cooperação Técnica entre a Prefeitura Municipal e a Sedop. Ocorre que os objetos destes convênios não têm correspondência com a ação governamental em questão, sendo desta forma identificado o equívoco na etapa de execução orçamentária.</p> <p>Como esta região não estava prevista para o desenvolvimento desta ação, consequentemente, não houve orçamento programado para o ano de 2022. Entretanto, com a celebração dos convênios, foram realizados os repasses dos valores para que o município de Rio Maria executasse os objetos pactuados nos convênios, havendo desta forma um dispêndio financeiro na ordem de R\$ 147.364,67¹.</p> <p>Finalizando, a situação acima relatada contribui de maneira decisiva na certificação do descompasso entre o planejamento e o orçamento, legitimando incoerência no desempenho físico e financeiro da <i>Ação 7608. Construção de Parques Urbanos</i> na Região Araguaia, conferindo a mesma o status de <i>Abaixo do Esperado</i>.</p>					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO - DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO GUAJARÁ

MUNICÍPIO PLANEJADO: BELÉM

PRODUTO	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2022	NÃO FOI PREVISTO CONCLUSÃO DE OBRA EM 2022
---------	-------------------	---------	----	-----------	--

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Criada no momento da elaboração do PPA 2020/2023, a *Ação 7608. Construção de Parques Urbanos* surgiu frente à necessidade de amenizar a carência de espaços verdes em meio às zonas urbanas de alguns municípios paraenses. Para a Região Guajará, esta ação foi programada para o município de Belém.

A proposta era de que, na vigência do PPA atual, o município de Belém tivesse um Parque Urbano Implantado. No entanto, não houve avanço nas tratativas necessárias para início de obra, impactando diretamente no baixo desempenho físico desta ação na Região Guajará.

No caso da execução financeira, embora a *Ação 7608. Construção de Parques Urbanos* tenha recebido aporte orçamentário para o ano de 2022, como não houve o desenvolvimento esperado no exercício de 2022, consequentemente, não houve dispêndios financeiros.

Por fim, frente ao cenário de baixo desempenho físico e financeiro, em 2022, a *Ação 7608. Construção de Parques Urbanos* na Região Guajará, obteve o desenvolvimento *Abaixo do Esperado*.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO GUAMÁ

MUNICÍPIO DE DEMANDA ESPONTÂNEA: SANTA IZABEL

PRODUTO	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2022	AÇÃO NÃO PLANEJADA PARA ESTA REGIÃO.
---------	-------------------	---------	----	-----------	--------------------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Embora a Região Guamá não tenha sido contemplada nos instrumentos de planejamento da Sedop para implementação da Ação 7608. Construção de Parques Urbanos em 2022, o município de Santa Izabel foi beneficiado com recurso oriundo de Demanda Governamental.

Sendo assim, foi celebrado Convênio de Cooperação Técnica entre a Prefeitura Municipal e a Sedop no valor de R\$ 3.302.076,66, cujo objeto refere-se à *“Requalificação de Área para Instalação de Parque Urbano Florestal no Município de Santa Izabel do Pará”*. Cabe à Sedop garantir a transferência do recurso e às prefeituras, a consecução do objeto pactuado no convênio. A obra foi iniciada no segundo semestre e encontra-se com a evolução em conformidade com o cronograma físico e financeiro, com conclusão prevista para 2023.

Quanto à execução financeira, como nesta região não estava previsto o desenvolvimento da ação, não houve orçamento programado para o exercício de 2022. No entanto, para o atendimento da demanda governamental, a dotação, que até então não existia, precisou ser atualizada em R\$ 1.254.789,13¹, valor necessário para o início das obras.

Finalizando, considerando o cenário apresentado, no decorrer do ano de 2022 a Ação 7608. *Construção de Parques Urbanos* na Região do Guamá, apresentou o desempenho físico e financeiro *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO - DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ

MUNICÍPIO PLANEJADO: BRAGANÇA

PRODUTO	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2022	NÃO FOI PREVISTO CONCLUSÃO DE OBRA EM 2022
---------	-------------------	---------	----	-----------	--

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Criada no momento da elaboração do PPA 2020/2023, a Ação 7608. Construção de Parques Urbanos surgiu frente à necessidade de amenizar a carência de espaços verdes em meio as zonas urbanas de alguns municípios paraenses. Para a Região Rio Caeté, esta ação foi programada para o município de Bragança.

A proposta era de que na vigência do PPA atual, o referido município tivesse um parque urbano implantado. No entanto não houve avanço nas tratativas necessárias para início da obra impactando diretamente no baixo desempenho físico desta ação na Região Rio Caeté.

No caso da execução financeira, embora a Ação 7608. Construção de Parques Urbanos tenha recebido aporte orçamentário para o ano de 2022, como não houve o desenvolvimento esperado no exercício de 2022, conseqüentemente, não houve dispêndios financeiros.

Por fim, frente ao cenário de baixo desempenho físico e financeiro, em 2022, a Ação 7608. Construção de Parques Urbanos na Região Rio Caeté, obteve o desenvolvimento *Abaixo do Esperado*.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAPIM

MUNICÍPIO DE DEMANDA ESPONTÂNEA: ABEL FIGUEIREDO E ULIANÓPOLIS

PRODUTO	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2022	AÇÃO NÃO PLANEJADA PARA ESTA REGIÃO.
----------------	-------------------	----------------	----	------------------	--------------------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Embora a Região Rio do Capim não tenha sido contemplada nos instrumentos de planejamento da Sedop para implementação da Ação 7608. Construção de Parques Urbanos em 2022, os municípios de Abel Figueiredo e Ulianópolis foram beneficiados com recursos oriundos de Demandas Governamentais.

Sendo assim, foram celebrados convênios de Cooperação Técnica entre as prefeituras dos respectivos municípios e a Sedop. A tabela abaixo sintetiza as informações relacionadas aos convênios:

Nº	MUNICÍPIO	Nº CONVÊNIO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR GLOBAL
1	ABEL FIGUEIREDO	126/2022	URBANIZAÇÃO DAS LAGOAS DE ABEL FIGUEIREDO.	R\$ 1.601.371,53
2	ULIANÓPOLIS	100/2022	REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE UNILSON QUINAIP.	R\$ 3.919.067,14
TOTAL				R\$ 5.520.438,67

Cabe à Sedop garantir a transferência do recurso e às prefeituras, a consecução dos objetos pactuados nos convênios. As obras foram iniciadas no segundo semestre e encontram-se com a evolução em conformidade com o cronograma físico e financeiro, com conclusão prevista para 2023.

Quanto à execução financeira, como nesta região não estava previsto o desenvolvimento da ação, não houve orçamento programado para o exercício de 2022. No entanto, para o atendimento destas demandas governamentais a dotação, que até então não existia, precisou ser atualizada para R\$ 1.222.572,50¹, valor necessário para o início das obras.

Por último, considerando o cenário apresentado, no decorrer do ano de 2022 a Ação 7608. Construção de Parques Urbanos na Região Rio Capim, apresentou o desempenho físico e financeiro *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO - DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TAPAJÓS

MUNICÍPIO PLANEJADO: ITAITUBA

PRODUTO	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2022	NÃO FOI PREVISTO CONCLUSÃO DE OBRA EM 2022
---------	-------------------	---------	----	-----------	--

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Criada no momento da elaboração do PPA 2020/2023, a Ação 7608. Construção de Parques Urbanos surgiu frente à necessidade de amenizar a carência de espaços verdes em meio as zonas urbanas de alguns municípios paraenses. Para a Região Tapajós, esta ação foi programada para o município de Itaituba.

A proposta era de que na vigência do PPA atual, o referido município tivesse um parque urbano implantado. No entanto, não houve avanço nas tratativas necessárias para início da obra, impactando diretamente no baixo desempenho físico desta ação na Região Tapajós.

No que diz respeito à execução financeira, embora a Ação 7608. *Construção de Parques Urbanos* tenha recebido aporte orçamentário para o ano de 2022, como não houve o desenvolvimento esperado no exercício de 2022, conseqüentemente, não houve dispêndios financeiros.

Por último, frente ao cenário de baixo desempenho físico e financeiro, em 2022, a Ação 7608. Construção de Parques Urbanos na Região Tapajós, obteve o desenvolvimento *Abaixo do Esperado*.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS

MUNICÍPIO PLANEJADO: BARCARENA

PRODUTO	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2022	NÃO FOI PREVISTO CONCLUSÃO DE OBRA EM 2022.
---------	-------------------	---------	----	-----------	---

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Criada no momento da elaboração do PPA 2020/2023, a Ação 7608. Construção de Parques Urbanos surgiu frente à necessidade de amenizar a carência de espaços verdes em meio as zonas urbanas de alguns municípios paraenses. Para a Região Tocantins, esta ação foi programada para o município de Barcarena.

A proposta era de que na vigência do PPA atual, o referido município tivesse um parque urbano implantado. No entanto não houve avanço nas tratativas necessárias para início da obra impactando diretamente no baixo desempenho físico desta ação na Região Tocantins.

No que diz respeito à execução financeira, embora a Ação 7608. *Construção de Parques Urbanos* tenha recebido aporte orçamentário para o ano de 2022, como não houve o desenvolvimento esperado no exercício de 2022, conseqüentemente, não houve dispêndios financeiros.

Por fim, frente ao cenário de baixo desempenho físico e financeiro, em 2022, a Ação 7608. Construção de Parques Urbanos na Região Tocantins, obteve o desenvolvimento *Abaixo do Esperado*.

2.3.1.4. OFERTA DE UNIDADE HABITACIONAL

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO GUAJARÁ					
MUNICÍPIO PLANEJADO: BELÉM					
PRODUTO	UNIDADE HABITACIONAL ENTREGUE	UNIDADE	UN	META 2022	NÃO FOI PREVISTO CONCLUSÃO DE OBRA EM 2022.

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Considerando que no ano de 2021, a Sedop concluiu a obra referente aos Conjuntos Habitacionais Riacho Doce I, II e III, cumprindo desta forma o Compromisso Regional e Projeto Prioritário estabelecido no PPA 2020/2023 para a Ação 7645. *Oferta de Unidade Habitacional* na Região Guajará, em 2022, para o desenvolvimento desta ação, a referida obra consta na programação orçamentária do Sedop voltada para o atendimento de serviços/projetos complementares, sendo o objetivo principal, o início da *“Construção de 400 Unidades Habitacionais na área do antigo Curtume Santo Antônio”*.

Mais uma vez, fez-se necessário esclarecer que a meta desta ação é obtida com a conclusão da obra. Por este motivo, não ficou estabelecido o quantitativo de 400 Unidades Habitacionais entregues no exercício de 2022.

No que diz respeito aos Conjuntos Habitacionais Riacho Doce I, II e III, no ano de 2022 foram realizados serviços de infraestrutura, sistema de abastecimento de água, reforma e reparo em alguns blocos. A necessidade de efetuar estes serviços foi constatada após vistoria realizada pela Sedop e Cosanpa nas unidades habitacionais, objetivando manter a segurança e qualidade na obra entregue.

Para melhor entendimento, a tabela abaixo apresenta de maneira consolidada a síntese dos serviços executados:

TABELA 06: CONJUNTOS HABITACIONAIS RIACHO DOCE I, II E III – SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1) INFRAESTRUTURA	2) SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
<p>RIACHO DOCE I:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SISTEMA VIÁRIO; - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS; - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. <p>RIACHO DOCE III:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SISTEMA VIÁRIO; 	<p>RIACHO DOCE I, II E III:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SERVIÇOS REFERENTES À “EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA” – RIACHO DOCE – PROJETO HIDROMECÂNICO – POÇO 2 E POÇO 3 REALIZADOS; - MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS; - LEVANTAMENTO E INVESTIGAÇÃO DE REDE EXISTENTE.
3) REFORMA: RIACHO DOCE I	
<ul style="list-style-type: none"> - SERVIÇOS PRELIMINARES; - ADMINISTRAÇÃO LOCAL; - REDE COLETORA DE ESGOTO; - URBANIZAÇÃO; - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS; - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA; - DEMOLIÇÃO E LIMPEZA; - COBERTURA; - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; - ÁGUA FRIA; - LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS; - ESGOTO E INSTALAÇÕES PREDIAIS; - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; - SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA – SPDA; - REDE DE COMBATE A INCÊNDIO; - ESQUADRIAS; - REVESTIMENTO; - PAVIMENTAÇÃO; - FORROS; - PINTURAS; - DIVERSOS; - LIMPEZA FINAL. 	<p>BLOCOS 03, 04, 05, 06 E 07:</p> <ul style="list-style-type: none"> - INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS; - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; - INSTALAÇÃO DE FORRO PVC; - ASSENTAMENTO DE CERÂMICA NA PAREDE E NO PISO; - INSTALAÇÃO DE LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS; - PINTURA PVA; - CHECKLIST NOS APARTAMENTOS.

Quanto à obra “*Construção de 400 Unidades Habitacionais na área do antigo Curtume Santo Antônio*”, no primeiro semestre de 2022 a Sedop realizou processo licitatório para contratação de empresa de engenharia especializada para a construção da referida obra, tendo o processo finalizado no segundo semestre com a celebração de contrato com a empresa vencedora.

Desta forma, a expectativa planejada para que a obra fosse iniciada no primeiro semestre de 2022 não foi conquistada, repercutindo exatamente na evolução física da obra, a qual, no ano de 2022, executou serviços iniciais tais como:

- Demolição de Imóveis;
- Cravação de estaca para fundação dos blocos;
- Drenagem Pluvial;
- Tapume Metálico;
- Barracão de obra;

No que diz respeito à execução financeira da Ação 7642. Oferta de Unidade Habitacional, para o exercício de 2022 o orçamento programado foi de R\$ 16.890.870,00¹, sendo executado o montante de R\$ 21.533.176,65², ultrapassando em R\$ 4.642.306,65 o valor programado. O valor executado refere-se ao pagamento dos serviços complementares do Conjunto Habitacional Riacho Doce (R\$ 3.766.353,54³) e ao pagamento dos Boletins de Medições e taxas relacionadas à obra do Curtume (R\$ 17.766.823,11⁴).

Por último, independente do não estabelecimento de meta física nesta ação para a Região Guajará, a baixa evolução da obra “Construção de 400 Unidades Habitacionais na área do antigo Curtume Santo Antônio” aliada à baixa execução financeira, conferem o baixo desempenho físico e financeiro da Ação 7642. *Oferta de Unidade Habitacional* na Região do Guajará no ano de 2022, recebendo o status de *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

³ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

⁴ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

2.3.1.5. IMPLANTAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO GUAMÁ					
MUNICÍPIO PLANEJADO: CASTANHAL					
PRODUTO	ATERRO IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2022	1 ATERRO IMPLANTADO
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022					
<p>O desenvolvimento da <i>Ação 7644. Implantação de Aterros Sanitários</i> atende, primordialmente, o componente Saneamento Urbano do Programa Corporação Andina de Fomento – CAF, o qual tem como objetivo <i>“Melhorar as condições de vida dos Municípios contemplados por meio de ações de destinação adequada de resíduos sólidos¹”</i>.</p> <p>A concretização desta ação significa obter, tanto à execução da obra (Construção de Aterros Sanitários) quanto o desenvolvimento de serviços associados com a implantação, gestão e operação dos aterros sanitários (Estudos e Planos), além da aquisição de equipamentos que garantam a funcionalidade ao complexo do aterro sanitário.</p> <p>No que diz respeito à obra, será implantado no município de Castanhal um Centro de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Regionalizado (CGIRSR), o qual atenderá os municípios integrantes do Consórcio intermunicipal CONCISSS, o qual é constituído pelos municípios de Castanhal, Inhangapi, Santa Izabel, São Francisco e Santa Maria. O sistema receberá resíduos sólidos urbanos dos municípios supracitados, sendo projetado para receber, aproximadamente 200 t/dia de rejeitos sólidos urbanos.</p> <p>Entretanto, para que a construção do CGIRSR no município de Castanhal possa ser iniciada, é imprescindível a resolutividade de impedimentos voltados para gestão ambiental – licenciamento ambiental. Vários entraves ocorreram para a definição do processo de licenciamento da área de implantação do CGIRS do CONCISSS, pelo fato de este empreendimento ser de grande porte. Por esta razão, obrigatoriamente, está sob gerência da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS, conforme direciona a Resolução CONAMA nº 237/97, art. 5º e Resolução COEMA nº 162/21.</p> <p>Sendo assim, esse licenciamento demandará prazo diferente dos demais empreendimentos que serão implantados pelo Programa. Enquanto os CGIRSRs dos municípios de Brasil Novo, Itaituba e Rondon do Pará deverão ter um tempo de licenciamento de três</p>					

¹ RELATÓRIO DE GESTÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA (UGP) – NOVEMBRO/2022.

meses, o do CONCISSS será licenciado em 12 (doze) meses. A tabela a seguir, consolida a situação atual nas respectivas etapas do processo:

TEMÁTICA	ETAPAS	SITUAÇÃO ATUAL
GESTÃO AMBIENTAL	ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E DO SEU RESPECTIVO RELATÓRIO DE IMPACTO SOBRE O MEIO AMBIENTE – EIA/RIMA	# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E DO SEU RESPECTIVO RELATÓRIO DE IMPACTO SOBRE O MEIO AMBIENTE – EIA/RIMA, PARA O PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO CGIRS DO CONCISSS.
	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	# ASSINATURA DO CONTRATO COM O CONSÓRCIO VENCEDOR DO CERTAME PARA A ELABORAÇÃO DO EIA/RIMA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EXIGIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMAS
	CONDICIONANTES AMBIENTAIS	# COMO A ETAPA DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO ENCONTRA-SE NA ETAPA INICIAL DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO EIA/RIMA, NÃO HÁ CONDICIONANTES AMBIENTAIS.

Quanto à Gestão e Operação dos Aterros Sanitários, trata-se da elaboração/revisão de Planos Municipais de Saneamento Básico nos municípios contemplados com obras de aterro sanitário. Espera-se que, de forma integrada, com estes planos a operacionalização dos sistemas de manejo de resíduos sólidos sejam implantados de maneira mais efetiva, contribuindo também para o prosseguimento das ações relacionadas ao saneamento urbano.

Com este foco, foi celebrado no ano de 2021, contrato com empresa especializada para a elaboração e revisão dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) nos 4 eixos (água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos). No caso do município de Castanhal, trata-se da Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico.

Em 2022, as atividades programadas para atender os municípios foram: Prognóstico do Saneamento Básico, Planejamento Estratégico, Cenário de Referência, Objetivos e Metas; Programa, Projetos e Ações – PTTS; Programação da Execução do PMSB; Estudos e Planos (final); Indicadores de Desempenho do PMSB; Sistema de Informações do PMSB; Relatório Final; Minuta do Projeto de Lei.

É importante ressaltar, que o escopo do Programa prevê apenas a elaboração e ou revisão dos Planos, a implementação dos PMSBs e a execução do Projeto Técnico de Trabalho Social – PTTS será de responsabilidade dos Municípios contemplados.

Quanto à aquisição de equipamentos para o município de Castanhal, os mesmos serão adquiridos com a finalização das obras de implantação do CGIRS Regionalizado. Sendo assim, a previsão é que esta aquisição aconteça em 2024.

Com relação à execução financeira, do orçamento programado de R\$ 2.961.857,00¹ para atender a Região Guamá durante o ano de 2022, foram utilizados cerca de 16%, o que corresponde a R\$ 485.323,84². Este valor foi direcionado ao pagamento da consultoria contratada para a Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico no município de Castanhal.

Por fim, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7644. Implantação de Aterros Sanitários* na Região Guamá encerra o exercício de 2022 com o status *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAPIM

MUNICÍPIO PLANEJADO: RONDON DO PARÁ

PRODUTO	ATERRO IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2022	1 ATERRO IMPLANTADO
---------	-------------------	---------	----	-----------	---------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

O desenvolvimento da Ação 7644. *Implantação de Aterros Sanitários* atende primordialmente o componente Saneamento Urbano do Programa Corporação Andina de Fomento – CAF, o qual tem como objetivo “Melhorar as condições de vida dos Municípios contemplados por meio de ações de destinação adequada de resíduos sólidos¹”.

A concretização desta ação significa obter tanto à execução da obra (construção de aterros sanitários), quanto o desenvolvimento de serviços associados com a implantação, gestão e operação dos aterros sanitários (estudos e planos), além da aquisição de equipamentos que garantam a funcionalidade ao complexo do aterro sanitário.

No que diz respeito à obra, trata-se da “Construção do Centro de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos - CGIRS” no município de Rondon do Pará, cujo projeto contemplará: Terraplenagem, aterro sanitário, centro de convivência, galpão de coleta seletiva, galpão de reversos e urbanização.

No ano de 2022, a obra seguiu com evolução em conformidade com o cronograma físico e financeiro. Os principais serviços executados estão consolidados na tabela abaixo:

Nº	ETAPAS	EXECUÇÃO FÍSICA (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	73,83 %
2	CANTEIRO DE OBRAS	91,29 %
3	PLACA DA OBRA	100,00 %
4	ADMINISTRAÇÃO DO LOCAL	37,00 %
5	TERRAPLANAGEM DA ÁREA	95,72 %
6	ATERRO SANITÁRIO	25,20 %
7	CENTRO DE TRIAGEM	30,62 %
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	22,01 %
9	URBANIZAÇÃO	12,24 %
	TOTAL	53,36 %



FOTO 84: VISTA AÉREA DO CANTEIRO DE OBRAS – JULHO/2022 (IMAGEM CEDIDA PELA SECMA)

¹ RELATÓRIO DE GESTÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA (UGP) – NOVEMBRO/2022.

Quanto à Gestão e Operação dos Aterros Sanitários, trata-se da elaboração/revisão de Planos Municipais de Saneamento Básico nos municípios contemplados com obras de aterro sanitário. Espera-se que com estes planos a operacionalização dos sistemas de manejo de resíduos sólidos seja mais efetiva, contribuindo para as ações de saneamento urbano.

Em 2021, foi contratada uma empresa especializada para a elaboração e revisão dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) nos 4 eixos (água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos). Para Rondon do Pará, trata-se da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. Em 2022, as atividades programadas para atender os municípios foram: Prognóstico do Saneamento Básico, Planejamento Estratégico, Cenário de Referência, Objetivos e Metas; Programa, Projetos e Ações – PTTS; Programação da Execução do PMSB; Estudos e Planos (final); Indicadores de Desempenho do PMSB; Sistema de Informações do PMSB; Relatório Final; Minuta do Projeto de Lei.

É importante ressaltar, que o escopo do Programa prevê apenas a elaboração ou revisão dos Planos, ficando a implementação dos PMSBs e a execução do Projeto Técnico de Trabalho Social – PTTS sob a responsabilidade dos Municípios contemplados.

Quanto à aquisição de equipamentos para o município de Rondon do Pará, os mesmos serão adquiridos com a finalização das obras de implantação do CGIRS Regionalizado. Sendo assim, a previsão é que esta aquisição aconteça em 2023.

Com relação à execução financeira, o orçamento programado de R\$ 1.388.390,00¹ para atender a Região Rio Capim durante o ano de 2022, precisou ser atualizado para R\$ 13.095.282,68, ultrapassando em R\$ 11.706.892,68 o programado. Esta divergência *Orçamento Planejado X Orçamento Executado* justifica-se pela limitação do Teto Orçamentário disponibilizado para a Sedop, o qual ficou abaixo da real necessidade para a execução das obras.

Por fim, de acordo com o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7644. Implantação de Aterros Sanitários* na Região Rio Capim encerra o exercício de 2022 com o status *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TAPAJÓS

MUNICÍPIO PLANEJADO: ITAITUBA

PRODUTO	ATERRO IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2022	1 ATERRO IMPLANTADO
----------------	-------------------	----------------	----	------------------	---------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

O desenvolvimento da *Ação 7644. Implantação de Aterros Sanitários* atende primordialmente o componente Saneamento Urbano do Programa Corporação Andina de Fomento – CAF, o qual tem como objetivo “Melhorar as condições de vida dos Municípios contemplados por meio de ações de destinação adequada de resíduos sólidos¹”.

A concretização desta ação significa obter tanto à execução da obra (Construção de Aterros Sanitários), quanto o desenvolvimento de serviços associados com a implantação, gestão e operação dos aterros sanitários (Estudos e Planos), além da aquisição de equipamentos que garantam a funcionalidade ao complexo do aterro sanitário.

No que diz respeito à obra, para o município de Itaituba estão previstas as seguintes obras: “*Construção do Centro de Triagem*” e “*Construção do Centro de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos - CGIRS*”. A situação atual em que cada obra se encontra está sintetizada na tabela abaixo:

DESCRIÇÃO DA OBRA	ETAPAS	SITUAÇÃO ATUAL
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM.	PROCESSO LICITATÓRIO	# ENVIADO À CAF PRÉVIA DO PROCESSO LICITATÓRIO; # RECEBIDO DA CAF A NÃO OBJEÇÃO PARA INÍCIO DE PROCESSO LICITATÓRIO; # PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA;
	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	# LICENÇA DE INSTALAÇÃO RENOVADE;
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - CGIRS	PROCESSO LICITATÓRIO	# PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DO COMPLEXO DO CGIRS EM FASE DE FINALIZAÇÃO;
	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	# LICENÇA PRÉVIA RENOVADE;

Quanto à Gestão e Operação dos Aterros Sanitários, trata-se da elaboração/revisão de Planos Municipais de Saneamento Básico nos municípios contemplados com obras de aterro sanitário. Espera-se que, de forma integrada, com estes planos a operacionalização dos sistemas de manejo de resíduos sólidos sejam implantados de maneira mais efetiva,

¹ RELATÓRIO DE GESTÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA (UGP) – NOVEMBRO/2022.

contribuindo também para o prosseguimento das ações relacionadas ao saneamento urbano.

Com este foco, foi celebrado no ano de 2021, contrato com empresa especializada para a elaboração e revisão dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) nos 4 eixos (água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos). No caso do município de Itaituba, trata-se da Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico.

É importante ressaltar que, o escopo do Programa prevê apenas a elaboração e ou revisão dos Planos. A implementação dos PMSBs e a execução do Projeto Técnico de Trabalho Social – PTTS será de responsabilidade dos Municípios contemplados.

Quanto à aquisição de equipamentos para o município de Itaituba, os mesmos serão adquiridos com a finalização das obras. Sendo assim, a previsão é que esta aquisição aconteça em 2024.

Com relação à execução financeira, foi programado orçamento de R\$ 1.661.857,00¹ para atender a Região Tapajós durante o ano de 2022. No entanto, devido as obras previstas ainda não terem sido iniciadas, não houve dispêndio financeiro para esta ação governamental na Região Tapajós.

Finalizando, tendo em vista o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da Ação 7644. *Implantação de Aterros Sanitários* na Região Tapajós encerra o exercício de 2022 com o status *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO XINGU

MUNICÍPIO PLANEJADO: BRASIL NOVO

PRODUTO	ATERRO IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2022	1 ATERRO IMPLANTADO
---------	-------------------	---------	----	-----------	---------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

O desenvolvimento da *Ação 7644. Implantação de Aterros Sanitários* atende primordialmente o componente Saneamento Urbano do Programa Corporação Andina de Fomento – CAF, o qual tem como objetivo *“Melhorar as condições de vida dos Municípios contemplados por meio de ações de destinação adequada de resíduos sólidos¹”*.

A concretização desta ação significa obter tanto à execução da obra (Construção de Aterros Sanitários), quanto o desenvolvimento de serviços associados com a implantação, gestão e operação dos aterros sanitários (Estudos e Planos), além da aquisição de equipamentos que garantam a funcionalidade ao complexo do aterro sanitário.

Em 2022, para o município de Brasil Novo, foi prevista a obra de *“Revitalização das Unidades Operacionais do Centro de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos - CGIRS”* a qual prevê, em seu projeto, os seguintes serviços: limpeza, recuperação, pintura dos prédios de apoio; instalações elétricas; limpeza das valas existentes; pavimentação e drenagem do acesso ao empreendimento. As obras estão previstas para iniciar no ano de 2023.

Quanto à Gestão e Operação dos Aterros Sanitários, trata-se da elaboração/revisão de Planos Municipais de Saneamento Básico nos municípios contemplados com obras de aterro sanitário. Espera-se que, de forma integrada, com estes planos, a operacionalização dos sistemas de manejo de resíduos sólidos sejam implantados de maneira mais efetiva, contribuindo também para o prosseguimento das ações relacionadas ao saneamento urbano.

Com este foco, foi celebrado no ano de 2021, contrato com empresa especializada para a elaboração e revisão dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) nos 4 eixos (água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos). No caso do município de Brasil Novo, trata-se da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico.

¹ RELATÓRIO DE GESTÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA (UGP) – NOVEMBRO/2022.

É importante ressaltar, que o escopo do Programa prevê apenas a elaboração e ou revisão dos Planos. A implementação dos PMSBs e a execução do Projeto Técnico de Trabalho Social – PTTS será de responsabilidade dos Municípios contemplados.

Quanto à aquisição de equipamentos para o município de Brasil Novo, os mesmos serão adquiridos com a finalização da obra de revitalização do CGIRS Regionalizado. Sendo assim, a previsão é que esta aquisição aconteça em 2023.

Com relação à execução financeira, devido as obras previstas ainda não terem sido iniciadas, não houve dispêndio financeiro para esta ação governamental na Região Xingu. Sendo assim, tendo em vista o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7644. Implantação de Aterros Sanitários* na Região Xingu encerra o exercício de 2022 com o status *Abaixo do Esperado*.

2.3.1.6. PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO ARAGUAIA					
MUNICÍPIOS PLANEJADOS: BANNACH, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, CUMARU DO NORTE, FLORESTA DO ARAGUAIA, OURILÂNDIA DO NORTE, PAU D'ARCO, REDENÇÃO, RIO MARIA, SANTA MARIA DAS BARREIRAS, SANTANA DO ARAGUAIA E TUCUMÃ.					
MUNICÍPIOS DE DEMANDA ESPONTÂNEA: PAU D'ARCO, SAPUCAIA, XINGUARA E SÃO FÉLIX DO XINGU.					
PRODUTO	VIA PAVIMENTADA	UNIDADE	KM	META 2022	22 KM

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Para o ano de 2022, a Sedop planejou o atendimento de 11 (onze) dos 15 (quinze) municípios da Região Araguaia com obras de pavimentação através do desenvolvimento da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas*. Dos municípios planejados, apenas no município de Tucumã não houve execução de obra.

Em contrapartida, houve execução de obras de pavimentação em quatro municípios da Região que não haviam sido programados para o ano de 2022. São eles: Pau d'Arco, Sapucaia, Xinguara e São Félix do Xingu.

É importante esclarecer que em 2022, grande parte dos municípios programados também foram contemplados com recursos oriundos de demandas governamental e/ou emendas parlamentares, sendo desta forma celebrados Convênios de Cooperação Técnica com as respectivas Prefeituras Municipais para a execução de obras de pavimentação. No entanto, até o presente momento, foram realizados os repasses referentes às primeiras parcelas dos convênios, o que significa dizer que as obras estão na etapa de serviços preliminares, não sendo possível, neste estágio, obter quilômetros concluídos.

Sendo assim, alguns municípios apresentam obras em execução com quilômetros aferidos e também obras já iniciadas (Convênio), mas ainda sem quilômetros aferidos. Outros municípios possuem somente obras iniciadas (Convênio), e ainda sem quilômetros aferidos, como é o caso dos municípios de Bannach e São Félix do Xingu. As informações relacionadas à evolução de todas as obras que são objetos de convênio, encontram-se devidamente inseridas no Sistema SigPlan – Monitoramento no campo denominado *Informação Qualitativa*.

Para melhor entendimento, a tabela abaixo apresenta os municípios que tiveram quilômetros executados na Região Araguaia no decorrer do ano de 2022:

Nº	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	KM EXECUTADOS
1	CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	1,0
2	CUMARU DO NORTE	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	2,0
3	FLORESTA DO ARAGUAIA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS	3,0
	FLORESTA DO ARAGUAIA	REPASSE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BLOKRET SEXTAVADO NAS VILAS AMETISTA, BOM JESUS E VILA JUASSAMA.	2,0
	FLORESTA DO ARAGUAIA	REPASSE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BLOKRET SEXTAVADO EM RUAS E AVENIDAS NAS VILAS AMETISTA E BOM JESUS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	1,0
4	OURILÂNDIA DO NORTE	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	4,0
5	PAU D'ARCO	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	1,0
6	REDENÇÃO	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	8,0
7	RIO MARIA	REPASSE PARA RECOMPOSIÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	1,0
	RIO MARIA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	4,0
8	SANTA MARIA DAS BARREIRAS	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	2,0
9	SANTANA DO ARAGUAIA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	5,0
10	SAPUCAIA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	1,0
11	XINGUARA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	10,0
TOTAL REGIÃO ARAGUAIA			45 KM

Em relação ao desempenho físico, considerando a meta atualizada de 45 Km de vias pavimentadas na Região Araguaia, verificamos que a mesma ultrapassou a meta física estabelecida inicialmente de 22 Km para o ano de 2022, alcançando um percentual de execução física de 205%. Assim sendo, o cumprimento da meta física da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* nesta região foi acima do planejado.

Com relação ao desempenho financeiro, o valor de R\$ 8.876.998,00¹, orçado inicialmente para a Região Araguaia, foi acrescido de R\$ 94.874.436,67 para atender a região com execução de obras de pavimentação, totalizando o valor de R\$ 103.751.434,67². Esta

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

divergência *Orçamento Planejado X Orçamento Executado*, deve-se, em grande parte, ao fato de o valor estabelecido no teto orçamentário disponibilizado para Sedop ser insuficiente para o atendimento real do número de obras executadas através desta ação.

Portanto, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* na Região Araguaia, encerra o exercício de 2022 com status de *Conforme Programado*.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO BAIXO AMAZONAS

MUNICÍPIOS PLANEJADOS: ALENQUER, ALMEIRIM, CURUÁ, FARO, JURUTI, MONTE ALEGRE, ÓBIDOS, ORIXIMINÁ, PRAINHA, SANTARÉM.

MUNICÍPIO DE DEMANDA ESPONTÂNEA: BELTERRA

PRODUTO	VIA PAVIMENTADA	UNIDADE	KM	META 2022	29 KM
---------	-----------------	---------	----	-----------	-------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Para o ano de 2022, a Sedop planejou o atendimento de 10 (dez) dos 13 (treze) municípios da Região Baixo Amazonas com obras de pavimentação através do desenvolvimento da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas*. Dos municípios programados, três não tiveram execução de obras em 2022: Almeirim, Curuá e Prainha. Em contrapartida, houve execução de obra de pavimentação em um município da Região que não havia sido programado para o ano de 2022, que foi o Município de Belterra.

É importante esclarecer que, em 2022, grande parte dos municípios programados também foram contemplados com recursos oriundos de demandas governamental e/ou emendas parlamentares, sendo desta forma celebrados Convênios de Cooperação Técnica com as respectivas Prefeituras Municipais para a execução de obras de pavimentação. No entanto, até o presente momento, foram realizados os repasses referentes às primeiras parcelas dos convênios, o que significa dizer que as obras estão na etapa de serviços preliminares, não sendo possível, neste estágio, obter quilômetros concluídos.

Sendo assim, alguns municípios apresentam obras em execução com quilômetros aferidos e também obras já iniciadas (Convênio), mas ainda sem quilômetros aferidos. Outros possuem somente obras já iniciadas (Convênio), e sem quilômetros aferidos, como é o caso do município de Óbidos. As informações relacionadas à evolução de todas as obras que são objeto de convênio, encontram-se devidamente inseridas no Sistema SigPlan – Monitoramento no campo denominado *Informação Qualitativa*.

Em relação ao município de Faro, a ação prevista para 2022, anteriormente executada com recursos oriundos da Caixa, teve o contrato rescindido e passou a ser executado através do Programa Asfalto por Todo o Pará, sendo que até o momento não houve quilômetros de asfalto concluídos, pois ainda está na fase de serviços preliminares e movimentações de terra, apresentando um percentual de execução de 10%.

Para melhor entendimento, a tabela abaixo apresenta os municípios que tiveram quilômetros executados na Região Baixo Amazonas no decorrer do ano de 2022:

Nº	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	KM EXECUTADOS
1	ALENQUER	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	5,0
2	BELTERRA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	5,0
3	CURUÁ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	2,0
4	FARO	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	1,0
5	JURUTI	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	3,0
6	MOJÚ DOS CAMPOS	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	5,0
7	MONTE ALEGRE	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	10,0
8	ORIXIMINÁ	RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS.	3,0
9	SANTARÉM	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	6,0
TOTAL REGIÃO BAIXO AMAZONAS			40 KM

Em relação ao desempenho físico, considerando a meta atualizada de 40 km de vias pavimentadas na Região Baixo Amazonas, verificamos que a mesma ultrapassou a meta física estabelecida inicialmente de 29 Km para o ano de 2022, alcançando um percentual de execução física de 137%. Assim sendo, o cumprimento da meta física da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* nesta região foi acima do planejado.

Com relação ao desempenho financeiro, o valor de R\$ 5.002.918,00¹, orçado inicialmente para a Região Baixo Amazonas, foi acrescido de R\$ 46.590.931,53 para atender a região com execução de obras de pavimentação, totalizando o valor de R\$ 51.593.849,53². Esta divergência *Orçamento Planejado X Orçamento Executado*, deve-se, em grande parte, ao fato de o valor estabelecido no teto orçamentário disponibilizado para Sedop ser insuficiente para o atendimento real do número de obras executadas através desta ação.

Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* na Região Baixo Amazonas, encerra o exercício de 2022 com status de *Conforme Programado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO CARAJÁS

MUNICÍPIOS PLANEJADOS: BOM JESUS DO TOCANTINS, CANÃA DOS CARAJÁS, CURIONÓPOLIS, ELTORADO DOS CARAJÁS, MARABÁ, PARAUPEBAS, PIÇARRA, SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, SÃO JOÃO DO ARAGUAIA.

MUNICÍPIO DE DEMANDA ESPONTÂNEA: BREJO GRANDE DO ARAGUAIA.

PRODUTO	VIA PAVIMENTADA	UNIDADE	KM	META 2022	24 KM
---------	-----------------	---------	----	-----------	-------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Para o ano de 2022, a Sedop planejou o atendimento de nove dos doze municípios da Região Carajás com obras de pavimentação através do desenvolvimento da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas*. Dos municípios programados, três não tiveram execução de obras em 2022: Canaã dos Carajás, Parauapebas e São Geraldo do Araguaia.

Ressaltamos que esta Região de Integração faz parte da área de atuação da Companhia Vale do Rio Doce, sendo, portanto, atendida com recursos provenientes do Fundo para o Desenvolvimento Regional com Recursos da Desestatização (FRD2) do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) para a execução de obras de pavimentação e drenagem. Os municípios contemplados por este recurso são: Bom Jesus do Tocantins, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado dos Carajás e São João do Araguaia.

Com relação aos municípios de Canaã dos Carajás, Eldorado dos Carajás e São João do Araguaia, os projetos não foram implementados em consequência do posicionamento adotado pelo BNDES (gestor dos recursos) no primeiro semestre de 2020 de suspender a aprovação e liberação de novos projetos, situação esta que permanece atualmente. Quanto aos municípios de Bom Jesus do Tocantins e Curionópolis, as obras seguem em execução em conformidade com o cronograma físico e financeiro.

No município de Parauapebas, as tratativas para início de obras no decorrer de 2022, até o presente momento, ainda não se concretizaram. Esclarecemos que os municípios de Curionópolis, Marabá e São João do Araguaia foram contemplados, ainda, com recurso oriundo do Finisa – Caixa.

Para melhor entendimento, a tabela abaixo apresenta os municípios que tiveram quilômetros executados na Região Carajás no decorrer do ano de 2022:

Nº	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	KM EXECUTADOS
1	BOM JESUS DO TOCANTINS	PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET EM VIAS URBANAS (FRD II)	2,0 (11.788,88 m ²)
2	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	INFRAESTRUTURA VIÁRIA DAS VIAS URBANAS (FRD II)	4,0
3	CURIONÓPOLIS	DRENAGEM SUPERFICIAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (FRD II)	6,0
	CURIONÓPOLIS	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS	1,0
4	ELDORADO DOS CARAJÁS	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	1,0
5	MARABÁ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS	15,0
6	PIÇARRA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	1,0
7	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (FINISA).	1,0
8	SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA VILA NAZARÉ (FRD II)	2,0
TOTAL REGIÃO CARAJÁS			33 KM

Em relação ao desempenho físico, considerando a meta atualizada de 33,0 km de vias pavimentadas na Região Carajás, verificamos que a mesma ultrapassou a meta física estabelecida inicialmente de 24,0 Km para o ano de 2022, alcançando um percentual de execução física de 129%. Assim sendo, o cumprimento da meta física da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* nesta região foi acima do planejado.

Quanto ao desempenho financeiro, o valor orçado inicialmente de R\$ 6.591.218,00¹, foi acrescido de R\$ 35.107.868,00 para atender a região com execução de obras de pavimentação, chegando ao valor de R\$ 41.699.086,00². Esta divergência *Orçamento Planejado X Orçamento Executado*, deve-se, em grande parte, ao fato de o valor estabelecido no teto orçamentário disponibilizado para Sedop ser insuficiente para o atendimento real do número de obras executadas através desta ação.

Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* na Região Carajás, encerra o exercício de 2022 com status de *Conforme Programado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO GUAJARÁ

MUNICÍPIOS PLANEJADOS: BELÉM, BENEVIDES, MARITUBA E SANTA BÁRBARA DO PARÁ
MUNICÍPIO DE DEMANDA ESPONTÂNEA: ANANINDEUA

PRODUTO	VIA PAVIMENTADA	UNIDADE	KM	META 2022	93 KM
----------------	-----------------	----------------	----	------------------	-------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Para o ano de 2022, a Sedop executou obras de pavimentação da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas*, em todos os 05 (cinco) municípios da Região Guajará: Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara do Pará. Houve execução de obras de pavimentação em um município da Região que não havia sido programado no PPA, que foi Ananindeua. Por outro lado, não houve execução de obras em Santa Bárbara do Pará, que havia sido programado para atendimento.

É importante esclarecer que em 2022, grande parte dos municípios programados também foram contemplados com recursos oriundos de demandas governamental e/ou emendas parlamentares, sendo desta forma celebrados Convênios de Cooperação Técnica com as respectivas Prefeituras Municipais para a execução de obras de pavimentação. No entanto, até o presente momento, foram realizados os repasses referentes às primeiras parcelas dos convênios, o que significa dizer que as obras estão na etapa de serviços preliminares, não sendo possível, neste estágio, obter quilômetros concluídos.

Sendo assim alguns municípios apresentam obras em execução com quilômetros aferidos e também obras já iniciadas (Convênio), mas ainda sem quilômetros aferidos. As informações relacionadas à evolução de todas as obras que são objeto de convênio, encontram-se devidamente inseridas no Sistema SigPlan – Monitoramento no campo denominado *Informação Qualitativa*.

Para melhor entendimento, a tabela abaixo apresenta os municípios que tiveram quilômetros executados na Região Guajará no decorrer do ano de 2022:

Nº	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	KM EXECUTADOS
1	ANANINDEUA	REPASSE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	64,0
2	BELÉM	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	102,0
	BELÉM	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS – UNA/TAPANÃ (CAIXA)	1,0
	BELÉM	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS – TENONÉ (CAIXA)	1,0
3	BENEVIDES	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	22,0
4	MARITUBA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	35,0
TOTAL REGIÃO GUAJARÁ			225 KM

Em relação ao desempenho físico, considerando a meta atualizada de 225 km de vias pavimentadas na Região Guajará, verificamos que a mesma ultrapassou a meta física estabelecida inicialmente de 93 Km para o ano de 2022, alcançando um percentual de execução física de 241%. Assim sendo, o cumprimento da meta física da Ação 7645. *Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* nesta região foi Acima do Planejado.

Com relação ao desempenho financeiro, o valor orçado inicialmente de R\$ 7.001.760,00¹, foi acrescido de R\$ 248.372.657,51 para atender a região com execução de obras de pavimentação, totalizando o valor executado de R\$ 255.374.417,51². Esta divergência *Orçamento Planejado X Orçamento Executado*, deve-se, em grande parte, ao fato de o valor estabelecido no teto orçamentário disponibilizado para Sedop ser insuficiente para o atendimento real do número de obras executadas através desta ação.

Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da Ação 7645. *Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* na Região Guajará, encerra o exercício de 2022 com status de *Conforme Programado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO GUAMÁ

MUNICÍPIOS PLANEJADOS: CASTANHAL, CURUÇA, IGARAPÉ-AÇU, MAGALHÃES BARATA, MARAPANIM, SANTA MARIA DO PARÁ, SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ, SÃO CAETANO DE ODIVELAS, SÃO DOMINGOS DO CAPIM, SÃO FRANCISCO DO PARÁ, TERRA ALTA E VIGIA.

MUNICÍPIOS DE DEMANDA ESPONTÂNEA: SANTA IZABEL DO PARÁ E SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

PRODUTO	VIA PAVIMENTADA	UNIDADE	KM	META 2022	12 KM
----------------	-----------------	----------------	----	------------------	-------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Para o ano de 2022, a Sedop planejou o atendimento de 12 (doze) dos 18 (dezoito) municípios da Região Guamá com obras de pavimentação através do desenvolvimento da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas*. Dos municípios programados, cinco não tiveram execução de obras em 2022: Magalhães Barata, Santo Antônio do Tauá, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim e São Francisco do Pará.

Em contrapartida, houve execução de obra de pavimentação em dois municípios da Região que não haviam sido programados para o ano de 2022. São eles: Santa Izabel do Pará e São Miguel do Guamá.

É importante esclarecer que em 2022, grande parte dos municípios programados também foram contemplados com recursos oriundos de demandas governamental e/ou emendas parlamentares, sendo desta forma celebrados Convênios de Cooperação Técnica com as respectivas Prefeituras Municipais para a execução de obras de pavimentação. No entanto, até o presente momento, foram realizados os repasses referentes às primeiras parcelas dos convênios, o que significa dizer que as obras estão na etapa de serviços preliminares, não sendo possível, neste estágio, obter quilômetros concluídos.

Sendo assim alguns municípios apresentam obras em execução com quilômetros aferidos e também obras já iniciadas (Convênio), mas ainda sem quilômetros aferidos. Outros possuem somente obras já iniciadas (Convênio), e ainda sem quilômetros aferidos, como é o caso dos municípios de Santa Maria do Pará e Terra Alta. As informações relacionadas à evolução de todas as obras que são objeto de convênio, encontram-se devidamente inseridas no Sistema SigPlan – Monitoramento no campo denominado *Informação Qualitativa*.

Para melhor entendimento, a tabela abaixo apresenta os municípios que tiveram quilômetros executados na Região Guamá no decorrer do ano de 2022:

Nº	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	KM EXECUTADOS
1	CASTANHAL	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	6,0
	CASTANHAL	REPASSE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	1,0
2	CURUÇÁ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	1,0
2	IGARAPÉ-AÇU	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	4,0
4	MARAPANIM	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	4,0
5	SANTA IZABEL DO PARÁ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	9,0
6	SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	REPASSE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	2,0
7	VIGIA	REPASSE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	1,0
TOTAL REGIÃO GUAMÁ			28 KM

Em relação ao desempenho físico, considerando a meta atualizada de 28 km de vias pavimentadas na Região Guamá, verificamos que a mesma ultrapassou a meta física estabelecida inicialmente de 12 Km para o ano de 2022, alcançando um percentual de execução física de 233%. Assim sendo, o cumprimento da meta física da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* nesta região foi acima do planejado.

Com relação ao desempenho financeiro, o valor orçado inicialmente de R\$ 3.014.280,00¹ foi acrescido de R\$ 58.298.006,86 para atender a região com execução de obras de pavimentação, totalizando o valor de R\$ 61.312.286,86². Esta divergência *Orçamento Planejado X Orçamento Executado*, deve-se, em grande parte, ao fato de o valor estabelecido no teto orçamentário disponibilizado para Sedop ser insuficiente para o atendimento real do número de obras executadas através desta ação.

Por fim, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* na Região Guamá, encerra o exercício de 2022 com status de *Conforme Programado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO LAGO DE TUCURUÍ

MUNICÍPIOS PLANEJADOS: GOIANÉSIA DO PARÁ, ITUPIRANGA, JACUNDÁ, NOVA IPIXUNA, NOVO REPARTIMENTO, TUCURUÍ.

MUNICÍPIO DE DEMANDA ESPONTÂNEA: BREU BRANCO

PRODUTO	VIA PAVIMENTADA	UNIDADE	KM	META 2022	17 KM
---------	-----------------	---------	----	-----------	-------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Para o ano de 2022, a Sedop planejou o atendimento de seis dos sete municípios da Região Lago de Tucuruí com obras de pavimentação através do desenvolvimento da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas*. Dos municípios planejados, todos tiveram execução de obras em 2022, além do atendimento do município de Breu Branco que, por mais que não estivesse na programação, foi atendido pela Sedop. Sendo assim, em 2022 a Sedop realizou obras de pavimentação em todos os municípios desta região.

É importante esclarecer que em 2022, grande parte dos municípios programados também foram contemplados com recursos oriundos de demandas governamental e/ou emendas parlamentares, sendo desta forma celebrados Convênios de Cooperação Técnica com as respectivas Prefeituras Municipais para a execução de obras de pavimentação. No entanto, até o presente momento, foram realizados os repasses referentes às primeiras parcelas dos convênios, o que significa dizer que as obras estão na etapa de serviços preliminares, não sendo possível, neste estágio, obter quilômetros concluídos.

Sendo assim alguns municípios apresentam obras em execução com quilômetros aferidos e também obras já iniciadas (Convênio), mas ainda sem quilômetros aferidos. As informações relacionadas à evolução de todas as obras que são objeto de convênio, encontram-se devidamente inseridas no Sistema SigPlan – Monitoramento no campo denominado *Informação Qualitativa*.

Para melhor entendimento, a tabela abaixo apresenta os municípios que tiveram quilômetros executados na Região Lago de Tucuruí no decorrer do ano de 2022:

Nº	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	KM EXECUTADOS
1	BREU BRANCO	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (PIRTUC).	4,0
	BREU BRANCO	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS	1,0
2	GOIANÉSIA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (FINISA).	1,0
	GOIANÉSIA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (PIRTUC).	4,0
	GOIANÉSIA	REPASSE PARA EXECUÇÃO DE MEIO FIO, SARJETA E SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL EM VIAS PÚBLICAS.	25,0
3	ITUPIRANGA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (PIRTUC).	4,0
	ITUPIRANGA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS	6,0
4	JACUNDÁ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (PIRTUC).	4,0
	JACUNDÁ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS	4,0
5	NOVA IPIXUNA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (PIRTUC).	4,0
6	NOVO REPARTIMENTO	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (PIRTUC).	4,0
7	TUCURUÍ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (FINISA).	1,0
	TUCURUÍ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (PIRTUC).	4,0
TOTAL REGIÃO LAGO DE TUCURUÍ			66 KM

Em relação ao desempenho físico, a meta alcançada de 66 km de vias pavimentadas na Região Lago Tucuruí, ultrapassou a meta física estabelecida de 17 Km para o ano de 2022, apresentando um percentual de execução física de 388%.

No que diz respeito à execução financeira, o valor orçado inicialmente de R\$ 2.140.030,00¹, foi atualizado em R\$ 41.641.045,18 para atender a região com execução de obras de pavimentação, chegando ao valor de R\$ 43.781.075,18². Esta atualização foi necessária, principalmente, devido à grande demanda de serviços relacionados à execução obras de pavimentação que a Sedop recebe, cuja dotação inicial era insuficiente para o perfeito atendimento dos pleitos.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

Por fim, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* na Região Lago de Tucuruí, encerra o exercício de 2022 com status de *Conforme Programado*.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO MARAJÓ

MUNICÍPIOS PLANEJADOS: BAGRE, CACHOEIRA DO ARARI, CURRALINHO, GURUPÁ, MUANÁ, OEIRAS DO PARÁ, PONTA DE PEDRAS, PORTEL, SALVATERRA, SOURE.

MUNICÍPIOS DE DEMANDA ESPONTÂNEA: AFUÁ, BREVES, CHAVES.

PRODUTO	VIA PAVIMENTADA	UNIDADE	KM	META 2022	16 KM
----------------	-----------------	----------------	----	------------------	-------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Para o ano de 2022, a Sedop planejou o atendimento de 10 (dez) dos 17 (dezesete) municípios da Região Marajó com obras de pavimentação através do desenvolvimento da Ação 7645. *Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas*. Dos municípios programados, dois não tiveram execução de obras em 2022: Cachoeira do Arari e Gurupá.

Em contrapartida, houve execução de obra de pavimentação em três municípios da Região que não haviam sido programados para o ano de 2022. São eles: Afuá, Breves e Chaves.

É importante esclarecer que, em 2022, grande parte dos municípios programados também foram contemplados com recursos oriundos de demandas governamental e/ou emendas parlamentares, sendo desta forma celebrados Convênios de Cooperação Técnica com as respectivas Prefeituras Municipais para a execução de obras de pavimentação. No entanto, até o presente momento, foram realizados os repasses referentes às primeiras parcelas dos convênios, o que significa dizer que as obras estão na etapa de serviços preliminares, não sendo possível, neste estágio, obter quilômetros concluídos.

Sendo assim, alguns municípios apresentam obras em execução com quilômetros aferidos e também obras já iniciadas (Convênio), mas ainda sem quilômetros aferidos. Outros possuem somente obras iniciadas (Convênio), e ainda sem quilômetros aferidos, como é o caso do município de Chaves. As informações relacionadas à evolução de todas as obras que são objeto de convênio, encontram-se devidamente inseridas no Sistema SigPlan – Monitoramento no campo denominado *Informação Qualitativa*.

Para melhor entendimento, a tabela abaixo apresenta os municípios que tiveram quilômetros executados na Região Guamá no decorrer do ano de 2022:

Nº	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	KM EXECUTADOS
1	BAGRE	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	3,0
2	BREVES	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	6,0
3	MUANÁ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS	6,0
4	OEIRAS DO PARÁ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS	2,0
5	PONTA DE PEDRAS	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS	3,0
6	PORTEL	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS	3,0
7	SALVATERRA	REPASSE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS	4,0
8	SOURE	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS	3,0
	SOURE	REPASSE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS	3,0
TOTAL REGIÃO MARAJÓ			33 KM

Em relação ao desempenho físico, considerando a meta atualizada de 33 km de vias pavimentadas na Região Marajó, verificamos que a mesma ultrapassou a meta física estabelecida inicialmente de 16 Km para o ano de 2022, alcançando um percentual de execução física de 206%. Assim sendo, o cumprimento da meta física da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* nesta região foi acima do planejado.

Com relação ao desempenho financeiro, o valor orçado inicialmente de R\$ 3.410.710,00¹, foi acrescido de R\$ 45.894.875,79 para atender a região com execução de obras de pavimentação, totalizando o valor de R\$ 49.305.585,79². Esta divergência *Orçamento Planejado X Orçamento Executado*, deve-se, em grande parte, ao fato de o valor estabelecido no teto orçamentário disponibilizado para Sedop ser insuficiente para o atendimento real do número de obras executadas através desta ação.

Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7536. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* na Região Marajó, encerra o exercício de 2022 com status de *Conforme Programado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO RIO CAETÉ

MUNICÍPIOS PLANEJADOS: BONITO, BRAGANÇA, CACHOEIRA DO PIRIÁ, CAPANEMA, NOVA TIMBOTEUA, PEIXE-BOI, PRIMAVERA, SANTA LUZIA DO PARÁ, SÃO JOÃO DE PIRABAS, TRACUATEUA, VISEU.

OBRAS DE DEMANDA ESPONTÂNEA: QUATIPURU

PRODUTO	VIA PAVIMENTADA	UNIDADE	KM	META 2022	19 KM
---------	-----------------	---------	----	-----------	-------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Para o ano de 2022, a Sedop planejou o atendimento de 12 (doze) dos 15 (quinze) municípios da Região Rio Caeté com obras de pavimentação através do desenvolvimento da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas*. Dos municípios programados, o município de Augusto Corrêa não teve execução de obra em 2022. Em contrapartida, houve execução de obra de pavimentação no município de Quatipuru, embora o mesmo não estivesse na programação do ano em exercício.

É importante esclarecer que, em 2022, grande parte dos municípios programados também foram contemplados com recursos oriundos de demandas governamental e/ou emendas parlamentares, sendo desta forma celebrados Convênios de Cooperação Técnica com as respectivas Prefeituras Municipais para a execução de obras de pavimentação. No entanto, até o presente momento, foram realizados os repasses referentes às primeiras parcelas dos convênios, o que significa dizer que as obras estão na etapa de serviços preliminares, não sendo possível, neste estágio, obter quilômetros concluídos.

Sendo assim, alguns municípios apresentam obras em execução com quilômetros aferidos e também obras já iniciadas (Convênio), mas ainda sem quilômetros aferidos. As informações relacionadas à evolução de todas as obras que são objeto de convênio, encontram-se devidamente inseridas no Sistema SigPlan – Monitoramento no campo denominado *Informação Qualitativa*.

Para melhor entendimento, a tabela abaixo apresenta os municípios que tiveram quilômetros executados na Região Rio Caeté no decorrer do ano de 2022:

Nº	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	KM EXECUTADOS
1	BONITO	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	3,0
2	BRAGANÇA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	10,0
	BRAGANÇA	REPASSE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	5,0
3	CACHOEIRA DO PIRIÁ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	3,0
	CACHOEIRA DO PIRIÁ	REPASSE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	1,0
4	CAPANEMA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	8,0
5	NOVA TIMBOTEUA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	4,0
6	PEIXE - BOI	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	2,0
7	PRIMAVERA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	3,0
8	QUATIPURU	REPASSE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	7,0
9	SANTA LUZIA DO PARÁ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	3,0
10	SÃO JOÃO DE PIRABAS	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	3,0
11	TRACUATEUA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	3,0
12	WISEU	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	10,0
TOTAL REGIÃO RIO CAETÉ			65 KM

Quanto ao desempenho físico, a meta alcançada de 65 km de vias pavimentadas, ultrapassou a meta física estabelecida de 19 Km para o ano de 2022, alcançando um percentual de execução física de 342%. Assim, o cumprimento da meta física da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* foi acima do planejado.

Quanto ao desempenho financeiro, o valor orçado inicialmente de R\$ 6.264.963,00¹ foi acrescido de R\$ 13.026.448,87, totalizando o valor de R\$ 19.291.411,87². Esta divergência *Orçamento Planejado X Orçamento Executado*, deve-se, em grande parte, ao fato de o valor estabelecido no teto orçamentário disponibilizado para Sedop ser insuficiente para o atendimento real do número de obras executadas através desta ação.

Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* na Região Rio do Caeté, encerra o exercício de 2022 com status de *Conforme Programado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO RIO CAPIM

MUNICÍPIOS PLANEJADOS: ABEL FIGUEIREDO, AURORA DO PARÁ, BUJARU, CAPITÃO POÇO, CONCÓRDIA DO PARÁ, DOM ELISEU, IPIXUNA DO PARÁ, IRITUIA, MÃE DO RIO, NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, RONDON DO PARÁ, TOMÉ-AÇU, ULIANÓPOLIS.

MUNICÍPIOS DE DEMANDA ESPONTÂNEA: OURÉM, PARAGOMINAS.

PRODUTO	VIA PAVIMENTADA	UNIDADE	KM	META 2022	25 KM
----------------	-----------------	----------------	----	------------------	-------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Para o ano de 2022, a Sedop planejou o atendimento de 14 (quatorze) dos 16 (dezesseis) municípios da Região Rio Capim com obras de pavimentação através do desenvolvimento da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas*. Dos municípios programados, dois não tiveram execução de obras em 2022: Abel figueiredo e Bujaru. Em contrapartida, houve execução de obra de pavimentação em dois municípios da Região que não haviam sido programados para o ano de 2022. São eles: Ourém e Paragominas.

É importante esclarecer que em 2022, grande parte dos municípios programados também foram contemplados com recursos oriundos de demandas governamental e/ou emendas parlamentares, sendo desta forma celebrados Convênios de Cooperação Técnica com as respectivas Prefeituras Municipais para a execução de obras de pavimentação. No entanto, até o presente momento, foram realizados os repasses referentes às primeiras parcelas dos convênios, o que significa dizer que as obras estão na etapa de serviços preliminares, não sendo possível, neste estágio, obter quilômetros concluídos.

Sendo assim, alguns municípios apresentam obras em execução com quilômetros aferidos e também obras já iniciadas (Convênio), mas ainda sem quilômetros aferidos. As informações relacionadas à evolução de todas as obras que são objeto de convênio, encontram-se devidamente inseridas no Sistema SigPlan – Monitoramento no campo denominado *Informação Qualitativa*.

Em relação ao município de Mãe do Rio, este município possui, ainda, uma ação de pavimentação prevista para 2022 - anteriormente executada com recursos oriundos da Caixa - a qual teve o contrato rescindido e passou a ser executada através do Programa Asfalto por Todo o Pará, sendo que, até o momento, não teve quilômetros de asfalto concluídos.

Quanto ao município de Ulianópolis, este município também possui uma ação de pavimentação prevista para 2022 - anteriormente executada com recursos oriundos da Caixa

- a qual teve seu contrato rescindido e passou por um novo processo licitatório, sendo que, até o momento, não teve quilômetros de asfalto concluídos, estando com um percentual de execução de apenas 8%.

Para melhor entendimento, a tabela abaixo apresenta os municípios que tiveram quilômetros executados na Região Rio Capim no decorrer do ano de 2022:

Nº	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	KM EXECUTADOS
1	AURORA DO PARÁ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	6,0
2	CAPITÃO POÇO	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	15,0
3	CONCÓRDIA DO PARÁ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	11,0
4	DOM ELISEU	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	8,0
	DOM ELISEU	REPASSE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	2,0
5	GARRAÃO DO NORTE	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	5,0
	GARRAÃO DO NORTE	REPASSE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	2,0
6	IPIXUNA DO PARÁ	REPASSE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	6,0
7	IRITUIA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	3,0
8	MÃE DO RIO	REPASSE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	4,0
	MÃE DO RIO	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	10,0
9	NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	7,0
10	OURÉM	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	2,0
	OURÉM	REPASSE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	1,0
11	PARAGOMINAS	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	10,0
12	RONDON DO PARÁ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	7,0
	RONDON DO PARÁ	REPASSE PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	1,00
13	TOMÉ - AÇU	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	12,0
14	ULIANÓPOLIS	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	8,0
TOTAL REGIÃO RIO CAPIM			120 KM

Em relação ao desempenho físico, considerando a meta atualizada de 120 km de vias pavimentadas na Região Rio Capim, verificamos que a mesma ultrapassou a meta física estabelecida inicialmente de 25 Km para o ano de 2022, alcançando um percentual de execução física de 480%. Assim sendo, o cumprimento da meta física da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* nesta região foi acima do planejado.

Com relação ao desempenho financeiro, o valor orçado inicialmente de R\$ 7.834.611,00¹ foi atualizado em R\$ 109.729.453,32 para atender a região com execução de obras de pavimentação, chegando ao valor de R\$ 117.564.064,32². Esta atualização foi necessária, principalmente, devido à grande demanda de serviços relacionados à execução de obras de pavimentação que a Sedop recebe, cuja dotação inicial era insuficiente para o atendimento dos pleitos.

Finalizando, considerando o cenário exposto, a Sedop obteve, no ano de 2022, na Região Rio Capim, na *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas*, o status de *Conforme Programado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO TAPAJÓS

MUNICÍPIOS PLANEJADOS: AVEIRO, ITAITUBA, JACAREACANGA, NOVO PROGRESSO, RURÓPOLIS, TRAIRÃO

PRODUTO	VIA PAVIMENTADA	UNIDADE	KM	META 2022	9 KM
---------	-----------------	---------	----	-----------	------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Para o ano de 2022, a Sedop planejou o atendimento de todos os municípios da Região Tapajós com obras de pavimentação através do desenvolvimento da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas*. Dos municípios planejados, o único que não teve execução de obras em 2022, foi o município de Aveiro.

É importante esclarecer que em 2022, a Região Tapajós também foi contemplada com recursos oriundos de demandas governamental e/ou emendas parlamentares, sendo, desta forma, celebrados Convênios de Cooperação Técnica com as respectivas Prefeituras Municipais para a execução de obras de pavimentação. No entanto, até o presente momento, foram realizados os repasses referentes às primeiras parcelas dos convênios, o que significa dizer que as obras estão na etapa de serviços preliminares, não sendo possível, neste estágio, obter quilômetros concluídos.

Sendo assim alguns municípios apresentam obras em execução com quilômetros aferidos e também obras já iniciadas (Convênio), mas ainda sem quilômetros aferidos. As informações relacionadas à evolução de todas as obras que são objeto de convênio, encontram-se devidamente inseridas no Sistema SigPlan – Monitoramento no campo denominado *Informação Qualitativa*.

Outro ponto a ser destacado é que esta Região de Integração é beneficiada com recurso oriundo do Contrato de financiamento com o New Development Bank – NDB para implementação de ações voltadas para o componente Infraestrutura Urbana – Mobilidade.

No município de Novo Progresso, para o ano de 2022, também foi prevista a continuidade da execução de obra de pavimentação de vias urbanas com recurso oriundo da Caixa Econômica Federal – CEF. Entretanto, o projeto encontra-se em fase de reprogramação com redução de metas e conclusão com funcionalidade. Após aprovada a reprogramação junto à CEF, a Sedop encerrará o objeto.

Para melhor entendimento, a tabela abaixo apresenta os municípios que tiveram quilômetros executados na Região Tapajós no decorrer do ano de 2022:

Nº	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	KM EXECUTADOS
1	ITAITUBA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL (NDB)	22,0
2	NOVO PROGRESSO	REPASSE PREFEITURA - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, NOS BAIRROS BELA VISTA E CRISTO REI.	1,0
	NOVO PROGRESSO	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL (NDB)	14,0
3	RURÓPOLIS	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL (NDB)	14,0
4	JACAREACANGA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL (NDB)	2,0
5	TRAIRÃO	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL (NDB)	9,0
TOTAL REGIÃO TAPAJÓS			62 KM

Em relação ao desempenho físico, considerando a meta atualizada de 62 Km de vias pavimentadas na Região Tapajós, verificamos que a mesma ultrapassou a meta física estabelecida inicialmente de 09 Km para o ano de 2022, alcançando um percentual de execução física de 688%. Assim sendo, o cumprimento da meta física da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* nesta região foi acima do planejado.

Com relação ao desempenho financeiro, o orçamento programado para atender esta ação na Região Tapajós foi de R\$ 3.727.374,00¹ sendo atualizado em R\$ 70.379.676,91, totalizando R\$ 74.107.050,91².

Por fim, considerando o cenário acima exposto, a Sedop destaca que no ano de 2022, na Região Tapajós, a *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas*, teve um desempenho físico e financeiro *Conforme Programado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO TOCANTINS

MUNICÍPIOS PLANEJADOS: ABAETETUBA, ACARÁ, BAIÃO, IGARAPÉ-MIRI, MOJU, OEIRAS DO PARÁ, TAILÂNDIA

MUNICÍPIOS DE DEMANDA ESPONTÂNEA: BARCARENA, LIMOEIRO DO AJURU, MOCAJUBA

PRODUTO	VIA PAVIMENTADA	UNIDADE	KM	META 2022	30 KM
---------	-----------------	---------	----	-----------	-------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Para o ano de 2022, a Sedop planejou o atendimento de sete dos 10 (dez) municípios da Região Tocantins com obras de pavimentação através do desenvolvimento da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas*. Dos municípios programados, todos tiveram execução de obras, além disso, houve execução de obra de pavimentação em três municípios da Região que não haviam sido programados para o ano de 2022: Barcarena, Limoeiro do Ajuru e Mocajuba.

É importante esclarecer que em 2022, a Região Tocantins também foi contemplada com recursos oriundos de demandas governamental e/ou emendas parlamentares, sendo, desta forma, celebrados Convênios de Cooperação Técnica com as respectivas Prefeituras Municipais para a execução de obras de pavimentação. No entanto, até o presente momento, foram realizados os repasses referentes às primeiras parcelas dos convênios, o que significa dizer que as obras estão na etapa de serviços preliminares, não sendo possível, neste estágio, obter quilômetros concluídos.

Sendo assim, alguns municípios apresentam obras em execução com quilômetros aferidos e também obras já iniciadas (Convênio), mas ainda sem quilômetros aferidos. As informações relacionadas à evolução de todas as obras que são objeto de convênio, encontram-se devidamente inseridas no Sistema SigPlan – Monitoramento no campo denominado *Informação Qualitativa*.

Para melhor entendimento, a tabela abaixo apresenta os municípios que tiveram quilômetros executados na Região Tocantins no decorrer do ano de 2022:

Nº	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	KM EXECUTADOS
1	ABAETETUBA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	23,0
2	ACARÁ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	2,0
3	BAIÃO	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	11,0
4	BARCARENA	REPASSE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	1,0
5	CAMETÁ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	24,0
6	IGARAPÉ - MIRI	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	15,0
7	LIMOEIRO DO AJURU	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	4,0
8	MOCAJUBA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	7,0
9	MOJU	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	16,0
10	TAILÂNDIA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	16,0
TOTAL REGIÃO TOCANTINS			119 KM

Em relação ao desempenho físico, considerando a meta atualizada de 119 km de vias pavimentadas na Região Tocantins, verificamos que a mesma ultrapassou a meta física estabelecida inicialmente de 30 Km para o ano de 2022, alcançando um percentual de execução física de 396%. Assim sendo, o cumprimento da meta física da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* nesta região foi acima do planejado.

Com relação ao desempenho financeiro, o valor orçado inicialmente de R\$ 10.150.000,00¹ foi acrescido de R\$ 79.869.119,53 para atender a região com execução de obras de pavimentação, totalizando o valor de R\$ 90.019.119,53². Esta divergência *Orçamento Planejado X Orçamento Executado*, deve-se, em grande parte, ao fato de o valor estabelecido no teto orçamentário disponibilizado para Sedop ser insuficiente para o atendimento real do número de obras executadas através desta ação.

Por último, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* na Região Tocantins, encerra o exercício de 2022 com status de *Conforme Programado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO XINGU

MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ALTAMIRA, ANAPU, BRASIL NOVO, MEDICILÂNDIA, PACAJÁ PLACAS, PORTO DE MOZ, SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, URUARÁ E VITÓRIA DO XINGU

PRODUTO	VIA PAVIMENTADA	UNIDADE	KM	META 2022	131 KM
---------	-----------------	---------	----	-----------	--------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Para o ano de 2022, a Sedop planejou o atendimento de todos os municípios da Região Xingu com obras de pavimentação através do desenvolvimento da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas*. Dos municípios planejados, o único que não teve execução de obras em 2022, foi o município de Vitória do Xingu.

É importante esclarecer que em 2022, a Região Xingu também foi contemplada com recursos oriundos de demandas governamental e/ou emendas parlamentares, sendo, desta forma, celebrados Convênios de Cooperação Técnica com as respectivas Prefeituras Municipais para a execução de obras de pavimentação. No entanto, até o presente momento, foram realizados os repasses referentes às primeiras parcelas dos convênios, o que significa dizer que as obras estão na etapa de serviços preliminares, não sendo possível, neste estágio, obter quilômetros concluídos.

Sendo assim, alguns municípios apresentam obras em execução com quilômetros aferidos e também obras já iniciadas (Convênio), mas ainda sem quilômetros aferidos. As informações relacionadas à evolução de todas as obras que são objeto de convênio, encontram-se devidamente inseridas no Sistema SigPlan – Monitoramento no campo denominado *Informação Qualitativa*.

Para melhor entendimento, a tabela abaixo apresenta os municípios que tiveram quilômetros executados na Região Xingu no decorrer do ano de 2022:

Nº	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	KM EXECUTADOS
1	ALTAMIRA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS.	8,0
2	ANAPU	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (CAF).	2,0
3	BRASIL NOVO	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS	2,0
	BRASIL NOVO	REPASSE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS	3,0
	BRASIL NOVO	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (NDB)	17,0
4	MEDICILÂNDIA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (NDB).	7,0
5	PACAJÁ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (CAF).	15,0
6	PLACAS	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (NDB).	10,0
7	PORTO DE MOZ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (CAF).	8,0
8	SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (NDB).	2,0
9	URUARÁ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS (NDB).	12,0
TOTAL REGIÃO XINGU			86 KM

Em relação ao desempenho físico, considerando a meta atualizada de 86 Km de vias pavimentadas na Região Xingu, verificamos que a mesma não alcançou a meta física estabelecida inicialmente de 131 Km para o ano de 2022, alcançando um percentual de execução física de apenas 65%. Assim sendo, o cumprimento da meta física da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* nesta região foi abaixo do planejado.

Com relação ao desempenho financeiro, o valor orçado inicialmente de R\$ 6.992.564,00¹ foi acrescido de R\$ 87.397.589,31 para atender a região com execução de obras de pavimentação, totalizando o valor de R\$ 94.390.153,31². Esta divergência *Orçamento Planejado X Orçamento Executado*, deve-se em grande parte, ao fato de o valor estabelecido no teto orçamentário disponibilizado para Sedop ser insuficiente para o atendimento real do número de obras executadas através desta ação.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* na Região Xingu, encerra o exercício de 2022 com status de *Abaixo do Esperado*.

2.3.1.7. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GOVERNANÇA METROPOLITANA

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO BAIXO AMAZONAS					
MUNICÍPIOS PLANEJADOS: BELTERRA, MOJUÍ DOS CAMPOS E SANTARÉM.					
PRODUTO	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2022	1 SISTEMA IMPLANTADO
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022					
<p>Por se tratar de uma ação que envolve diferentes esferas de governo, diversos agentes econômicos, atores sociais e atores políticos, seu desenvolvimento não está completamente sob a governabilidade da Sedop, a implementação desta ação na Região Baixo Amazonas não teve o desenvolvimento de acordo com o programado para o ano de 2022.</p> <p>Esperava-se que, em 2022, houvesse continuidade na atividade de Repactuação do Acordo de Cooperação Técnica entre Estado e Municípios, com a realização de reuniões estratégicas, jurídicas e técnicas entre a Sedop e as Prefeituras Municipais da Região Metropolitana de Santarém. Estas reuniões têm como objetivo elaborar conjuntamente o instrumento de repactuação da responsabilidade dos entes federativos quanto à elaboração do Projeto de Lei que regulamenta a Região Metropolitana, em atendimento ao que preconiza o Estatuto da MetrÓpole e a Lei de criação da Sedop, culminando na assinatura do acordo entre as partes envolvidas.</p> <p>No entanto, atividades interrompidas, tais como estudos e pesquisas para elaboração do Termo de Referência para a contratação de consultoria voltada para o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI), continuaram paralisadas no decorrer do ano de 2022.</p> <p>Acrescenta-se às situações acima relatadas, o fato de que, para a <i>Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana</i> se concretizar, tendo o Sistema Implantado na Região Baixo Amazonas, a resolutividade de condicionantes políticas é fundamental para a continuidade do processo.</p> <p>Quanto à meta física estabelecida, reforçando o que já foi esclarecido em relatórios anteriores, apresentamos as seguintes ponderações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A meta da <i>Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana</i> é ter 01 Sistema de Governança Implantado na Região Metropolitana de Santarém – RMS, a qual abrange três municípios da Região de Integração Baixo Amazonas (Belterra, Mojuí dos 					

Campos e Santarém) e não ter 01 sistema implantado em cada município e em cada ano do PPA, como o sistema SigPlan consolidada;

- A obtenção do produto/meta desta ação tem como prazo limite o período de vigência do PPA 2020/2023, ou seja, até o final do ano de 2023.

No que diz respeito a execução financeira, embora a *Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana* tenha recebido aporte orçamentário para o ano de 2022, como não houve o desenvolvimento esperado no exercício de 2022, conseqüentemente, não houve dispêndios financeiros.

Frente ao exposto, a Sedop espera fundamentar o motivo do baixo desempenho físico e financeiro da *Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana* na Região Baixo Amazonas, que apresenta o status de *Abaixo do Esperado*.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO CARAJÁS

MUNICÍPIOS PLANEJADOS: BOM JESUS DO TOCANTINS, MARABÁ, SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, SÃO JOÃO DO ARAGUAIA.

PRODUTO	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2022	1 SISTEMA IMPLANTADO
---------	--------------------	---------	----	-----------	----------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Por se tratar de uma ação que envolve diferentes esferas de governo, diversos agentes econômicos, atores sociais e atores políticos, seu desenvolvimento não está completamente sob a governabilidade da Sedop, a implementação desta ação na Região Carajás não teve o desenvolvimento de acordo com o programado para o ano de 2022.

Esperava-se que, em 2022, houvesse continuidade na atividade de levantamento das Funções Públicas e Interesse Comum no município de Marabá e demais municípios. Este levantamento tem como objetivo verificar se o município Polo de Marabá e demais municípios adjacentes podem caracterizar a existência de uma Região Metropolitana e assim, subsidiar o pleito de criação da Região Metropolitana de Marabá. No entanto, o levantamento permaneceu paralisado no decorrer do ano de 2022.

Acrescenta-se ao cenário acima relatado, o fato de que, para a *Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana* se concretizar, tendo o Sistema Implantado na Região Carajás, a resolutividade de condicionantes políticas é fundamental para a continuidade do processo.

Quanto à meta física estabelecida, reforçando o que já foi esclarecido em relatórios anteriores, apresentamos as seguintes ponderações:

- A meta da *Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana* é ter 01 Sistema de Governança Implantado na Região Metropolitana de Marabá – RMM, caso a referida RMM seja instituída. O Projeto de lei nº 167/2012 estabelece a composição da RMM com municípios que fazem parte da Região de Integração Carajás (Bom Jesus do Tocantins, Marabá e São Domingos do Araguaia) e da Região de Integração Lago de Tucuruí (Itupiranga e Nova Ipixuna);
- A obtenção do produto/meta desta ação tem como prazo limite o período de vigência do PPA 2020/2023, ou seja, até o final do ano de 2023.

No que diz respeito à execução financeira, embora a *Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana* tenha recebido aporte orçamentário para o ano de 2022, como não houve o desenvolvimento esperado no exercício de 2022, conseqüentemente, não houve dispêndios financeiros.

Frente ao exposto, a Sedop espera fundamentar o motivo do baixo desempenho físico e financeiro da *Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana* na Região Carajás, o que confere o status de *Abaixo do Esperado*.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO GUAJARÁ

MUNICÍPIOS PLANEJADOS: ANANINDEUA, BELÉM, BENEVIDES, MARITUBA, SANTA BÁRBARA DO PARÁ.

PRODUTO	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2022	1 SISTEMA IMPLANTADO
---------	--------------------	---------	----	-----------	----------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Por se tratar de uma ação que envolve diferentes esferas de governo, diversos agentes econômicos, atores sociais e atores políticos, seu desenvolvimento não está completamente sob a governabilidade da Sedop, a implementação desta ação na Região Guajará não teve o desenvolvimento de acordo com o programado para o ano de 2022.

Esperava-se que, em 2022, houvesse continuidade na atividade de Repactuação do Acordo de Cooperação Técnica entre Estado e Municípios, com a realização de reuniões estratégicas, jurídicas e técnicas entre a Sedop e as Prefeituras Municipais da Região Metropolitana de Belém. Estas reuniões têm como objetivo elaborar conjuntamente o instrumento de repactuação da responsabilidade dos entes federativos quanto à elaboração do Projeto de Lei que regulamenta a Região Metropolitana, em atendimento ao que preconiza o Estatuto da MetrÓpole e a Lei de criação da Sedop, culminando na assinatura do acordo entre as partes envolvidas.

No entanto, atividades interrompidas, tais como estudos e pesquisas para elaboração do Termo de Referência para a contratação de consultoria voltada para o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI), continuaram paralisadas no decorrer do ano de 2022.

Acrescenta-se às situações acima relatadas, o fato de que, para a *Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana* se concretizar, tendo o Sistema Implantado na Região Guajará, a resolutividade de condicionantes políticas é fundamental para a continuidade do processo.

Quanto à meta física estabelecida, reforçando o que já foi esclarecido em relatórios anteriores, apresentamos as seguintes ponderações:

- A meta da *Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana* é ter 01 Sistema de Governança Implantado na Região Metropolitana de Belém – RMB. A Lei Complementar nº 76/2011 estabelece a composição da RMB com municípios que fazem parte da Região de Integração Guajará (Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba e

Santa Bárbara do Pará) e da Região de Integração Guamá (Castanhal e Santa Izabel do Pará);

- A obtenção do produto/meta desta ação tem como prazo limite o período de vigência do PPA 2020/2023, ou seja, até o final do ano de 2023.

No que diz respeito ao desempenho financeiro, embora tenha havido execução financeira na Região Guajará, conforme informado no sistema SigPlan, a mesma não está relacionada ao desenvolvimento da ação.

Frente ao exposto, a Sedop espera fundamentar o motivo do baixo desempenho físico e financeiro da *Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana* na Região Guajará, o que confere o status de *Abaixo do Esperado*.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO GUAMÁ					
MUNICÍPIOS PLANEJADOS: CASTANHAL, SANTA IZABEL.					
PRODUTO	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2022	MUNICÍPIOS QUE FAZEM PARTE DA RMB

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Por se tratar de uma ação que envolve diferentes esferas de governo, diversos agentes econômicos, atores sociais e atores políticos, seu desenvolvimento não está completamente sob a governabilidade da Sedop, a implementação desta ação na Região Guajará não teve o desenvolvimento de acordo com o programado para o ano de 2022.

Esperava-se que, em 2022, houvesse continuidade na atividade de Repactuação do Acordo de Cooperação Técnica entre Estado e Municípios, com a realização de reuniões estratégicas, jurídicas e técnicas entre a Sedop e as Prefeituras Municipais da Região Metropolitana de Belém. Estas reuniões têm como objetivo elaborar conjuntamente o instrumento de repactuação da responsabilidade dos entes federativos quanto à elaboração do Projeto de Lei que regulamenta a Região Metropolitana, em atendimento ao que preconiza o Estatuto da MetrÓpole e a Lei de criação da Sedop, culminando na assinatura do acordo entre as partes envolvidas.

No entanto, atividades interrompidas, tais como estudos e pesquisas para elaboração do Termo de Referência para a contratação de consultoria voltada para o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI), continuaram paralisadas no decorrer do ano de 2022.

Acrescenta-se às situações acima relatadas, o fato de que, para a *Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana* se concretizar, tendo o Sistema Implantado na Região Guajará, a resolutividade de condicionantes políticas é fundamental para a continuidade do processo.

Quanto à meta física estabelecida, reforçando o que já foi esclarecido em relatórios anteriores, apresentamos as seguintes ponderações:

- A meta da *Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana* é ter 01 Sistema de Governança Implantado na Região Metropolitana de Belém – RMB. A Lei Complementar nº 76/2011 estabelece a composição da RMB com municípios que fazem parte da Região de Integração Guajará (Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba e

Santa Bárbara do Pará) e da Região de Integração Guamá (Castanhal e Santa Izabel do Pará);

- A obtenção do produto/meta desta ação tem como prazo limite o período de vigência do PPA 2020/2023, ou seja, até o final do ano de 2023.

No que diz respeito à execução financeira, embora a *Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana* tenha recebido aporte orçamentário para o ano de 2022, como não houve o desenvolvimento esperado no exercício de 2022, conseqüentemente, não houve dispêndios financeiros.

Frente ao exposto, a Sedop espera fundamentar o motivo do baixo desempenho físico e financeiro da *Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana* na Região Guamá, o que confere o status de *Abaixo do Esperado*.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO LAGO DE TUCURUÍ

MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS: ITUPIRANGA, NOVA IPIXUNA.

PRODUTO	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2022	MUNICÍPIOS QUE FAZEM PARTE DA RMM.
---------	--------------------	---------	----	-----------	------------------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Por se tratar de uma ação que envolve diferentes esferas de governo, diversos agentes econômicos, atores sociais e atores políticos, seu desenvolvimento não está completamente sob a governabilidade da Sedop, a implementação desta ação na Região Carajás não teve o desenvolvimento de acordo com o programado para o ano de 2022.

Esperava-se que, em 2022, houvesse continuidade na atividade de levantamento das Funções Públicas e Interesse Comum no município de Marabá e demais municípios. Este levantamento tem como objetivo verificar se o município Polo de Marabá e demais municípios adjacentes podem caracterizar a existência de uma Região Metropolitana e assim, subsidiar o pleito de criação da Região Metropolitana de Marabá. No entanto, o levantamento permaneceu paralisado no decorrer do ano de 2022.

Acrescenta-se ao cenário acima relatado, o fato de que, para a *Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana* se concretizar, tendo o Sistema Implantado na Região Carajás, a resolutividade de condicionantes políticas é fundamental para a continuidade do processo.

Quanto à meta física estabelecida, reforçando o que já foi esclarecido em relatórios anteriores, apresentamos as seguintes ponderações:

- A meta da *Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana* é ter 01 Sistema de Governança Implantado na Região Metropolitana de Marabá – RMM, caso a referida RMM seja instituída. O Projeto de lei nº 167/2012 estabelece a composição da RMM com municípios que fazem parte da Região de Integração Carajás (Bom Jesus do Tocantins, Marabá e São Domingos do Araguaia) e da Região de Integração Lago de Tucuruí (Itupiranga e Nova Ipixuna);
- A obtenção do produto/meta desta ação tem como prazo limite o período de vigência do PPA 2020/2023, ou seja, até o final do ano de 2023.

No que diz respeito à execução financeira, embora a *Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana* tenha recebido aporte orçamentário para o ano de 2022, como

não houve o desenvolvimento esperado no exercício de 2022, conseqüentemente, não houve dispêndios financeiros.

Frente ao exposto, a Sedop espera fundamentar o motivo do baixo desempenho físico e financeiro da *Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana na Região Lago de Tucuruí*, o que confere o status de *Abaixo do Esperado*.

2.3.1.8. APOIO ÀS AÇÕES DO CONCIDADES

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO GUAJARÁ					
MUNICÍPIO CONTEMPLADO: BELÉM					
PRODUTO	CONSELHO APOIADO	UNIDADE	UN	META 2022	1 CONSELHO APOIADO
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022					
<p>No ano de 2022, o desenvolvimento da <i>Ação 8463. Apoio às Ações do Concidades</i>, foi marcado pelo retorno das atividades presenciais, até então suspensas por conta do cumprimento decreto estadual estabelecido no momento crítico da pandemia da Covid-19.</p> <p>Sendo assim, debates de grande relevância proporcionados pelo de desenvolvimento desta ação governamental, como por exemplo, elaboração das Políticas Públicas de Desenvolvimento Urbano, em especial as Políticas Estaduais de Habitação, Saneamento Ambiental, Transporte e Mobilidade Urbana e Planejamento Territorial, no decorrer do ano de 2022, puderam ser retomados através de reuniões presenciais.</p> <p>Este retorno foi extremamente propício, também, devido à proximidade da Sétima Conferência Estadual das Cidades, uma vez que o período que a antecede é marcado pela realização das Conferências Municipais, nas quais, dentre as pautas a serem discutidas, está a escolha dos delegados que deverão participar dos debates e deliberações da Conferência Estadual.</p> <p>No ano de 2022 foram realizadas: uma Reunião Extraordinária do Pleno deste CONCIDADES/PA, no dia 15/02/2022 – em modalidade virtual, bem como a 20ª Reunião Ordinária do Pleno do CONCIDADES/PA, nos dias 26 à 28/04/2022, e, ainda, a realização da 21ª Reunião Ordinária do CONCIDADES/PA nos dias 12 à 14/07/2022, ambos no Auditório da Imprensa Oficial do Estado - IOEPA. Todas estas atividades contam com a participação de conselheiros municipais e estaduais, representantes das 12 Regiões de Integração do Estado, nas quais foram discutidos, principalmente, as pautas e os encaminhamentos para a realização da Sétima Conferência Estadual das Cidades.</p> <p>Para melhor entendimento, a tabela abaixo consolida as principais atividades realizadas durante o ano de 2022 para o desenvolvimento da <i>Ação 8463. Apoio às Ações do Concidades</i>:</p>					

APOIO ÀS AÇÕES DO CONCIDADES - 2022		
ITEM	ATIVIDADES	DATA
COMISSÃO ORGANIZADORA DA SÉTIMA CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES	# REUNIÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES, EM MODALIDADE VIRTUAL.	01/02/2022
	# REUNIÃO (EM MODALIDADE HÍBRIDA) DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES.	19/05/2022
	# REUNIÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES, NA QUAL FOI DEFINIDA A COMISSÃO OPERATIVA DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES. LOCAL: AUDITÓRIO DA SEDOP.	03/08/2022
	# REUNIÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES, EM MODALIDADE HÍBRIDA, COM A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CONCIDADES, O SENHOR RUY CABRAL, E REPRESENTANTES MUNICIPAIS. LOCAL: AUDITÓRIO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IOE.	25/08/2022
	# REUNIÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES.	10/11/2022
COMISSÃO OPERATIVA DA SÉTIMA CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES	# REUNIÃO DA COMISSÃO OPERATIVA DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES, COM O PRESIDENTE DO CONCIDADES, O SENHOR RUY CABRAL. LOCAL: SALA DE REUNIÕES DO GABINETE DA SEDOP.	30/08/2022
	# REUNIÃO DA COMISSÃO OPERATIVA DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES. LOCAL: AUDITÓRIO DA SEDOP.	30/08/2022
	# REUNIÃO COM AS PREFEITURAS MUNICIPAIS DE ANANINDEUA, MARITUBA, BENEVIDES, SANTA BÁRBARA E SANTA IZABEL E COMISSÃO OPERATIVA DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES, PARA REALIZAR A MOBILIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, BEM COMO DEMAIS ENCAMINHAMENTOS REFERENTES AO CONSELHO MUNICIPAL DAS CIDADES.	02/09/2022
REUNIÃO DA SUBCOMISSÃO DE MOBILIZAÇÃO DA SÉTIMA CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES	# REUNIÃO DA SUBCOMISSÃO DE MOBILIZAÇÃO DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL.	08/02/2022
	# REUNIÃO DA SUBCOMISSÃO DE MOBILIZAÇÃO DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL.	10/02/2022
	# REUNIÃO DA SUBCOMISSÃO DE MOBILIZAÇÃO DA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES.	13/05/2022
	# REUNIÃO DA SUBCOMISSÃO DE MOBILIZAÇÃO DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES. PAUTA: MOBILIZAÇÃO INFORMATIVA E ORGANIZATIVA, CONSTRUÇÃO DE MAPA PARA A MOBILIZAÇÃO DOS 144 MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, PROPOSTA DE CALENDÁRIO PARA A DIVULGAÇÃO E MOBILIZAÇÃO. LOCAL: SALA DO CONCIDADES/PA.	30/05/2022

APOIO ÀS AÇÕES DO CONCIDAES - 2022		
ITEM	ATIVIDADES	DATA
REUNIÃO DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA DO CONCIDAES/PA	# REUNIÃO DA EXECUTIVA DO CONCIDAES/PA, COM OBJETIVO DE DEFINIR NOVAS DATAS E DEVIDOS ENCAMINHAMENTOS ÀS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS E 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL. LOCAL: SEDOP.	25/02/2022
	# REUNIÃO DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA DO CONCIDAES/PA PARA DEFINIÇÃO DE COMPOSIÇÃO DAS MESAS, PAUTA, RESOLUÇÕES, ALTERAÇÃO DE DATAS DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS E ESTADUAL, BEM COMO LOCAL DE REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS. LOCAL: AUDITÓRIO DA SEDOP.	19/04/2022
	# REUNIÃO DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA DO CONCIDAES/PA. PAUTA: ALTERAÇÃO DA DATA DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES, MINUTA DO NOVO DECRETO ESTADUAL, ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES; AGENDAMENTO DE REUNIÃO COM A COMISSÃO ORGANIZADORA DA 7ª CEC. LOCAL: SALA DO CONCIDAES/PA.	10/05/2022
	# REUNIÃO DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA DO CONCIDAES/PA PARA REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO E APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE SEMINÁRIO PELO CONSELHEIRO SEBASTIÃO. LOCAL: AUDITÓRIO DA SEDOP. REMARCADA PARA 07/09/2022.	25/05/2022
	# REUNIÃO DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA DO CONCIDAES/PA. PAUTA: INFORMES QUANTO AO NOVO DECRETO DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES; APRESENTAÇÃO DAS ALTERAÇÕES FEITAS NO REGIMENTO INTERNO.	08/06/2022
	# REUNIÃO DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA DO CONCIDAES/PA. PAUTA: 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES. LOCAL: AUDITÓRIO DA SEDOP.	28/06/2022
	# REUNIÃO DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA DO CONCIDAES/PA COM REPRESENTANTES DA COSANPA, SETRAN, COHAB E SEDOP, COM OBJETIVO DE ALINHAR ASSUNTOS REFERENTES À SÉTIMA CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES, E DAS CÂMARAS TÉCNICAS SETORIAIS.	06/07/2022
REUNIÃO DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA DO CONCIDAES/PA	# REUNIÃO DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA DO CONCIDAES COM REPRESENTANTE DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO - COHAB, O SENHOR RAIMUNDO NONATO. ASSUNTO: CONSELHO GESTOR DO FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO (FEHIS). LOCAL: AUDITÓRIO DA SEDOP.	23/08/2022
	# REUNIÃO COM COORDENAÇÃO EXECUTIVA DO CONCIDAES - ASSUNTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO - LOCAL: AUDITÓRIO DA SEDOP.	21/10/2022
	# REUNIÃO COM COORDENAÇÃO EXECUTIVA DO CONCIDAES - ASSUNTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO - LOCAL: AUDITÓRIO DA SEDOP.	07/11/2022
REUNIÕES DO PLENO DO CONCIDAES/PA	# REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENO DO CONCIDAES/PA, EM MODALIDADE VIRTUAL	15/02/2022
	# 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO DO CONCIDAES/PA.	26 À 28/04/2022
	# REALIZAÇÃO DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONCIDAES/PA. LOCAL: AUDITÓRIO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IOEPA.	12 À 14/07/2022

APOIO ÀS AÇÕES DO CONCIDADES - 2022		
ITEM	ATIVIDADES	DATA
REUNIÕES COM PREFEITURAS MUNICIPAIS	# REUNIÃO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA PARA ORGANIZAÇÃO DA 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, BEM COMO DEMAIS ENCAMINHAMENTOS REFERENTES À RESTITUIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS CIDADES	06/04/2022
	# REUNIÃO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES PARA ORGANIZAÇÃO DA 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES.	12/04/2022
	# REUNIÃO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU, COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES.	11/05/2022
	# REUNIÃO COM PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU, O SENHOR JOÃO CLEBER, PARA ALINHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES.	31/05/2022
	# REUNIÃO COM A PREFEITA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS, A SENHORA KELLY DESTRO E TODO O EXECUTIVO MUNICIPAL PARA TRATATIVAS DA ORGANIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, BEM COMO DEMAIS ENCAMINHAMENTOS REFERENTES À RESTITUIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS CIDADES.	22/06/2022
	# REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BENEVIDES PARA TRATATIVAS DA ORGANIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES.	08/11/2022
	CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	# REALIZAÇÃO DE DA 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES DE SALVATERRA.
# REALIZAÇÃO DA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES DE SANTARÉM.		21/07/2022
# REALIZAÇÃO DA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES DE JURUTI.		19/08/2022
# REALIZAÇÃO DE DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES DE TRAIRÃO.		13/09/2022
# REALIZAÇÃO DE DA 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES DE ULIANÓPOLIS.		17 E 18/10/2022
# REALIZAÇÃO DE DA 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES DE ACARÁ.		19 E 20/10/2022
# REALIZAÇÃO DE DA 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA.		10/11/2022
# REALIZAÇÃO DE DA 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES DE ABEL FIGUEIREDO.		17/11/2022
# REALIZAÇÃO DE DA 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES DE INHANGAPI.		18/11/2022
# REALIZAÇÃO DE DA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES DE MUANÁ.		17 E 18/11/2022
# REALIZAÇÃO DE DA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES DE MARABÁ.		17 E 18/11/2022
REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS SETORIAIS		# REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA SETORIAL DE HABITAÇÃO. LOCAL: SALA DO CONCIDADES/PA.
	# REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA SETORIAL DE SANEAMENTO. LOCAL: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA.	04/07/2022
	# REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA SETORIAL DE HABITAÇÃO. LOCAL: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARÁ (COHAB).	05/07/2022
REUNIÕES DO CONSELHO DO FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FEHIS	# REUNIÃO COM ASSESSORIA DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARÁ (COHAB) PARA TRATAR SOBRE O CONSELHO GESTOR DO FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL (FEHIS).	30/09/2022

No que diz respeito ao desempenho financeiro, do orçamento programado para atender a *Ação 8463. Apoio às Ações do Concidades* no valor de R\$ 1.550.000,00¹, foram utilizados cerca de 5% que corresponde a R\$ 80.722,92² para o pagamento de atividades de apoio técnico (diárias). Vale ressaltar que o valor programado para 2022, tinha como referência a realização da Conferência Estadual, a qual foi transferida para o ano de 2023.

Por fim, considerando o cenário apresentado, o esforço dos técnicos envolvidos na execução desta ação, possibilitou que a meta estabelecida de 1 Conselho Apoiado fosse alcançada, garantindo desta forma, para a *Ação 8463. Apoio às Ações do Concidades* o status de *Conforme Programado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO - DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO - DEZEMBRO/2022.

2.3.1.9. APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO ARAGUAIA					
MUNICÍPIO PLANEJADO: REDENÇÃO.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2022	1 INSTRUMENTO ELABORADO
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022					
<p>Para o ano de 2022, foi programado o atendimento do município de Redenção no desenvolvimento da <i>Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico</i> na Região Araguaia.</p> <p>Acontece que, no decorrer do ano de 2022, não houve continuidade da demanda de saneamento referente ao município de Redenção. A Prefeitura Municipal de Redenção não renovou o Termo de Cooperação Técnica Nº 27/2019 celebrado com a Sedop, alegando que irá contratar uma empresa de consultoria especializada para elaborar o Plano Municipal de Saneamento do município de Redenção.</p> <p>Esta situação ratifica o quanto o comprometimento do município no desenvolvimento desta ação governamental é fundamental para que a Sedop possa atingir a meta física acordada para a Região Araguaia. Os municípios planejados exercem grande influência para que a ação em questão tenha o desempenho <i>Conforme Programado</i>.</p> <p>Entretanto, embora o município planejado não tenha demonstrado interesse na continuidade do processo com a Sedop, a mesma pôde ampliar seu raio de atuação na Região através do atendimento de demanda espontânea relacionada ao município de Floresta do Araguaia, estando o processo em fase inicial de elaboração.</p> <p>No que diz respeito à execução financeira, do aporte orçamentário de R\$ 34.700,00¹ programado para o exercício de 2022, houve movimentação de cerca de R\$ 3.204,63² relacionada a despesas com diárias dos técnicos da Sedop para prestar apoio técnico ao município de Floresta do Araguaia.</p> <p>Finalizando, tendo em consideração o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da <i>Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico</i> na Região Araguaia, no decorrer do ano de 2022, equivale ao status de <i>Abaixo do Esperado</i>.</p>					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO BAIXO AMAZONAS

MUNICÍPIOS PLANEJADOS: CURUÁ, JURUTI, MONTE ALEGRE, ÓBIDOS, PRAINHA, SANTARÉM.

PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2022	12 INSTRUMENTOS ELABORADOS
----------------	------------------------------	----------------	-----------	------------------	-----------------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Para o desenvolvimento da *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* na região Baixo Amazonas durante o ano de 2022, planejou-se o atendimento dos municípios de Curuá, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Prainha e Santarém com a elaboração de dois instrumentos urbanos em cada município.

No entanto, no que diz respeito aos municípios de Curuá e Juruti, não houve continuidade da demanda de saneamento referente aos municípios. Os mesmos não renovaram os Termos de Cooperação Técnica celebrados com a Sedop, sendo que o município de Juruti informa que irá contratar uma empresa de consultoria especializada para elaborar o Plano Municipal de Saneamento. Quanto aos municípios de Óbidos e Santarém não houve demanda de saneamento no decorrer do ano de 2022.

Esta situação ratifica o quanto o comprometimento do município no desenvolvimento desta ação governamental é fundamental para que a Sedop possa atingir a meta física acordada para a Região Baixo Amazonas. Os municípios planejados exercem grande influência para que a ação em questão tenha o desempenho esperado.

Nos municípios de Monte Alegre e Prainha, no ano de 2022 houve continuidade das atividades iniciadas em 2021. A tabela abaixo consolida as principais atividades desenvolvidas:

Nº	MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
1	MONTE ALEGRE	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	- ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DURANTE AS FASES DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO; - ANÁLISE DAS PEÇAS TÉCNICAS.	70% DAS ETAPAS DO PLANO REALIZADAS.
2	PRAINHA	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	- ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DURANTE AS FASES DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO; - ANÁLISE DAS PEÇAS TÉCNICAS.	30% DAS ETAPAS DO PLANO REALIZADAS.

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

Com relação à execução financeira, da dotação inicial de R\$ 208.700,00¹ para atender a Região Baixo Amazonas, houve movimentação financeira no valor de R\$ 7.209,26² referente ao pagamento de diárias aos técnicos responsáveis pelo desenvolvimento da ação.

Por fim, tendo em consideração o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* na Região Baixo Amazonas no decorrer do ano de 2022 equivale ao status de *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO CARAJÁS

MUNICÍPIO DE DEMANDA ESPONTÂNEA: ELDORADO DOS CARAJÁS.

PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2022	NÃO HOUVE PREVISÃO DE META.
---------	-----------------------	---------	----	-----------	-----------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

O atendimento ao município de Eldorado dos Carajás através da *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico*, não foi programado nos instrumentos de planejamento da Sedop. Entretanto, foi firmado Termo de Cooperação Técnica nº 27/2021, cujo objeto é “Concepção do Plano de Saneamento Básico Municipal”.

A tabela abaixo consolida as principais atividades desenvolvidas no município durante o ano de 2022.

Nº	MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
1	ELDORADO DOS CARAJÁS (Demanda Espontânea)	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	- ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DURANTE AS FASES DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO; - ANÁLISE DAS PEÇAS TÉCNICAS.	70% DAS ETAPAS DO PLANO REALIZADAS.

Quanto ao desempenho físico e financeiro da *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* na Região Carajás, como se trata de uma demanda espontânea, surgida em momento posterior à elaboração dos instrumentos de planejamento da Sedop, não foram estabelecidas metas físicas e nem financeiras para o ano de 2022.

Entretanto, com a celebração do Termo de Cooperação Técnica, houve movimentação financeira no valor de R\$ 4.984,98² referente ao pagamento de diárias aos técnicos responsáveis pelo desenvolvimento da ação.

A Sedop ressalta que o comprometimento do município no desenvolvimento desta ação governamental é fundamental para que a meta física acordada para a Região possa ser alcançada.

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

Neste sentido, tendo em consideração o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico na Região Carajás* no decorrer do ano de 2022 equivale ao status de *Abaixo do Esperado*.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO GUAJARÁ

MUNICÍPIO PLANEJADO: BENEVIDES

PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2022	2 INSTRUMENTOS ELABORADOS
----------------	------------------------------	----------------	-----------	------------------	----------------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Na Região Guajará, o município programado para ser atendido através da *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* no decorrer do ano de 2022 foi Benevides. No entanto, a Sedop também atendeu o município de Belém, por meio de demanda espontânea, através da celebração de dois convênios.

Para melhor entendimento, a tabela a seguir consolida os principais avanços obtidos na Região Guajará por meio do desenvolvimento desta ação governamental, tanto no município programado, quanto no município atendido por demanda espontânea:

Nº	MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
1	BENEVIDES	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	- VISITA TÉCNICA PARA APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO; - ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS.	30% DAS ETAPAS DO PLANO REALIZADAS.
2	BELÉM (Demanda Espontânea)	RESÍDUOS SÓLIDOS (PERS/PA)	- INÍCIO DAS ATIVIDADES DE REVISÃO DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO ESTADO DO PARÁ.	15% FASE INICIAL DE ELABORAÇÃO
	BELÉM (Demanda Espontânea)	PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO (PESB/PA)	- APRESENTAÇÃO DE METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO; - ACOMPANHAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS.	15% FASE INICIAL DE ELABORAÇÃO

Com relação à execução financeira, a dotação inicial para atender a *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* para a Região Guajará no exercício de 2022, inicialmente no valor de R\$ 28.700,00², precisou ser atualizada para quase Um Milhão de Reais, cerca de R\$ 966.878,75, representando uma diferença de R\$ 938.178,75 em relação ao programado. Parte desta majoração justifica-se pelo atendimento do Convênio Nº 47/2022 (PEGIRS - Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos) e do Convênio Nº 48/2022 (PLANSAB - Plano Estadual de Saneamento) celebrados com a Fadesp (Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa), para os quais foi pago o valor de R\$ 665.900,00³ em 2022. Houve, ainda, uma execução orçamentária no valor de R\$ 297.589,42⁴, referente ao Contrato

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

³ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

⁴ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

86/2021, que se refere à Elaboração de Projeto para Reestruturação do Saneamento Básico do Município de Salvaterra e de algumas ilhas do Município de Belém (Combu, Murutucu e Ilha Grande), representando divergência entre *Orçamento Programado X Orçamento Executado*.

A Sedop ressalta que o compromisso dos municípios beneficiados no desenvolvimento desta ação governamental é fundamental para que a meta física acordada para a Região possa ser alcançada.

Neste sentido, com base no que foi exposto, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* na Região Guajará Amazonas no decorrer do ano de 2022 equivale ao status de *Abaixo do Esperado*.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO GUAMÁ

MUNICÍPIOS PLANEJADOS: CASTANHAL, INHANGAPI, MARAPANIM, SANTA IZABEL DO PARÁ, SANTA MARIA DO PARÁ, SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ, SÃO CAETANO DE ODIVELAS, SÃO DOMINGOS DO CAPIM, SÃO FRANCISCO DO PARÁ, SÃO MIGUEL DO GUAMÁ E VIGIA

PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2022	20 INSTRUMENTOS ELABORADOS
----------------	-----------------------	----------------	----	------------------	----------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

A programação para atendimento da Região Guamá no ano de 2022 por meio da *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico*, contemplou dez dos dezoito municípios que integram a região, conforme descrito acima.

No entanto, no que diz respeito aos municípios de São Miguel do Guamá e São Domingos do Capim, não houve continuidade da demanda de saneamento referente aos municípios. Os mesmos não renovaram os Termos de Cooperação Técnica celebrados com a Sedop, sendo que o município de São Domingos do Capim não cumpriu as atividades do cronograma. Foi notificado, porém não se manifestou, tendo seu Termo de Cooperação Técnica cancelado. Quanto aos municípios de Marapanim e São Caetano de Odivelas não houve demanda de saneamento no decorrer do ano de 2022.

Esta situação ratifica o quanto o comprometimento do município no desenvolvimento desta ação governamental é fundamental para que a Sedop possa atingir a meta física acordada para a Região Guamá. Os municípios planejados exercem grande influência para que a ação em questão tenha o desempenho *Conforme Programado*.

Quanto aos demais municípios, a tabela abaixo sintetiza as principais atividades desenvolvidas no ano de 2022, tanto nos municípios programados, quanto nos municípios atendidos através de demanda espontânea:

Nº	MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
1	CASTANHAL, INHANGAPI, SANTA MARIA DO PARÁ, SANTA IZABEL DO PARÁ, SÃO FRANCISCO DO PARÁ	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (Vinculado ao CAF ²)	- ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E/OU REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ACORDO COM CONTRATO ESTABELECIDO ENTRE A SEDOP E A EMPRESA A ESPECIALIZADA (CT 55/2021).	70% DAS ATIVIDADES REALIZADAS
2	MAGALHÃES BARATA (Demanda Espontânea)	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	- APRESENTAÇÃO DE METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO; - ACOMPANHAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS.	15% FASE INICIAL DE ELABORAÇÃO

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² CONFEDERAÇÃO ANDINA DE FOMENTO.

No que diz respeito à execução financeira, do orçamento programado de R\$ 277.900,00 para o desenvolvimento da *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico*, houve movimentação financeira no valor de R\$ 1.938,61¹ referente ao pagamento de diárias aos técnicos responsáveis pelo desenvolvimento da ação em um número de municípios bem aquém do planejado.

Finalizando, fundamentado no que foi apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* na Região Guamá no decorrer do ano de 2022, apresenta o status *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO MARAJÓ

MUNICÍPIO DE DEMANDA ESPONTÂNEA: PONTA DE PEDRAS

PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2022	NÃO HOUE PREVISÃO DE META.
---------	--------------------------	---------	----	--------------	-------------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

O atendimento ao município de Ponta de Pedras através da *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico*, não foi programado nos instrumentos de planejamento da Sedop para o ano de 2022. Entretanto, no decorrer do ano houve avanço nas atividades voltadas para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, conforme apresentado na tabela abaixo:

Nº	MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
1	PONTA DE PEDRAS (Demanda Espontânea)	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	- ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DURANTE AS FASES DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO; - ANÁLISE DAS PEÇAS TÉCNICAS.	30% DAS ETAPAS DO PLANO REALIZADAS.

Quanto ao desempenho físico e financeiro da *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* na Região Marajó, como se trata de uma demanda espontânea, surgida em momento posterior à elaboração dos instrumentos de planejamento da Sedop, não foram estabelecidas metas físicas e nem financeiras para o ano de 2022.

Entretanto, com a celebração do Termo de Cooperação Técnica, houve movimentação financeira no valor de R\$ 1.186,90² referente ao pagamento de diárias aos técnicos responsáveis pelo desenvolvimento da ação.

A Sedop ressalta que o comprometimento do município no desenvolvimento desta ação governamental é fundamental para que a meta física acordada para a Região possa ser alcançada.

Por último, tendo em consideração o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* na Região Marajó no exercício de 2022 equivale ao status de *Abaixo do Esperado*.

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO RIO CAETÉ					
MUNICÍPIO DE DEMANDA ESPONTÂNEA: AUGUSTO CORRÊA E QUATIPURU.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2022	NÃO HOUE PREVISÃO DE META.

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Os municípios de Augusto Corrêa e Quatipuru não estavam programados na *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* para o ano de 2022. No entanto, no decorrer do ano, houve avanço na elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, conforme a tabela abaixo:

Nº	MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
1	AUGUSTO CORRÊA (Demanda Espontânea)	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	- ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DURANTE AS FASES DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO.	50% DAS ETAPAS DO PLANO REALIZADAS.
2	QUATIPURU (Demanda Espontânea)	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	- PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO CONCLUÍDO.	100% DOS PRODUTOS REALIZADOS

Quanto ao desempenho físico e financeiro da *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* na Região Rio Caeté, não foram estabelecidas metas físicas e nem financeiras para o ano de 2022. Entretanto, com a celebração dos Termos de Cooperação Técnica, houve movimentação financeira no valor de R\$ 3.560,70² referente ao pagamento de diárias aos técnicos responsáveis pelo desenvolvimento da ação.

A Sedop ressalta que o comprometimento do município no desenvolvimento desta ação governamental é fundamental para que a meta física acordada para a Região possa ser alcançada.

Por último, tendo em consideração o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* na Região Rio Caeté no exercício de 2022 equivale ao status de *Abaixo do Esperado*.

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO RIO CAPIM					
MUNICÍPIO DE DEMANDA ESPONTÂNEA: RONDON DO PARÁ, TOMÉ-AÇU.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2022	NÃO HOUVE PREVISÃO DE META.

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Os municípios de Rondon do Pará e Tomé-Açu não foram programados na *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* para o ano de 2022. Entretanto, houve avanço nas atividades voltadas para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, conforme a tabela abaixo:

Nº	MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
1	RONDON DO PARÁ (Demanda Espontânea)	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (Vinculado ao CAF ²)	- ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E/OU REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ACORDO COM CONTRATO ESTABELECIDO ENTRE A SEDOP E A EMPRESA A ESPECIALIZADA (CT 55/2021).	70% DAS ATIVIDADES REALIZADAS.
2	TOMÉ-AÇU (Demanda Espontânea)	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	- ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DURANTE AS FASES DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO.	10% DAS ETAPAS DO PLANO REALIZADAS.

Quanto ao desempenho físico e financeiro da *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* na Região Rio Capim, como se trata de uma demanda espontânea, surgida em momento posterior à elaboração dos instrumentos de planejamento da Sedop, não foram estabelecidas metas físicas e nem financeiras para o ano de 2022.

Entretanto, houve movimentação financeira no valor de R\$ 19.491,64³. Deste valor R\$ 17.711,29 refere-se à devolução de saldo de convênio do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Ulianópolis e o valor restante é referente ao pagamento de diárias aos técnicos responsáveis pelo desenvolvimento da ação.

A Sedop ressalta que o comprometimento do município no desenvolvimento desta ação governamental é fundamental para que a meta física acordada para a Região possa ser alcançada.

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² CONFEDERAÇÃO ANDINA DE FOMENTO.

³ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

Neste sentido, levando em consideração o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* na Região Rio Capim no exercício de 2022 equivale ao status de *Abaixo do Esperado*.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO TOCANTINS

MUNICÍPIO DE DEMANDA ESPONTÂNEA: ABAETETUBA, CAMETÁ E MOJU.

PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2022	NÃO HOUVE PREVISÃO DE META.
---------	-----------------------	---------	----	-----------	-----------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Na Região Tocantins, o município programado para ser atendido através da *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* no decorrer do ano de 2022 foi Cametá. No entanto, a Sedop também atendeu os municípios de Abaetetuba e Moju por meio de demanda espontânea.

Para melhor entendimento, a tabela a seguir consolida os principais avanços obtidos na Região Tocantins por meio do desenvolvimento desta ação governamental, tanto no município programado quanto nos municípios atendidos por demanda espontânea:

Nº	MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
1	ABAETETUBA (Demanda Espontânea)	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	- ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DURANTE AS FASES DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO.	10% DAS ETAPAS DO PLANO REALIZADAS.
2	CAMETÁ	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	- APRESENTAÇÃO DE METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO.	50% DAS ETAPAS DO PLANO REALIZADAS.
3	MOJU (Demanda Espontânea)	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	- ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DURANTE AS FASES DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO.	10% DAS ETAPAS DO PLANO REALIZADAS.

No que diz respeito à execução financeira, do orçamento programado de R\$ 100.000,00² para o desenvolvimento da *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico*, houve movimentação financeira no valor de R\$ 5.626,05³ referente ao pagamento de diárias aos técnicos responsáveis pelo desenvolvimento da ação.

A Sedop ressalta que o comprometimento do município no desenvolvimento desta ação governamental é fundamental para que a meta física acordada para a Região possa ser alcançada.

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

³ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

Neste sentido, levando em consideração o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* na Região Tocantins no exercício de 2022 equivale ao status de *Abaixo do Esperado*.

2.3.1.10. APOIO TÉCNICO-INSTITUCIONAL NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO ARAGUAIA					
MUNICÍPIOS PLANEJADOS: REDENÇÃO, SÃO FELIX DO XINGU.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2022	2 INSTRUMENTOS ELABORADOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Em 2022, a Sedop teve como foco de atuação, ampliar o atendimento técnico aos municípios da Região Araguaia no que se refere à elaboração e implementação de instrumentos urbanos. Sendo assim, foi programado o atendimento dos municípios de Redenção e São Félix do Xingu através do desenvolvimento da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano*.

Acontece que, no decorrer do ano de 2022, não houve demanda relacionada a instrumentos de Desenvolvimento Urbano para o município de Redenção. Esta situação ratifica o quanto o comprometimento do município no desenvolvimento desta ação governamental é fundamental para que a Sedop possa atingir a meta física acordada para a Região Araguaia. Os municípios planejados exercem grande influência para que a ação em questão tenha um bom desempenho.

Em contrapartida, a Sedop pôde atender ao município de Floresta do Araguaia através de demanda espontânea. Além disso, prestou apoio técnico ao município planejado, São Félix do Xingu, no desenvolvimento de dois instrumentos públicos: Revisão do Plano Diretor Municipal e Regularização Fundiária. Na atividade de Revisão do Plano Diretor Municipal, o instrumento foi elaborado com a minuta da lei de revisão sendo encaminhada para votação na Câmara de Vereadores Municipal. No que tange à Regularização Fundiária, as atividades tiveram que aguardar o período eleitoral terminar para avançar com relação às ações nas comunidades.

Para melhor entendimento do desempenho da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* na Região Araguaia, a tabela abaixo sintetiza as principais atividades desenvolvidas e produtos obtidos, tanto no município planejado, quanto no município atendido por demanda espontânea:

Nº	MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
1	SÃO FÉLIX DO XINGU	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	- REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL PARTICIPATIVO EM FASE DE FINALIZAÇÃO	100% DOS PRODUTOS REALIZADOS
	SÃO FÉLIX DO XINGU	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	- FIRMADO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 11/2021 ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E SEDOP - ATIVIDADES SENDO EXECUTADAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	40% DOS PRODUTOS REALIZADOS
3	FLORESTA DO ARAGUAIA (Demanda Espontânea)	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	- FIRMADO O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2022, ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E SEDOP	40% DOS PRODUTOS REALIZADOS

No que diz respeito à execução da meta física, a realização de todos os produtos relacionados a Revisão do Plano Diretor Municipal no município de São Félix do Xingu, confere o produto alcançado de *Um Instrumento Elaborado* para a Região Araguaia no ano de 2022, o que corresponde ao atingimento de 50% da meta estabelecida para a região no exercício de 2022.

Com relação à execução financeira, da dotação inicial de R\$ 28.359,00² para atender a Região Araguaia durante o ano de 2022, houve movimentação financeira no valor de R\$ 5.341,05³ referente ao pagamento de diárias aos técnicos responsáveis pelo desenvolvimento da ação.

Por último, tendo em vista o alcance de 50% da meta física estabelecida, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* na Região Araguaia, encerra o exercício de 2022 com o status *Merece Atenção*.

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

³ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO BAIXO AMAZONAS

MUNICÍPIOS PLANEJADOS: ALENQUER, ALMEIRIM, BELTERRA, CURUÁ, JURUTI, MOJUÍ DOS CAMPOS, MONTE ALEGRE, ÓBIDOS, ORIXIMINÁ, SANTARÉM, TERRA SANTA

PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2022	11 INSTRUMENTOS ELABORADOS
---------	-----------------------	---------	----	-----------	----------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Em 2022, a Sedop teve como foco de atuação, ampliar o atendimento técnico aos municípios da Região Baixo Amazonas no que se refere à elaboração e implementação de instrumentos urbanos. Sendo assim, foi programado o atendimento dos municípios de Almeirim, Alenquer, Belterra, Juruti, Monte Alegre, Mojuí dos Campos, Óbidos e Oriximiná através do desenvolvimento da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano.*

No que diz respeito ao município de Santarém, o mesmo é contemplado nesta ação por se tratar de um município polo, funcionando como via de transbordo para as viagens destinadas aos municípios da Região Baixo Amazonas.

Os municípios de Alenquer e Juruti conseguiram finalizar seus Planos de Mobilidade Urbana neste ano de 2022. Almeirim também teve bom avanço com 70% das atividades desenvolvidas. Já os municípios de Oriximiná e Monte Alegre não tiveram avanços expressivos, tendo sido prejudicados em parte por dificuldades com relação a equipe técnica local.

Esta situação ratifica o quanto o comprometimento do município no desenvolvimento desta ação governamental é fundamental para que a Sedop possa atingir a meta física acordada para a Região Baixo Amazonas. Os municípios planejados exercem grande influência para que a ação em questão tenha um bom desempenho.

Para melhor entendimento do desempenho da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* na Região Baixo Amazonas, a tabela abaixo sintetiza as principais atividades desenvolvidas e produtos obtidos nos municípios planejados:

Nº	MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
1	ALENQUER	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- PLANO DE MOBILIDADE URBANA CONCLUÍDO.	100% DOS PRODUTOS REALIZADOS
2	ALMEIRIM	ELABORAÇÃO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	- ORIENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS ETAPAS TÉCNICAS DESTINADAS A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL.	70% DOS PRODUTOS REALIZADOS
	ALMEIRIM	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- ORIENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS ETAPAS TÉCNICAS DESTINADAS A ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO.	30% DOS PRODUTOS REALIZADOS
3	BELTERRA	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO	- REALIZADO O MAPEAMENTO DA ÁREA OBJETO DE TRABALHO.	30% DOS PRODUTOS REALIZADOS
4	JURUTI	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- PLANO DE MOBILIDADE URBANA CONCLUÍDO.	100% DOS PRODUTOS REALIZADOS
5	MOJUÍ DOS CAMPOS	ELABORAÇÃO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	- ATIVIDADES EM FASE INICIAL DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO.	30% DOS PRODUTOS REALIZADOS
6	MONTE ALEGRE	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- ATIVIDADES INICIADAS NO MUNICÍPIO.	10% DOS PRODUTOS REALIZADOS
7	ÓBIDOS	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- FINALIZADA A PRIMEIRA ETAPA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.	40% DOS PRODUTOS REALIZADOS
8	ORIXIMINÁ	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	- ATIVIDADES INICIADAS NO MUNICÍPIO.	30% DOS PRODUTOS REALIZADOS

No que diz respeito à execução da meta física, a realização de todos os produtos relacionados à Elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana nos municípios de Alenquer e Juruti, confere o produto alcançado de *Dois Instrumentos Elaborados* para a Região Baixo Amazonas no ano de 2022, o que corresponde ao atingimento de 18% da meta estabelecida para o exercício de 2022.

Com relação à execução financeira, da dotação inicial de R\$ 159.811,00² para atender a Região Baixo Amazonas durante o ano de 2022, houve movimentação financeira no valor de R\$

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

5.451,64¹ referente ao pagamento de diárias aos técnicos responsáveis pelo desenvolvimento da ação.

Por último, por mais que a Região Baixo Amazonas tenha logrado êxito com dois instrumentos urbanos elaborados, os mesmos não foram suficientes para garantir que o desenvolvimento da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* tivesse um desempenho físico e financeiro em consonância com o planejado. Nestes termos, a Região Baixo Amazonas encerra o exercício de 2022 com o status *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO CARAJÁS

MUNICÍPIOS PLANEJADOS: ELDORADO DOS CARAJÁS, MARABÁ, PARAUAPEBAS.

PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2022	6 INSTRUMENTOS ELABORADOS
---------	-----------------------	---------	----	-----------	---------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Em 2022, a Sedop teve como foco de atuação, ampliar o atendimento técnico aos municípios da Região do Carajás no que se refere à elaboração e implementação de instrumentos urbanos. Sendo assim, foi programado o atendimento dos municípios de Eldorado dos Carajás, Marabá e Parauapebas através do desenvolvimento da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano.*

Acontece que, no decorrer do ano de 2022, não houve demanda relacionada a instrumentos de Desenvolvimento Urbano para o município de Parauapebas. Esta situação ratifica o quanto o comprometimento do município no desenvolvimento desta ação governamental é fundamental para que a Sedop possa atingir a meta física acordada para a Região Carajás. Os municípios planejados exercem grande influência para que a ação em questão tenha um bom desempenho.

Em contrapartida, a Sedop pôde atender ao município de São Domingos do Araguaia através de demanda espontânea voltada para a elaboração de dois instrumentos urbanos. Com relação aos municípios de Marabá e Parauapebas, não existem termos de cooperação técnica assinados com esses municípios. No entanto, em Marabá, a Sedop está atuando na regularização fundiária de 68 Unidades Habitacionais construídas pela Secretaria, através de Convênio com Governo Federal, dentro do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, no bairro Francisco Coelho ou como conhecido Cabelo Seco, no Residencial Itacaiúnas. A REURB do Residencial Itacaiúnas, bem como os títulos das unidades foram registrados no 1º tabelionato de registro de Imóveis de Marabá, com emissão de certidão dos imóveis.

Para melhor entendimento do desempenho da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* na Região Carajás, a tabela abaixo sintetiza as principais atividades desenvolvidas e produtos obtidos, tanto nos municípios planejados, quanto no município atendido por demanda espontânea:

Nº	MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
1	ELDORADO DOS CARAJÁS	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- PLANO DE MOBILIDADE URBANA CONCLUÍDO.	100% DOS PRODUTOS REALIZADOS
2	MARABÁ	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	- REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE 68 UNIDADES HABITACIONAIS, COM EMISSÃO DE CERTIDÕES DE IMÓVEIS.	100% DOS PRODUTOS REALIZADOS
3	SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA (Demanda Espontânea)	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	- PLANO DIRETOR MUNICIPAL CONCLUÍDO.	100% DOS PRODUTOS REALIZADOS
	SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA (Demanda Espontânea)	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO PRELIMINAR E PLANO DE TRABALHO	30% DOS PRODUTOS REALIZADOS

No que diz respeito à execução da meta física, a realização de todos os produtos relacionados a Elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana (Eldorado dos Carajás), Regularização Fundiária (Marabá) e Plano Diretor Municipal (São Domingos do Araguaia), confere o produto alcançado de *Três Instrumentos Elaborados* para a Região Carajás no ano de 2022, o que corresponde ao atingimento de 50% da meta estabelecida para o exercício de 2022.

Com relação à execução financeira, da dotação inicial de R\$ 44.355,00² para atender a Região Carajás durante o ano de 2022, houve movimentação financeira no valor de R\$ 4.984,98³ referente ao pagamento de diárias aos técnicos responsáveis pelo desenvolvimento da ação.

Por último, por mais que a Região Carajás tenha logrado êxito com três instrumentos urbanos elaborados, os mesmos não foram suficientes para garantir que o desenvolvimento da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* tivesse um desempenho físico e financeiro em consonância com o planejado. Nestes termos, a Região Carajás encerra o exercício de 2022 com o status *Merece Atenção*.

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

³ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO GUAJARÁ

MUNICÍPIOS PLANEJADOS: BENEVIDES.

PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2022	02 INSTRUMENTOS ELABORADOS
---------	-----------------------	---------	----	-----------	----------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Em 2022, a Sedop teve como foco de atuação, ampliar o atendimento técnico aos municípios da Região Guajará no que se refere à elaboração e implementação de instrumentos urbanos. Sendo assim, foi programado o atendimento do município de Benevides através do desenvolvimento da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano*.

Acontece que, no decorrer do ano de 2022, não houve demanda relacionada a instrumentos de Desenvolvimento Urbano para o referido município. Esta situação ratifica o quanto o compromisso do município no desenvolvimento desta ação governamental é fundamental para que a Sedop possa atingir a meta física acordada para a Região Guajará. Os municípios planejados exercem grande influência para que a ação em questão tenha um bom desempenho.

Com relação à execução financeira, embora tenha havido execução financeira na Região Guajará, conforme informado no sistema SigPlan, a mesma não está relacionada ao desenvolvimento da ação.

Por último, frente ao cenário apresentado, o desenvolvimento da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* na Região Guajará encerra o exercício de 2022 com o status *Abaixo do Esperado*.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO GUAMÁ

MUNICÍPIOS PLANEJADOS: CASTANHAL, MARAPANIM, SANTA IZABEL DO PARÁ, SANTA MARIA DO PARÁ, SÃO CAETANO DE ODIVELAS, SÃO DOMINGOS DO CAPIM, SÃO FRANCISCO DO PARÁ, SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, TERRA ALTA, VIGIA.

PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2022	19 INSTRUMENTOS ELABORADOS
---------	-----------------------	---------	----	-----------	----------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Em 2022, a Sedop teve como foco de atuação, ampliar o atendimento técnico aos municípios da Região Guamá no que se refere à elaboração e implementação de instrumentos urbanos. Sendo assim, foi programado o atendimento dos municípios de Castanhal, Marapanim, Santa Izabel do Pará, Santa Maria do Pará, São Caetano de Odiveles, São Domingos do Capim, São Francisco do Pará, São Miguel do Guamá, Terra Alta e Vigia através do desenvolvimento da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano*.

Acontece que, no decorrer do ano de 2022, não houve demanda relacionada a instrumentos de Desenvolvimento Urbano para os municípios de Santa Izabel do Pará, São Francisco do Pará, São Miguel do Guamá e Vigia. Esta situação ratifica o quanto o comprometimento do município no desenvolvimento desta ação governamental é fundamental para que a Sedop possa atingir a meta física acordada para a Região Guamá. Os municípios planejados exercem grande influência para que a ação em questão tenha um bom desempenho.

Em contrapartida, a Sedop pôde atender ao município de Magalhães Barata através de demanda espontânea voltada para a elaboração do Plano Diretor Municipal. Com relação ao município de Castanhal, no ano de 2022, teve um grande avanço no percentual executado com 80% de execução na revisão de sua legislação urbanística.

Para melhor entendimento do desempenho da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* na Região Guamá, a tabela abaixo sintetiza as principais atividades desenvolvidas e produtos obtidos, tanto nos municípios planejados, quanto no município atendido por demanda espontânea:

Nº	MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
1	CASTANHAL	REVISÃO DE LEGISLAÇÃO	- REVISÃO DE LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA MUNICIPAL.	80% DOS PRODUTOS REALIZADOS
2	MARAPANIM	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- AÇÕES REFERENTES AO CONVÊNIO Nº 28/2019 ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E SEDOP; - ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS E DOCUMENTOS PARA CONCEPÇÃO DO PLANO.	40% DOS PRODUTOS REALIZADOS
	MARAPANIM	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	- REVISÃO DO PLANO DIRETOR CONCLUÍDA.	100% DOS PRODUTOS REALIZADOS
3	MAGALHÃES BARATA (Demanda Espontânea)	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	- INICIADAS AS ATIVIDADES NO MUNICÍPIO COM AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PLANO DE AÇÃO.	40% DOS PRODUTOS REALIZADOS
4	SÃO CAETANO DE ODIVELAS	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	- EM FASE DE REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS FINAIS PARA A APROVAÇÃO DO PLANO	80% DOS PRODUTOS REALIZADOS
	SÃO CAETANO DE ODIVELAS	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, QUESTIONÁRIOS E RELATÓRIOS VIÁRIOS	30% DOS PRODUTOS REALIZADOS
5	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E RELATÓRIOS VIÁRIOS.	25% DOS PRODUTOS REALIZADOS
	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	- ORIENTAÇÃO AOS TÉCNICOS MUNICIPAIS PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS E OFICINAS TEMÁTICAS.	45% DOS PRODUTOS REALIZADOS

Quanto à meta física, a conclusão da Revisão do Plano Diretor Municipal de Marapanim, confere o produto alcançado de *Um Instrumento Elaborado* para a Região Guamá no ano de 2022, o que corresponde ao atingimento de 5% da meta estabelecida para o exercício de 2022.

Quanto à execução financeira, da dotação inicial de R\$ 168.335,00², houve movimentação financeira no valor de R\$ 2.699,12³ referente ao pagamento de diárias para a ação.

Por último, por mais que a Região Guamá tenha logrado êxito com um instrumento urbano elaborado, o mesmo não foi suficiente para garantir que o desenvolvimento da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* tivesse um desempenho físico e financeiro em consonância com o planejado. Nestes termos, a Região Guamá encerra o exercício de 2022 com o status *Abaixo do Esperado*.

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

³ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO LAGO DE TUCURUÍ					
MUNICÍPIO PLANEJADO: BREU BRANCO.					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2022	2 INSTRUMENTOS ELABORADOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Em 2022, foi programado o atendimento do município de Breu Branco através do desenvolvimento da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano.*

No entanto, não houve demanda relacionada a instrumentos de Desenvolvimento Urbano para o município de Breu Branco. Esta situação ratifica o quanto o comprometimento do município no desenvolvimento desta ação governamental é fundamental para que a Sedop possa atingir a meta física acordada para a Região Lago de Tucuruí. Os municípios planejados exercem grande influência para que a ação em questão tenha um bom desempenho.

Neste sentido, como não houve avanço no desenvolvimento das atividades, permanece o mesmo estágio informado no ano de 2021, referente as ações dos Termos de Cooperação Técnica nº 06 e 07/2019 celebrado entre Prefeitura Municipal de Breu Branco e Sedop, conforme apresentado na tabela abaixo:

Nº	MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
1	BREU BRANCO	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- ORIENTAÇÕES PARA FINALIZAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS.	70% DOS PRODUTOS REALIZADOS
	BREU BRANCO	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	- ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS TEMÁTICAS, SEMINÁRIOS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS; - ORIENTAÇÕES PARA O GRUPO DE TRABALHO QUANTO À ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ATUAL.	60% DOS PRODUTOS REALIZADOS

Com relação à execução financeira, não houve movimentação financeira do orçamento programado para a região. Sendo assim, frente ao exposto acima, o desenvolvimento da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* na Região Lago de Tucuruí encerra o exercício de 2022 com o status *Abaixo do Esperado.*

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO MARAJÓ

MUNICÍPIOS PLANEJADOS: AFUÁ, ANAJÁS, BREVES, GURUPÁ, OEIRAS DO PARÁ, PONTA DE PEDRAS, PORTEL, SALVATERRA, SANTA CRUZ DO ARARI.

PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2022	17 INSTRUMENTOS ELABORADOS
---------	-----------------------	---------	----	-----------	----------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Em 2022, a Sedop teve como foco de atuação, ampliar o atendimento técnico aos municípios da Região Marajó no que se refere à elaboração e implementação de instrumentos urbanos. Sendo assim, foi programado o atendimento dos municípios de Afuá, Anajás, Breves, Gurupá, Oeiras Do Pará, Ponta de Pedras, Portel, Salvaterra e Santa Cruz do Arari através do desenvolvimento da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano*.

Acontece que, no decorrer do ano de 2022, não houve demanda relacionada a instrumentos de Desenvolvimento Urbano para os municípios de Anajás, Breves, Santa Cruz do Arari e São Sebastião da Boa Vista. Esta situação ratifica o quanto o comprometimento do município no desenvolvimento desta ação governamental é fundamental para que a Sedop possa atingir a meta física acordada para a Região Marajó. Os municípios planejados exercem grande influência para que a ação em questão tenha um bom desempenho.

Em contrapartida, a Sedop pôde atender ao município de Muaná através de demanda espontânea voltada para a elaboração de Legislações Urbanísticas. Para melhor entendimento do desempenho da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* na Região Marajó, a tabela abaixo sintetiza as principais atividades desenvolvidas e produtos obtidos, tanto nos municípios planejados, quanto no município atendido por demanda espontânea:

Nº	MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
1	AFUÁ	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- FIRMADO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 08/2021 ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E SEDOP; - REALIZAÇÃO DE REUNIÃO TÉCNICA PARA APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA; - INICIADAS AS ATIVIDADES NO MUNICÍPIO.	30% DOS PRODUTOS REALIZADOS
2	GURUPÁ	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- AÇÕES INICIAIS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO.	40% DOS PRODUTOS REALIZADOS
	GURUPÁ	REVISÃO DO PLANO DE DIRETOR MUNICIPAL	- EM FASE FINAL DA ELABORAÇÃO DA MINUTA DA LEI DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO DO PLANO PELA CÂMARA DOS VEREADORES.	90% DOS PRODUTOS REALIZADOS
3	MUANÁ (Demanda Espontânea)	LEGISLAÇÕES URBANÍSTICAS (Implementação e revisão)	- INICIADAS AS ATIVIDADES NO MUNICÍPIO.	15% DOS PRODUTOS REALIZADOS
4	OEIRAS DO PARÁ	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	- REALIZAÇÃO DAS ETAPAS MAIS AVANÇADAS DO PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR	90%
5	PONTA DE PEDRAS	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- EM FASE DE ESTRUTURAÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO E ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E QUESTIONÁRIOS.	30% DOS PRODUTOS REALIZADOS
6	PORTEL	LEGISLAÇÕES URBANÍSTICAS (Implementação e Revisão)	- EM ANDAMENTO A ELABORAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL	30% DOS PRODUTOS REALIZADOS
7	SALVATERRA	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	- AÇÕES INICIAIS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO	20% DOS PRODUTOS REALIZADOS

Com relação à execução financeira, da dotação inicial de R\$ 136.894,00² para atender a Região Marajó durante o ano de 2022, houve movimentação financeira no valor de R\$ 8.389,58³ referente ao pagamento de diárias aos técnicos responsáveis pelo desenvolvimento da ação.

Por último, levando em consideração o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da Ação 8694. *Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* na Região Marajó encerra o exercício de 2022 com o status *Abaixo do Esperado*.

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

³ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO RIO CAETÉ

MUNICÍPIOS PLANEJADOS: AUGUSTO CORRÊA, BRAGANÇA, CAPANEMA, SÃO JOÃO DE PIRABAS.

PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2022	8 INSTRUMENTOS ELABORADOS
----------------	------------------------------	----------------	-----------	------------------	----------------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Em 2022, a Sedop teve como foco de atuação, ampliar o atendimento técnico aos municípios da Região Rio Caeté no que se refere à elaboração e implementação de instrumentos urbanos. Sendo assim, foi programado o atendimento dos municípios de Augusto Corrêa, Bragança, Capanema e São João de Pirabas através do desenvolvimento da Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano.

Acontece que, no decorrer do ano de 2022, não houve demanda relacionada a instrumentos de Desenvolvimento Urbano para os municípios de São João de Pirabas e Bragança. Além disso, o município de Capanema não avançou na elaboração do seu plano de Mobilidade e, por consequência, não houve a renovação da Cooperação Técnica para o ano de 2023. Esta situação ratifica, o quanto o comprometimento do município no desenvolvimento desta ação governamental é fundamental para que a Sedop possa atingir a meta física acordada para a Região Rio Caeté. Os municípios planejados exercem grande influência para que a ação em questão tenha um bom desempenho.

Sendo assim, dos municípios planejados, esta ação governamental foi desenvolvida apenas no município de Augusto Corrêa. A tabela abaixo sintetiza as principais atividades desenvolvidas e produtos obtidos no referido município:

Nº	MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
1	AUGUSTO CORREA	INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS	- ORIENTAÇÕES À EQUIPE TÉCNICA DO MUNICÍPIO SOBRE O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO.	30% DOS PRODUTOS REALIZADOS
	AUGUSTO CORREA	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- PLANO DE MOBILIDADE URBANA CONCLUÍDO.	100% DOS PRODUTOS REALIZADOS

No que diz respeito à execução da meta física, a realização de todos os produtos relacionados a Elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana do município de Augusto

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

Corrêa, confere o produto alcançado de Um Instrumento Elaborado para a Região Rio Caeté no ano de 2022, o que corresponde ao atingimento de 13% da meta estabelecida para o exercício de 2022.

Com relação à execução financeira, da dotação inicial de R\$ 60.540,00¹ para atender a Região Rio Caeté durante o ano de 2022, houve movimentação financeira no valor de R\$ 1.661,66² referente ao pagamento de diárias aos técnicos responsáveis pelo desenvolvimento da ação.

Por último, por mais que a Região Rio Caeté tenha logrado êxito com um instrumento urbano elaborado, o mesmo não foi suficiente para garantir que o desenvolvimento da Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano tivesse um desempenho físico e financeiro em consonância com o planejado. Nestes termos, a Região Rio Caeté encerra o exercício de 2022 com o status *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAPIM

MUNICÍPIOS PLANEJADOS: BUJARU, RONDON DO PARÁ, TOMÉ – AÇU E ULIANÓPOLIS

PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2022	8 INSTRUMENTOS ELABORADOS
---------	-----------------------	---------	----	-----------	---------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Em 2022, a Sedop teve como foco de atuação, ampliar o atendimento técnico aos municípios da Região Rio Capim no que se refere à elaboração e implementação de instrumentos urbanos. Sendo assim, foi programado o atendimento dos municípios Bujaru, Rondon do Pará, Tomé-Açu e Ulianópolis através do desenvolvimento da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano*.

Acontece que, no decorrer do ano de 2022, não houve demanda relacionada a instrumentos de Desenvolvimento Urbano para o município de Bujaru. Esta situação ratifica o quanto o comprometimento do município no desenvolvimento desta ação governamental é fundamental para que a Sedop possa atingir a meta física acordada para a Região Rio Capim. Os municípios planejados exercem grande influência para que a ação em questão tenha um bom desempenho.

Em contrapartida, a Sedop pôde atender ao município de Capitão Poço através de demanda espontânea voltada para a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Para melhor entendimento do desempenho da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* na Região Rio Capim, a tabela abaixo sintetiza as principais atividades desenvolvidas e produtos obtidos, tanto nos municípios planejados, quanto no município atendido por demanda espontânea:

Nº	MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
1	CAPITÃO POÇO (Demanda Espontânea)	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE CONCLUÍDO.	100% DOS PRODUTOS REALIZADOS
2	RONDON DO PARÁ	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	- INICIADAS AS ATIVIDADES NO MUNICÍPIO CONFORME CRONOGRAMA; - ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ELABORAÇÃO FUNDIÁRIA.	40% DOS PRODUTOS REALIZADOS
3	TOMÉ-AÇU	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, PEÇAS TÉCNICAS E INVENTÁRIO PRELIMINAR.	30% DOS PRODUTOS REALIZADOS
	TOMÉ-AÇU	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	- ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E AUDIÊNCIA DE LANÇAMENTO DO PLANO.	40% DOS PRODUTOS REALIZADOS
4	ULIANÓPOLIS	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE CONCLUÍDO.	100% DOS PRODUTOS REALIZADOS

No que diz respeito à execução da meta física, a realização de todos os produtos relacionados a Elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana nos municípios de Capitão Poço e Ulianópolis, confere o produto alcançado de *Dois Instrumentos Elaborados* para a Região Rio Capim no ano de 2022, o que corresponde ao atingimento de 25% da meta estabelecida para o exercício de 2022.

Com relação à execução financeira, da dotação inicial de R\$ 60.695,00² para atender a Região Rio Capim durante o ano de 2022, houve movimentação financeira no valor de R\$ 6.119,86³ referente ao pagamento de diárias aos técnicos responsáveis pelo desenvolvimento da ação.

Por último, por mais que a Região Rio Capim tenha logrado êxito com dois instrumentos urbanos elaborados, os mesmos não foram suficientes para garantir que o desenvolvimento da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* tivesse um desempenho físico e financeiro em consonância com o planejado. Nestes termos, a Região Rio Capim encerra o exercício de 2022 com o status *Abaixo do Esperado*.

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

³ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO TAPAJÓS

MUNICÍPIO PLANEJADO: ITAITUBA.

PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2022	2 INSTRUMENTOS ELABORADOS
----------------	------------------------------	----------------	-----------	------------------	----------------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Em 2022, a Sedop teve como foco de atuação, ampliar o atendimento técnico aos municípios da Região Tapajós no que se refere à elaboração e implementação de instrumentos urbanos. Sendo assim, foi programado o atendimento do município de Itaituba através do desenvolvimento da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano*.

Acontece que, no decorrer do ano de 2022, não houve demanda relacionada a instrumentos de Desenvolvimento Urbano para o município. Esta situação ratifica o quanto o comprometimento do município no desenvolvimento desta ação governamental é fundamental para que a Sedop possa atingir a meta física acordada para a Região Tapajós. Os municípios planejados exercem grande influência para que a ação em questão alcance um bom desempenho.

Em contrapartida, a Sedop pôde atender ao município de Novo Progresso através de demanda espontânea voltada para a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana e para a Revisão do Plano Diretor Municipal. Para melhor entendimento do desempenho da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* na Região Tapajós, a tabela abaixo sintetiza as principais atividades desenvolvidas e produtos obtidos no município atendido por demanda espontânea:

Nº	MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
1	NOVO PROGRESSO	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE	20% DOS PRODUTOS REALIZADOS
	NOVO PROGRESSO	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	- ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA A REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	30% DOS PRODUTOS REALIZADOS

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

Com relação à execução financeira, da dotação inicial de R\$ 15.135,00¹ para atender a Região Tapajós durante o ano de 2022, houve movimentação financeira no valor de R\$ 1.490,95² referente ao pagamento de diárias aos técnicos responsáveis pelo desenvolvimento da ação.

Por último, levando em consideração o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* na Região Tapajós encerra o exercício de 2022 com o status *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO TOCANTINS					
MUNICÍPIOS PLANEJADOS: BAIÃO E CAMETÁ					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2022	4 INSTRUMENTOS ELABORADOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Em 2022, a Sedop teve como foco de atuação, ampliar o atendimento técnico aos municípios da Região Tocantins no que se refere à elaboração e implementação de instrumentos urbanos. Sendo assim, foi programado o atendimento dos municípios de Baião e Cametá através do desenvolvimento da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano*.

Todos os municípios programados foram atendidos durante o ano de 2022, ratificando o quanto o comprometimento do município no desenvolvimento desta ação governamental é fundamental para que a Sedop possa atingir a meta física acordada para a Região Tocantins. Os municípios planejados exercem grande influência para que a ação em questão tenha o desempenho *Conforme Programado*. Além do atendimento aos municípios planejados, Sedop pôde atender ao município de Moju através de demanda espontânea voltada para a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana e para a Revisão do Plano Diretor Municipal.

Para melhor entendimento do desempenho da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* na Região Tocantins, a tabela abaixo sintetiza as principais atividades desenvolvidas e produtos obtidos nos municípios planejados e no município atendido por demanda espontânea:

Nº	MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXECUTADO ¹
1	BAIÃO	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- PLANO DE MOBILIDADE URBANA CONCLUÍDO.	100% DOS PRODUTOS REALIZADOS
2	CAMETÁ	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- EM FASE DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS.	70% DOS PRODUTOS REALIZADOS
	CAMETÁ	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	- ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA REVISÃO DO PDM.	40% DOS PRODUTOS REALIZADOS
3	MOJU (Demanda Espontânea)	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	- REALIZAÇÃO DE REUNIÃO TÉCNICA OBJETIVANDO COLETAR INFORMAÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL DO MUNICÍPIO; - ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.	20% DOS PRODUTOS REALIZADOS
	MOJU (Demanda Espontânea)	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	- ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DAS ETAPAS INICIAIS DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, COM REALIZAÇÃO DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA.	20% DOS PRODUTOS REALIZADOS

No que diz respeito à execução da meta física, a realização de todos os produtos relacionados a Elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana no município de Baião, confere o produto alcançado de Um Instrumento Elaborado para a Região Tocantins no ano de 2022, o que corresponde ao atingimento de 25% da meta estabelecida para o exercício de 2022.

Com relação à execução financeira, da dotação inicial de R\$ 30.428,00² para atender a Região Tocantins durante o ano de 2022, houve movimentação financeira no valor de R\$ 5.164,67³ referente ao pagamento de diárias aos técnicos responsáveis pelo desenvolvimento da ação.

Por último, por mais que a Região Tocantins tenha logrado êxito com um instrumento urbano elaborado, o mesmo não foi suficiente para garantir que o desenvolvimento da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* tivesse um desempenho físico e financeiro em consonância com o planejado. Nestes termos, a Região Tocantins encerra o exercício de 2022 com o status *Abaixo do Esperado*.

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

³ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO XINGU					
MUNICÍPIOS PLANEJADOS: ALTAMIRA E BRASIL NOVO					
PRODUTO	INSTRUMENTO ELABORADO	UNIDADE	UN	META 2022	4 INSTRUMENTOS ELABORADOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Em 2022, a Sedop teve como foco de atuação, ampliar o atendimento técnico aos municípios da Região Xingu no que se refere à elaboração e implementação de instrumentos urbanos. Sendo assim, foi programado o atendimento dos municípios de Altamira e Brasil Novo através do desenvolvimento da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano*.

Acontece que, no decorrer do ano de 2022, não houve demanda relacionada a instrumentos de Desenvolvimento Urbano para os referidos municípios. Esta situação ratifica o quanto o comprometimento do município no desenvolvimento desta ação governamental é fundamental para que a Sedop possa atingir a meta física acordada para a Região Xingu. Os municípios planejados exercem grande influência para que a ação em questão tenha um bom desempenho.

Com relação à execução financeira, da dotação inicial de R\$ 30.428,00¹ para atender a Região Xingu durante o ano de 2022, não houve movimentação financeira.

Por último, frente ao cenário apresentado, o desenvolvimento da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* na Região Xingu encerra o exercício de 2022 com o status *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

2.3.2. PROGRAMA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO

2.3.2.1. IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO BAIXO AMAZONAS					
MUNICÍPIO PLANEJADO: SANTARÉM					
PRODUTO	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2022	1 EQUIPAMENTO IMPLANTADO

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Na Região Baixo Amazonas, foi programado o atendimento da Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos no município de Santarém com a execução da obra “Construção do Centro de Convenções”. No entanto, por se tratar de um Projeto Prioritário, as informações sobre sua evolução no decorrer do ano de 2022 encontram-se no Capítulo II deste Relatório de Gestão.

Além do Projeto Prioritário, a Sedop executou mais duas obras no município de Santarém e uma obra no município de Terra Santa, obras estas que apesar de não terem sido programadas nos instrumentos de planejamento da Sedop para o ano de 2022, foram executadas através de Destaque Orçamentário. A tabela abaixo consolida as principais informações referentes a estas obras.

Nº	MUNICÍPIO	Nº CONVÊNIO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR GLOBAL
1	SANTARÉM	010/2022	CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO POR RIP-RAP, NO DISTRITO DE CURAI.	R\$ 316.653,93
	SANTARÉM	099/2022	CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DA SERRA DO SAUBAL.	R\$ 2.457.864,90
2	TERRA SANTA	040/2022	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO COBERTO DO AEROPORTO.	R\$ 156.214,31
TOTAL				R\$ 2.930.733,14

Nestes municípios, foram celebrados Convênios de Cooperação Técnica com a Sedop, a qual tem como obrigação principal a transferência do recurso oriundo de Demanda Governamental para as Prefeituras Municipais, enquanto que estas são as responsáveis pela consecução do objeto pactuado no convênio. As obras foram iniciadas no segundo semestre e encontram-se com a evolução em conformidade com o cronograma físico e financeiro, com conclusão prevista para 2023.

No que diz respeito à execução financeira, o valor de R\$ 1.149.130,00¹ programado para atender a Região Baixo Amazonas, foi acrescido de R\$ 35.947.162,81, totalizando o valor de R\$ 37.096.292,81².

É necessário esclarecer que parte desta divergência *Orçamento Planejado X Orçamento Executado*, deve-se à limitação do Teto Orçamentário disponibilizado para a Sedop, o qual é insuficiente para a real necessidade de execução das obras programadas e, parte, ao atendimento de demandas que não constavam na programação orçamentária referente à execução de obras para o ano de 2022, elaborada pela área técnica.

Diante do exposto, e considerando que a meta física estabelecida não foi alcançada, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos* na Região Baixo Amazonas, no decorrer do ano de 2022, apresenta o status *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO CARAJÁS

DEMANDA ESPONTÂNEA: BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

PRODUTO	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2022	AÇÃO NÃO PLANEJADA PARA ESTA REGIÃO.
---------	---------------------------	---------	----	-----------	---

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Embora a Região Carajás não tenha sido contemplada nos instrumentos de planejamento da Sedop para implementação da *Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos em 2022*, o município de Brejo Grande do Araguaia foi beneficiado com recurso oriundo de Demanda Governamental.

Sendo assim, foi celebrado Convênio de Cooperação Técnica entre a Prefeitura Municipal e a Sedop no valor de R\$ 2.192.784,89, cujo objeto refere-se a “Revitalização e Paisagismo e Iluminação de Canteiro Central em uma Extensão de 3km de Via Urbana”. Cabe à Sedop garantir a transferência do recurso e às prefeituras, a consecução do objeto pactuado no convênio. A obra foi iniciada no segundo semestre e encontra-se com a evolução em conformidade com o cronograma físico e financeiro, com conclusão prevista para 2023.

Quanto à execução financeira, como nesta região não estava previsto o desenvolvimento da ação, não houve orçamento programado para o exercício de 2022. No entanto, para o atendimento da demanda governamental a dotação, que até então não existia, precisou ser atualizada em R\$ 643.434,47, valor necessário para o início da obra.

Finalizando, considerando o cenário apresentado, no decorrer do ano de 2022 a Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos na Região Carajás, apresentou o desempenho físico e financeiro *Abaixo do Esperado*.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO GUAMÁ

MUNICÍPIOS DE DEMANDA ESPONTÂNEA: CURUÇÁ, MARAPANIM, SÃO CAETANO DE ODIVELAS, SÃO DOMINGOS DO CAPIM.

PRODUTO	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2022	AÇÃO NÃO PLANEJADA PARA ESTA REGIÃO.
---------	------------------------	---------	----	-----------	--------------------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Embora a Região Guamá não tenha sido contemplada para o desenvolvimento da Ação 7658. *Implantação de Equipamentos Turísticos* durante o ano de 2022, os municípios de Curuçá, São Caetano de Odivelas e São Domingos do Capim foram beneficiados com recursos oriundos de Demanda Governamental e o município de Marapanim com recursos oriundos de Emenda Parlamentar. A tabela abaixo sintetiza as principais informações sobre as obras objeto de Convênios de Cooperação Técnica entre Sedop e Prefeituras Municipais.

Nº	MUNICÍPIO	Nº CONVÊNIO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR GLOBAL
1	CURUÇÁ	093/2022	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE.	R\$ 526.941,34
3	SÃO CAETANO DE ODIVELAS	066/2022	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO.	R\$ 8.368.230,98
4	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	225/2022	RECUPERAÇÃO DE UM TRECHO DA ORLA MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DO TRAPICHE MUNICIPAL.	R\$ 1.811.274,73
TOTAL				R\$ 10.706.447,05

Em todos estes municípios, a Sedop tem como obrigação principal a transferência do recurso oriundo de Demanda Governamental para as Prefeituras Municipais, enquanto que estas são as responsáveis pela consecução do objeto pactuado no convênio. Todas as obras foram iniciadas no segundo semestre e encontram-se com a evolução em conformidade com o cronograma físico e financeiro, com conclusão prevista para 2023.

No que diz respeito ao município de Marapanim, não houve programação pela Sedop para atendimento através desta Ação Governamental. No entanto, o mesmo foi contemplado com recurso de emenda parlamentar na etapa de aprovação do orçamento, sendo desta forma inserido pela Seplad no instrumento de planejamento orçamentário da Sedop para o ano de 2022.

Apesar do objeto proposto pela emenda parlamentar não ter se concretizado, foi iniciada, no município de Marapanim, a obra “Construção do Muro de Concreto e Proteção do Muro com Enrocamento de Pedra Rachão, da Praia de Crispim” e tem previsão para ser concluída em 2023.

Faz-se necessário esclarecer que os referidos municípios não entraram no planejamento orçamentário para o ano de 2022 devido não constarem na programação de obras previstas. No entanto, por natureza institucional, a Sedop é o órgão responsável por executar obras de interesse do Governo do Estado, estando ou não previstas nos instrumentos de planejamento desta Secretaria.

Com relação à execução financeira, a dotação inicial de R\$ 1.000.000,00¹ que aparece no SigPlan – Monitoramento refere-se à obra da emenda parlamentar não programada pela Sedop. A mesma precisou ser atualizada para R\$ 3.165.017,15² objetivando atender as obras em execução nos municípios acima relatados.

Por fim, considerando o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos na Região Guamá, no decorrer do ano de 2022, foi Abaixo do Esperado.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO LAGO DE TUCURUÍ

DEMANDA ESPONTÂNEA: BREU BRANCO

PRODUTO	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2022	AÇÃO NÃO PLANEJADA PARA ESTA REGIÃO
---------	---------------------------	---------	----	-----------	--

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Embora a Região do Lago de Tucuruí não tenha sido contemplada para o desenvolvimento da *Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos* durante o ano de 2022, o município de Breu Branco foi beneficiado com recurso oriundo de Demanda Governamental.

Sendo assim, foi celebrado Convênio de Cooperação Técnica entre a Prefeitura Municipal e a Sedop no valor de R\$ 2.638.995,66, cujo objeto refere-se a “Revitalização da Orla do Município de Breu Branco”. Cabe à Sedop garantir a transferência do recurso e às prefeituras, a consecução do objeto pactuado no convênio. A obra foi iniciada no segundo semestre e encontra-se com a evolução em conformidade com o cronograma físico e financeiro, com conclusão prevista para 2023.

Faz-se necessário esclarecer que o referido município não entrou no planejamento orçamentário para o ano de 2022 devido não constar na programação de obras encaminhada pela área técnica no momento da elaboração do orçamento. No entanto, por natureza institucional, a Sedop é o órgão responsável por executar obras de interesse do Governo do Estado, estando ou não previstas nos instrumentos de planejamento desta Secretaria.

Quanto à execução financeira, como nesta região não estava previsto o desenvolvimento da ação, não houve orçamento programado para o exercício de 2022. No entanto, para o atendimento desta demanda governamental a dotação, que até então não existia, precisou ser atualizada em R\$ 687.899,38¹, valor necessário para o início da obra.

Desta forma, considerando o cenário apresentado, no decorrer do ano de 2022 a Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos na Região Lago de Tucuruí, apresentou o desempenho físico e financeiro *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO MARAJÓ

DEMANDA ESPONTÂNEA: BAGRE, MUANÁ E SALVATERRA

PRODUTO	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2022	AÇÃO NÃO PLANEJADA PARA ESTA REGIÃO.
---------	---------------------------	---------	----	-----------	---

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Embora a Região do Marajó não tenha sido contemplada para o desenvolvimento da Ação 7658. *Implantação de Equipamentos Turísticos*, em 2022, a ação foi desenvolvida nos municípios de Bagre, Muaná e Salvaterra. Com exceção das obras nos municípios de Bagre e Salvaterra, as obras no município de Muaná foram iniciadas no ano de 2022.

No município de Bagre, a população foi beneficiada com a conclusão da “Construção da Orla do Balneário Praia da Costa” no primeiro semestre de 2022. Em Salvaterra, a obra “Urbanização da Orla Beira Mar da Praia Grande” seguiu em execução no decorrer do ano de 2022 tendo sua conclusão no segundo semestre de 2022.

Quanto ao município de Muaná, o mesmo foi beneficiado com recursos oriundos de Demandas Governamentais, tendo como produto a celebração de Convênio de Cooperação Técnica entre Sedop e a Prefeitura Municipal para a execução das obras. A tabela abaixo sintetiza as principais informações:

Nº	MUNICÍPIO	Nº CONVÊNIO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR GLOBAL
1	MUANÁ	14/2022	CONSTRUÇÃO DE ORLA EM CONCRETO ARMADO.	R\$ 4.754.753,57
	MUANÁ	251/2022	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ORLA DO RIO MOCAJATUBA.	R\$ 4.755.750,85
TOTAL				R\$ 9.510.504,42

Nestes convênios, a Sedop tem como obrigação principal a transferência do recurso oriundo de Demanda Governamental para as Prefeituras Municipais, enquanto que estas são as responsáveis pela consecução do objeto pactuado no convênio. As obras no município de Muaná foram iniciadas no segundo semestre e encontram-se com a evolução em conformidade com o cronograma físico e financeiro, com conclusão prevista para 2023.

Destaca-se que os referidos municípios não entraram no planejamento orçamentário para o ano de 2022, devido não constarem na programação de obras encaminhada pela área técnica no momento da elaboração do orçamento. No entanto, por natureza institucional, a Sedop é o órgão responsável por executar obras de interesse do Governo do Estado, estando ou não previstas nos instrumentos de planejamento desta Secretaria.

Quanto à execução financeira, como nesta região não estava previsto o desenvolvimento da ação, não houve orçamento programado para o exercício de 2022. No entanto, para o atendimento destas obras, a dotação, que até então não existia, precisou ser atualizada em R\$ 3.962.144,80¹, valor necessário para o início da obra.

Finalizando, embora o Sistema SigPlan – Monitoramento conceitue esta região como *Abaixo do Esperado*, entendemos que a conclusão das obras referentes aos municípios de Bagre e Salvaterra, traduz-se na obtenção de metas (dois equipamentos implantados) na Região Marajó, que por mais que não tenham sido estabelecidas, contribuem para que o desempenho desta ação governamental apresente uma conotação positiva de *Conforme Programado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO RIO CAETÉ					
MUNICÍPIO PLANEJADO: BRAGANÇA E SALINÓPOLIS					
PRODUTO	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2022	2 EQUIPAMENTOS IMPLANTADOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Na Região do Rio Caeté, foi programado o atendimento da Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos nos municípios de Bragança e Salinópolis. No que diz respeito ao município de Salinópolis, foram programadas a execução das obras “*Requalificação da Orla do Atalaia – Urbanização*” e “*Execução de Serviços de Construção do Muro de Arrimo e Urbanização da Orla na Avenida Beira Mar, S/N*”, na Praia do Maçarico, as quais, por se tratarem de Projetos Prioritários, encontram-se descritas no Capítulo II deste Relatório de Gestão. Ainda no município de Salinópolis, foram celebrados os seguintes contratos:

1. “Execução de serviços voltados para limpeza rural, urbana e costeira”, cujo objeto foi concluído no segundo semestre de 2022;
2. “Elaboração de projetos de executivos de arquitetura e complementares de engenharia para passarelas urbanas e acessos à Praia do Maçarico e complementação da calçada existente”, cujo objeto foi concluído no primeiro semestre de 2022;
3. “Construção das Passarelas Urbanas de acesso à Praia do Maçarico”, obra iniciada no segundo semestre de 2022, com conclusão prevista para 2023.

Com relação ao município de Bragança, em 2022, foram iniciadas as obras referentes à urbanização da Orla do Caeté – Trecho I e urbanização da Orla da Praia de Ajuruteua – Etapa I, ambas com conclusão prevista para o primeiro semestre de 2023.

No segundo semestre de 2022 foram entregues, na Região Caeté, o Teatro Museu da Marujada, em Bragança, e a Orla Municipal, em Peixe-Boi. O Teatro Museu da Marujada é um importante centro cultural onde acontecem diversos eventos relacionados à Marujada, que é uma das maiores manifestações culturais e religiosas do Brasil, que é constituída por um conjunto de homenagens a São Benedito e já consagrada como patrimônio imaterial e cultural do Estado do Pará. Este equipamento turístico recebeu diversas melhorias abrangendo piso, pintura, climatização do ambiente, banheiros, cobertura, recuperação da fachada e novo

sistema elétrico. Esta obra foi viabilizada através de um convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Bragança, e trouxe beleza e conforto para a comunidade local e para os turistas.

Outra importante obra entregue no segundo semestre de 2022 foi a orla de Peixe-Boi, que ocupa uma área de 4.597,14 m². Com um investimento de mais de R\$ 2 milhões, o espaço tem novos bares, rampas de acesso, praça de alimentação, playground, banheiros, caramanchões, bancos de concreto e mesas, lixeiras, cobertura em estrutura metálica sobre os bares e iluminação urbana.

A tabela abaixo apresenta as obras que não foram programadas, mas que foram atendidos pela Sedop na Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos;

Nº	MUNICÍPIO	Nº CONVÊNIO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR GLOBAL
1	AUGUSTO CORRÊA	258/2022	REFORMA DA ORLA DA CIDADE DE AUGUSTO CORRÊA, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE PÍER EM CONCRETO ARMADO E BANHEIRO PÚBLICO.	R\$ 1.677.590,13
2	BRAGANÇA	075/2022	REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUSEU DA MARUJADA.	R\$ 778.320,85
3	PEIXE-BOI	015/2021	REQUALIFICAÇÃO DA ORLA DO RIO PEIXE-BOI.	R\$ 2.063.094,94
4	QUATIPURU	267/2022	URBANIZAÇÃO DA ORLA DE BOA VISTA.	R\$ 1.321.406,07
TOTAL				R\$ 5.840.411,99

Em todos estes municípios, foram celebrados Convênios de Cooperação Técnica com a Sedop, a qual tem como obrigação principal a transferência do recurso oriundo de Demanda Governamental para as Prefeituras Municipais, enquanto que estas são as responsáveis pela consecução do objeto pactuado no convênio.

No que diz respeito à execução financeira, a dotação inicial no valor de R\$ 60.198.747,00¹ programado para atender a Região Rio Caeté precisou ser atualizada para R\$ 89.416.068,49², ultrapassando em R\$ 29.217.321,49 o orçamento programado.

Diante do exposto e considerando que a meta física estabelecida foi alcançada, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos* na Região Rio Caeté, no decorrer do ano de 2022, apresenta o status *Conforme o Programado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAPIM

MUNICÍPIOS DE DEMANDA ESPONTÂNEA: AURORA DO PARÁ, NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, OURÉM

PRODUTO	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2022	AÇÃO NÃO PLANEJADA PARA ESTA REGIÃO.
---------	------------------------	---------	----	-----------	--------------------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Embora a Região do Rio Capim não tenha sido contemplada para o desenvolvimento da *Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos* durante o ano de 2022, os municípios de Aurora do Pará, Nova Esperança do Piriá e Ourém foram beneficiados com recursos oriundos de Demanda Governamental. A tabela abaixo sintetiza as principais informações sobre as obras que são objeto de Convênios de Cooperação Técnica entre Sedop e Prefeituras Municipais.

Nº	MUNICÍPIO	Nº CONVÊNIO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR GLOBAL
1	AURORA DO PARÁ	91/2022	CONSTRUÇÃO DE ORLA NO RIO CUITÉ.	R\$ 3.457.997,82
		262/2022	CONSTRUÇÃO DE 2 PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE.	R\$ 434.598,89
2	NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ	224/2022	CANALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO LAGO.	R\$ 8.863.789,80
3	OURÉM	111/2022	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE OURÉM.	R\$ 3.851.541,81
TOTAL				R\$ 16.607.928,32

Em todos estes municípios, a Sedop tem como obrigação principal a transferência do recurso oriundo de Demanda Governamental para as Prefeituras Municipais, enquanto que estas são as responsáveis pela consecução do objeto pactuado no convênio. Todas as obras foram iniciadas no segundo semestre e encontram-se com a evolução em conformidade com o cronograma físico e financeiro, com conclusão prevista para 2023.

Faz-se necessário esclarecer que os referidos municípios não entraram no planejamento orçamentário para o ano de 2022, devido não constarem na programação de obras encaminhada pela área técnica no momento da elaboração do orçamento. No entanto, por natureza institucional, a Sedop é o órgão responsável por executar obras de interesse do Governo do Estado, estando ou não previstas nos instrumentos de planejamento desta Secretaria.

Quanto à execução financeira, como nesta região não estava previsto o desenvolvimento da ação, não houve orçamento programado para o exercício de 2022. No entanto, para o

atendimento destas obras, a dotação, que até então não existia, precisou ser atualizada em R\$ 2.057.962,61¹, valor necessário para o início das obras.

Por fim, considerando o cenário apresentado, no decorrer do ano de 2022 a Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos na Região Rio Capim, apresentou o desempenho físico e financeiro *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO TAPAJÓS

DEMANDA ESPONTÂNEA: AVEIRO E RURÓPOLIS

PRODUTO	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2022	AÇÃO NÃO PLANEJADA PARA ESTA REGIÃO.
---------	------------------------	---------	----	-----------	--------------------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Embora a Região Tapajós não tenha sido contemplada para o desenvolvimento da Ação 7658. *Implantação de Equipamentos Turísticos* durante o ano de 2022, os municípios de Aveiro e Rurópolis foram beneficiados com recursos oriundos de Demanda Governamental.

A tabela abaixo sintetiza informações sobre convênios de Cooperação Técnica entre Sedop e Prefeituras Municipais.

Nº	MUNICÍPIO	Nº CONVÊNIO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR GLOBAL
1	AVEIRO	07/2022	CONSTRUÇÃO DE TRAPICHE.	R\$ 1.879.950,36
2	RURÓPOLIS	222/2022	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES.	R\$ 2.358.687,32
TOTAL				R\$ 4.238.637,68

Nestes municípios, a Sedop tem como obrigação a transferência do recurso oriundo de Demanda Governamental para as Prefeituras. Estas, por sua vez, são responsáveis pela consecução do objeto do convênio. As obras foram iniciadas e encontram-se com a evolução em conformidade com o cronograma físico e financeiro, com conclusão prevista para 2023.

O municípios acima não entraram no planejamento orçamentário para o ano de 2022 porque isto não foi proposto pela área técnica durante a elaboração do orçamento. No entanto, a Sedop é o órgão responsável por executar obras de interesse do Estado, estando ou não previstas no planejamento desta Secretaria.

Quanto à execução financeira, não houve orçamento programado para o exercício de 2022. No entanto, para o atendimento destas obras, a dotação, que até então não existia, precisou ser atualizada em R\$ 836.561,24¹, valor necessário para o início das obras.

Por fim, considerando o cenário apresentado, no decorrer do ano de 2022 a Ação 7658. *Implantação de Equipamentos Turísticos* na Região Tapajós, apresentou o desempenho físico e financeiro *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO TOCANTINS

MUNICÍPIOS DE DEMANDA ESPONTÂNEA: ACARÁ, BARCARENA E IGARAPÉ – MIRI

PRODUTO	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2022	AÇÃO NÃO PLANEJADA PARA ESTA REGIÃO
---------	------------------------	---------	----	-----------	-------------------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Embora a Região do Tocantins não tenha sido contemplada para o desenvolvimento da *Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos* durante o ano de 2022, os municípios de Acará e Igarapé-Miri foram beneficiados com recursos oriundos de Demanda Governamental e o município de Barcarena com recursos oriundos de Emenda Parlamentar.

A tabela abaixo sintetiza as principais informações sobre as obras que são objeto de Convênio de Cooperação Técnica entre Sedop e Prefeituras:

Nº	MUNICÍPIO	Nº CONVÊNIO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR GLOBAL
1	ACARÁ	089/2022	CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ORLA DA CIDADE.	R\$ 6.238.801,77
2	IGARAPÉ-MIRI	016/2022	URBANIZAÇÃO DA ORLA EM PAVIMENTO ATERRADO.	R\$ 7.054.475,73
TOTAL				R\$ 13.293.277,50

Nestes municípios, a Sedop tem como obrigação principal a transferência do recurso oriundo de Demanda Governamental para as Prefeituras Municipais, enquanto que estas são as responsáveis pela consecução do objeto pactuado no convênio. Todas as obras foram iniciadas no segundo semestre e encontram-se com a evolução em conformidade com o cronograma físico e financeiro, com conclusão prevista para 2023.

No que diz ao município de Barcarena, não houve programação pela Sedop para atendimento através desta Ação Governamental, no entanto, o mesmo foi contemplado com recurso de emenda parlamentar na etapa de aprovação do orçamento, sendo desta forma inserido pela Seplad no instrumento de planejamento orçamentário da Sedop para o ano de 2022.

Sendo assim, foi iniciada a obra “Requalificação e Urbanização da Orla do município de Barcarena no trecho entre Trav. São Francisco e Av. Gerônimo Pimentel” no Município de Barcarena, com conclusão prevista para 2023.

Faz-se necessário esclarecer que os referidos municípios não entraram no planejamento orçamentário para o ano de 2022 devido não constarem na programação de obras previstas. No entanto, por natureza institucional, a Sedop é o órgão responsável por executar obras de

interesse do Governo do Estado, estando ou não previstas nos instrumentos de planejamento desta Secretaria.

Com relação à execução financeira, a dotação inicial de R\$ 52.000,00¹ que aparece no SigPlan – Monitoramento refere-se à obra da emenda parlamentar não programada pela Sedop. A mesma precisou ser atualizada para R\$ 17.869.871,38² objetivando atender as obras em execução nos municípios acima relatados. Parte desta divergência *Orçamento Planejado X Orçamento Executado*, deve-se à real necessidade para a execução das obras programadas e, parte, ao atendimento de demandas que não constavam na programação orçamentária referente à execução de obras para o ano de 2022, elaborada pela área técnica.

Por fim, considerando o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos* na Região Tocantins, no decorrer do ano de 2022, apresenta o status *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO XINGU					
MUNICÍPIOS DE DEMANDA ESPONTÂNEA: PLACAS E PORTO DE MOZ					
PRODUTO	EQUIPAMENTO IMPLANTADO	UNIDADE	UN	META 2022	AÇÃO NÃO PLANEJADA PARA ESTA REGIÃO

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Embora a Região Xingu não tenha sido contemplada para o desenvolvimento da *Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos* durante o ano de 2022, os municípios de Placas e Porto de Moz foram beneficiados com esta ação.

No município de Placas, foi celebrado Convênio de Cooperação Técnica entre a Sedop e a Prefeitura Municipal para “Construção de Monumento aos Pioneiros”. A referida obra foi iniciada no primeiro semestre de 2022 e tem conclusão prevista para 2023.

Já o município de Porto de Moz foi beneficiado com recursos oriundo de Emenda Parlamentar para a “Construção do Muro de Arrimo da Orla de Porto de Moz”. A obra foi iniciada no segundo semestre de 2022 e encontra-se com a evolução em conformidade com o cronograma físico e financeiro, com conclusão prevista para 2023.

Faz-se necessário esclarecer que os referidos municípios não entraram no planejamento orçamentário para o ano de 2022 devido não constarem na programação de obras previstas. No entanto, por natureza institucional, a Sedop é o órgão responsável por executar obras de interesse do Governo do Estado, estando ou não previstas nos instrumentos de planejamento desta Secretaria.

Quanto à execução financeira, como nesta região não estava previsto o desenvolvimento da ação, não houve orçamento programado para o exercício de 2022. No entanto, para o atendimento destas obras, a dotação, que até então não existia, precisou ser atualizada em R\$ 500.000,00¹, valor necessário para o início da obra.

Sendo assim, considerando o cenário apresentado, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos* na Região Xingu, no decorrer do ano de 2022, apresenta o status *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

2.3.3. PROGRAMA ESPORTE E LAZER

2.3.3.1. CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO ARAGUAIA					
MUNICÍPIO DEMANDA ESPONTÂNEA: RIO MARIA					
PRODUTO	EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO	UNIDADE	UN	META 2022	AÇÃO NÃO PLANEJADA PARA ESTA REGIÃO.

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Embora a Região do Araguaia não tenha sido contemplada nos instrumentos de planejamento da Sedop para implementação da *Ação 7659. Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer* em 2022, o município de Rio Maria foi beneficiado com recurso oriundo de Demanda Governamental.

Sendo assim, foi celebrado Convênio de Cooperação Técnica entre a Prefeitura Municipal e a Sedop no valor de R\$ 61.504,68, cujo objeto refere-se a “Construção de Parque e Academia no Setor Vila Verde na Sede do Município de Rio Maria”. Cabe à Sedop garantir a transferência do recurso e às prefeituras, a consecução do objeto pactuado no convênio. A obra foi iniciada no segundo semestre e encontra-se com a evolução em conformidade com o cronograma físico e financeiro, com conclusão prevista para 2023.

Quanto à execução financeira, como nesta região não estava previsto o desenvolvimento da ação, não houve orçamento programado para o exercício de 2022. No entanto, para o atendimento da demanda governamental a dotação, que até então não existia, precisou ser atualizada em R\$ 25.000,00¹, valor necessário para o início da obra.

Finalizando, considerando o cenário apresentado, no decorrer do ano de 2022 a *Ação 7659. Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer* na Região Araguaia, apresentou o desempenho físico e financeiro *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO BAIXO AMAZONAS

MUNICÍPIO PLANEJADO: SANTARÉM

PRODUTO	EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO	UNIDADE	UN	META 2022	2 EQUIPAMENTOS CONSTRUÍDOS
----------------	-------------------------------	----------------	-----------	------------------	-----------------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Na Região do Baixo Amazonas, foi programado o desenvolvimento da *Ação 7659. Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer* no município de Santarém com a execução das seguintes obras: “*Reforma e Conclusão do Estádio Colosso do Tapajós*” e “*Implantação do Sistema de Refrigeração e Adequação a Área de Segurança do Ginásio Poliesportivo de Santarém*”. Entretanto, por ambas serem Projetos Prioritários, as informações sobre sua evolução no decorrer do ano de 2022 encontram-se no Capítulo II deste Relatório de Gestão.

Além destes projetos prioritários no município de Santarém, outros municípios que, apesar de não terem sido programados nos instrumentos de planejamento da Sedop para o ano de 2022, foram atendidos por esta ação governamental na Região Baixo Amazonas. Estes municípios foram beneficiados com recursos oriundos de Demandas Governamentais ou Emendas Parlamentares para a execução das mais variadas obras.

Para melhor entendimento, as principais informações referentes a estas obras encontram-se consolidadas na tabela abaixo:

Nº	MUNICÍPIO	Nº CONVÊNIO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR GLOBAL
1	ALENQUER	220/2022	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS.	R\$ 2.663.562,14
	ALENQUER	20/2022	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA AUGUSTO CEZAR QUARESMA.	R\$ 391.579,66
	ALENQUER	12/2022	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA.	R\$ 391.579,66
2	FARO	284/2022	REFORMA DO COMPLEXO CULTURAL E ESPORTIVO (BUMBÓDROMO).	R\$ 1.109.272,31
3	JURUTI	63/2022	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE E LAZER ISAIAS BATISTA FILHO.	R\$ 8.156.846,43
4	MOJÚ DOS CAMPOS	259/2022	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA.	R\$ 2.166.334,74
	MOJÚ DOS CAMPOS	198/2022	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO.	R\$ 2.717.774,54
	MOJÚ DOS CAMPOS	62/2022	ILUMINAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL.	R\$ 82.728,16
	MOJÚ DOS CAMPOS	84/2022	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE PIRANHA.	R\$ 264.891,95

Nº	MUNICÍPIO	Nº CONVÊNIO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR GLOBAL
5	SANTARÉM	96/2022	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, NA COMUNIDADE DO CRUZEIRO.	R\$ 266.426,17
6	TERRA SANTA	80/2022	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL - 1ª ETAPA.	R\$ 1.177.707,60
	TERRA SANTA	78/2022	REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO ESTÁDIO MUNICIPAL.	R\$ 841.207,95
TOTAL				R\$ 20.229.911,31

Nestes municípios, foram celebrados convênios de Cooperação Técnica com a Sedop, a qual tem como obrigação principal a transferência dos recursos para as prefeituras, as quais são as responsáveis pela consecução do objeto pactuado no convênio. As obras foram iniciadas no segundo semestre e encontram-se com a evolução em conformidade com o cronograma físico e financeiro, com conclusão prevista para 2023.

No que diz respeito à execução financeira, o valor de R\$ 10.250.000,00¹ programado para atender a Região Baixo Amazonas, foi acrescido de R\$ 19.595.271,43 totalizando o valor de R\$ 29.845.271,43².

É necessário esclarecer que parte desta divergência *Orçamento Planejado X Orçamento Executado*, deve-se à limitação do Teto Orçamentário disponibilizado para a Sedop, o qual é insuficiente para a real necessidade de execução das obras programadas e, parte, ao atendimento de demandas que não constavam na programação orçamentária referente à execução de obras para o ano de 2022, elaborada pela área técnica.

Diante do exposto e considerando que a meta física estabelecida não foi alcançada, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7659. Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer* na Região do Baixo Amazonas, no decorrer do ano de 2022, encerra o atual exercício com o status *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO CARAJÁS

MUNICÍPIOS DEMANDA ESPONTÂNEA: BOM JESUS DO TOCANTINS E SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

PRODUTO	EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO	UNIDADE	UN	META 2022	AÇÃO NÃO PLANEJADA PARA ESTA REGIÃO.
----------------	---------------------------	----------------	----	------------------	---

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Embora a Região do Carajás não tenha sido contemplada nos instrumentos de planejamento da Sedop para a Ação 7659. *Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer* em 2022, houve execução de obras em Bom Jesus do Tocantins e São João do Araguaia.

Estes municípios, apesar de não terem sido programados pelo planejamento da Sedop, para o ano de 2022, foram atendidos com recursos oriundos de Demandas Governamentais ou Emendas Parlamentares para a execução das mais variadas obras.

Para melhor entendimento, as principais informações referentes a estas obras encontram-se consolidadas na tabela abaixo:

Nº	MUNICÍPIO	Nº CONVÊNIO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR GLOBAL
1	BOM JEUS DO TOCANTINS	234/2022	CONSTRUÇÃO DE QUADRA SOCIETY.	R\$ 300.755,94
2	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	133/2022	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA VILA APINAGÉS.	R\$ 266.226,80
	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	187/2022	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA VILA JOSÉ MARTINS FERREIRA.	R\$ 284.917,58
TOTAL				R\$ 851.900,32

Nestes municípios, foram celebrados convênios de Cooperação Técnica com a Sedop, a qual tem como obrigação principal a transferência dos recursos para as Prefeituras Municipais, enquanto que estas são as responsáveis pela consecução do objeto pactuado no convênio. As obras foram iniciadas no segundo semestre e encontram-se com a evolução em conformidade com o cronograma físico e financeiro, com conclusão prevista para 2023.

Quanto à execução financeira, como nesta região não estava previsto o desenvolvimento da ação, não houve orçamento programado para o exercício de 2022. No entanto, para o atendimento destas obras a dotação, que até então não existia, precisou ser atualizada em R\$ 368.298,30¹, valor necessário para o início das obras.

Diante do exposto, o desempenho físico e financeiro da Ação 7659. *Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer* na Região Carajás, no decorrer do ano de 2022, encerra o atual exercício com o status *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO GUAJARÁ

MUNICÍPIO PLANEJADO: BELÉM

PRODUTO	EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO	UNIDADE	UN	META 2022	01 EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO
----------------	-------------------------------	----------------	-----------	------------------	----------------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Na Região do Guajará, foi programado o desenvolvimento da *Ação 7659. Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer* no município de Belém com a execução da obra “*Reforma Geral do Estádio Olímpico do Pará - Mangueirão*”. Entretanto, por se tratar de projeto prioritário, as informações sobre sua evolução, no decorrer de 2022, encontram-se no Capítulo II deste Relatório de Gestão.

Além deste projeto prioritário no município de Belém, outros municípios que, apesar de não terem sido programados nos instrumentos de planejamento da Sedop para o ano de 2022, foram atendidos por esta ação governamental na Região Guajará. Estes municípios foram beneficiados com recursos oriundos de Demandas Governamentais ou Emendas Parlamentares para a execução das mais variadas obras.

Para melhor entendimento, as principais informações referentes a estas obras encontram-se consolidadas na tabela abaixo:

Nº	MUNICÍPIO	Nº CONVÊNIO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR GLOBAL
1	BENEVIDES	210/2022	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ DE BENFICA.	R\$ 429.059,91
2	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	194/2022	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO GASTRONÔMICO DO PAU D'ARCO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ/PA.	R\$ 739.332,71
TOTAL				R\$ 1.168.392,62

Nestes municípios, foram celebrados convênios de Cooperação Técnica com a Sedop, a qual tem como obrigação principal a transferência dos recursos para as Prefeituras Municipais, enquanto que estas são as responsáveis pela consecução do objeto pactuado no convênio. As obras foram iniciadas no segundo semestre e encontram-se com a evolução em conformidade com o cronograma físico e financeiro, com conclusão prevista para 2023.

No que diz respeito à execução financeira, o valor de R\$ 43.439.326,00¹ programado para atender a Região Guajará, foi acrescido de R\$ 303.470.151,39, atualizando o valor para R\$ 346.909.477,39².

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

É necessário esclarecer que parte desta divergência *Orçamento Planejado X Orçamento Executado*, deve-se à limitação do Teto Orçamentário disponibilizado para a Sedop, o qual é insuficiente para a real necessidade de execução das obras programadas e, parte, ao atendimento de demandas que não constavam na programação orçamentária referente à execução de obras para o ano de 2022, elaborada pela área técnica.

Diante do exposto e considerando que a meta física estabelecida não foi alcançada, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7659. Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer* na Região Guajará, encerra o atual exercício de 2022 com o status *Abaixo do Esperado*.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO GUAMÁ

MUNICÍPIOS DEMANDA ESPONTÂNEA: CASTANHAL, IGARAPÉ-AÇU, MAGALHÃES BARATA, MARAPANIM E SANTA IZABEL DO PARÁ

PRODUTO	EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO	UNIDADE	UN	META 2022	AÇÃO NÃO PLANEJADA PARA ESTA REGIÃO.
----------------	------------------------	----------------	----	------------------	--------------------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Embora a Região Guamá não tenha sido contemplada nos instrumentos de planejamento da Sedop para implementação da *Ação 7659. Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer* em 2022, houve execução de obras nos municípios de Castanhal, Igarapé-Açu, Magalhães Barata e Santa Izabel do Pará.

Estes municípios, apesar de não terem sido programados nos instrumentos de planejamento da Sedop para o ano de 2022, foram atendidos por esta ação governamental com recursos oriundos de Demandas Governamentais ou Emendas Parlamentares para a execução das mais variadas obras.

Para melhor entendimento, as principais informações referentes a estas obras encontram-se consolidadas na tabela abaixo:

Nº	MUNICÍPIO	Nº CONVÊNIO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR GLOBAL
1	CASTANHAL	156/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO DO NOVO ESTRELA.	R\$ 429.489,15
	CASTANHAL	083/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DO JADERLÂNDIA.	R\$ 606.323,59
2	IGARAPÉ-AÇU	237/2022	REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO PAU CHEIROSO.	R\$ 4.028.599,65
3	MAGALHÃES BARATA	104/2022	CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA COBERTA.	R\$ 423.000,00
4	SANTA IZABEL DO PARÁ	280/2022	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO MANOEL SILVA.	R\$ 3.550.435,45
TOTAL				R\$ 9.037.847,84

Nestes municípios, foram celebrados Convênios de Cooperação Técnica com a Sedop, a qual tem como obrigação principal a transferência dos recursos para as Prefeituras Municipais, enquanto que estas são as responsáveis pela consecução do objeto pactuado no convênio. As obras foram iniciadas no segundo semestre e encontram-se com a evolução em conformidade com o cronograma físico e financeiro, com conclusão prevista para 2023.

Com relação ao município de Marapanim, trata-se da obra de *“Construção de Palco e Área para Atividades Físicas e Conclusão da Obra das Arenas Esportivas”* a qual está sendo executada

através do contrato nº 101/2022, apresentando evolução física em conformidade com o cronograma físico e financeiro da obra. A previsão é que a obra seja concluída no ano de 2023.

Quanto à execução financeira, a dotação inicial que aparece no sistema SigPlan – Monitoramento orçada em R\$ 3.250.000,00¹ refere-se as obras de emendas parlamentares, as quais, apesar de não terem sido programadas pela Sedop, foram inseridas pela Seplad no momento da aprovação do orçamento programado para o ano de 2022. Para atendimento das obras relacionadas aos convênios supracitados, houve execução financeira no valor de R\$ 3.613.779,25², valor necessário para o início das obras.

Diante do exposto, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7659. Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer* na Região Guamá, no decorrer do ano de 2022, encerra o atual exercício com o status *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO LAGO DE TUCURUÍ

MUNICÍPIOS DEMANDA ESPONTÂNEA: BREU BRANCO, GOIANÉSIA DO PARÁ E ITUPIRANGA

PRODUTO	EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO	UNIDADE	UN	META 2022	AÇÃO NÃO PLANEJADA PARA ESTA REGIÃO.
---------	------------------------	---------	----	-----------	--------------------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Embora a Região Lago de Tucuruí não tenha sido contemplada nos instrumentos de planejamento da Sedop para implementação da *Ação 7659. Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer em 2022*, houve execução de obras nos municípios de Breu Branco, Goianésia do Pará e Itupiranga.

Estes municípios, apesar de não terem sido programados nos instrumentos de planejamento da Sedop para o ano de 2022, foram atendidos por esta ação governamental com recursos oriundos de Demandas Governamentais ou Emendas Parlamentares para a execução das mais variadas obras. Para melhor entendimento, as principais informações referentes a estas obras encontram-se consolidadas na tabela abaixo:

Nº	MUNICÍPIO	Nº CONVÊNIO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR GLOBAL
1	BREU BRANCO	242/2022	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO ISMAR I E II.	R\$ 373.509,11
	BREU BRANCO	107/2022	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE SANTA CATARINA.	R\$ 267.829,52
2	GOIANÉSIA DO PARÁ	36/2022	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA VILA PORTO NOVO.	R\$ 498.769,31
	GOIANÉSIA DO PARÁ	87/2022	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALMIR GABRIEL.	R\$ 726.330,90
3	ITUPIRANGA	245/2022	REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO.	R\$ 1.851.646,11
TOTAL				R\$ 3.718.084,95

Nestes municípios, foram celebrados Convênios de Cooperação Técnica com a Sedop, a qual tem como obrigação principal a transferência dos recursos para as Prefeituras Municipais, enquanto que estas são as responsáveis pela consecução do objeto pactuado no convênio. As obras foram iniciadas no segundo semestre e encontram-se com a evolução em conformidade com o cronograma físico e financeiro, com conclusão prevista para 2023.

Quanto à execução financeira, como nesta região não estava previsto o desenvolvimento da ação, não houve orçamento programado para o exercício de 2022. No entanto, para o

atendimento destas obras a dotação, que até então não existia, precisou ser atualizada em R\$ 1.572.112,94¹, valor necessário para o início das obras.

Diante do exposto, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7659. Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer* na Região Lago de Tucuruí, no decorrer do ano de 2022, encerra o atual exercício com o status *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO MARAJÓ

MUNICÍPIOS DE DEMANDA ESPONTÂNEA: SANTA CRUZ DO ARARAI, SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.

PRODUTO	EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO	UNIDADE	UN	META 2022	AÇÃO NÃO PLANEJADA PARA ESTA REGIÃO.
---------	------------------------	---------	----	-----------	--------------------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Embora a Região Marajó não tenha sido contemplada nos instrumentos de planejamento da Sedop para implementação da *Ação 7659. Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer* em 2022, houve execução de obras nos municípios de Santa Cruz do Arari e São Sebastião da Boa Vista.

Estes municípios, apesar de não terem sido programados nos instrumentos de planejamento da Sedop para o ano de 2022, foram atendidos por esta ação governamental com recursos oriundos de Demandas Governamentais ou Emendas Parlamentares para a execução das mais variadas obras.

As informações referentes a estas obras encontram-se consolidadas na tabela abaixo:

Nº	MUNICÍPIO	Nº CONVÊNIO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR GLOBAL
1	SANTA CRUZ DO ARARI	43/2022	REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL.	R\$ 1.523.600,66
2	SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA	113/2022	REFORMA DO PRÉDIO DO GINÁSIO DE ESPORTE JOÃO PAULO II.	R\$ 2.450.626,00
TOTAL				R\$ 3.974.226,66

Nestes municípios, foram celebrados convênios de Cooperação Técnica com a Sedop, a qual tem como obrigação principal a transferência dos recursos para as prefeituras, as quais são as responsáveis pela consecução do objeto pactuado no convênio. As obras foram iniciadas no segundo semestre e encontram-se com a evolução em conformidade com o cronograma físico e financeiro, com conclusão prevista para 2023.

Quanto à execução financeira, como nesta região não estava previsto o desenvolvimento da ação, não houve orçamento programado para o exercício de 2022. No entanto, para o atendimento destas obras a dotação, que até então não existia, precisou ser atualizada em R\$ 658.704,79¹, valor necessário para o início das obras.

Diante do exposto, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7659. Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer* na Região Marajó, no decorrer do ano de 2022, encerra o atual exercício com o status *Abaixo do Esperado*

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO RIO CAETÉ

MUNICÍPIOS DE DEMANDA ESPONTÂNEA: AUGUSTO CORRÊA, BONITO, QUATIPURU, SALINÓPOLIS, SANTARÉM NOVO E VISEU.

PRODUTO	EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO	UNIDADE	UN	META 2022	AÇÃO NÃO PLANEJADA PARA ESTA REGIÃO.
----------------	------------------------	----------------	----	------------------	--------------------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Embora a Região Rio Caeté não tenha sido contemplada nos instrumentos de planejamento da Sedop para implementação da *Ação 7659. Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer* em 2022, houve execução de obras nos municípios de Augusto Corrêa, Bonito, Quatipuru, Salinópolis, Santarém Novo e Viseu.

Estes municípios, apesar de não terem sido programados nos instrumentos de planejamento da Sedop para o ano de 2022, foram atendidos por esta ação governamental com recursos oriundos de Demandas Governamentais ou Emendas Parlamentares para a execução das mais variadas obras.

Para melhor entendimento, as principais informações referentes a estas obras encontram-se consolidadas na tabela abaixo:

Nº	MUNICÍPIO	Nº CONVÊNIO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR GLOBAL
1	AUGUSTO CORRÊA	13/2022	CONSTRUÇÃO DE ARENA ESPORTIVA.	R\$ 387.046,73
2	BONITO	211/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL MARCOS VINÍCIUS.	R\$ 1.233.976,75
3	QUATIPURU	53/2022	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO COM 01 ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO, BAIRRO VITAUÂNDIA E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM 01 ARQUIBANCADA E SEM COBERTURA, NO DISTRITO DE BOA VISTA.	R\$ 607.468,46
4	SALINÓPOLIS	223/2022	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO PRAÇA JAIR MAIA DOS SANTOS.	R\$ 1.618.995,76
5	SANTARÉM NOVO	29/2022	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO.	R\$ 1.397.488,05
TOTAL				R\$ 5.244.975,75

Nestes municípios, foram celebrados Convênios de Cooperação Técnica com a Sedop, a qual tem como obrigação principal a transferência dos recursos para as Prefeituras Municipais, enquanto que estas são as responsáveis pela consecução do objeto pactuado no convênio. As obras foram iniciadas no segundo semestre e encontram-se com a evolução em conformidade com o cronograma físico e financeiro, com conclusão prevista para 2023.

Com relação ao município de Viseu, trata-se da obra de *“Execução dos Serviços de Revitalização do Ginásio Jarbas Passarinho”* a qual está sendo executada através do contrato nº

18/2022, apresentando evolução física em conformidade com o cronograma físico e financeiro da obra. A previsão é que a obra seja concluída no ano de 2023.

Quanto à execução financeira, a dotação inicial que aparece no sistema SigPlan – Monitoramento orçada em R\$ 600.000,00¹ refere-se à obra de emenda parlamentar, a qual, apesar de não ter sido programada pela Sedop, foi inserida pela Seplad no momento da aprovação do orçamento programado para o ano de 2022.

Para atendimento das obras relacionadas aos convênios supracitados, houve necessidade de majorar este valor em R\$ 1.981.334,10 atualizando a dotação inicial desta ação para R\$ 2.581.334,10², valor necessário para o início das obras.

Diante do exposto, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7659. Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer* na Região Rio Caeté, no decorrer do ano de 2022, encerra o atual exercício com o status *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO RIO CAPIM

MUNICÍPIOS DEMANDA ESPONTÂNEA: AURORA DO PARÁ, IPIXUNA, NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, OURÉM E ULIANÓPOLIS.

PRODUTO	EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO	UNIDADE	UN	META 2022	AÇÃO NÃO PLANEJADA PARA ESTA REGIÃO.
----------------	---------------------------	----------------	----	------------------	---

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Embora a Região Rio Capim não tenha sido contemplada nos instrumentos de planejamento da Sedop para implementação da *Ação 7659. Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer* em 2022, houve execução de obras nos municípios de Aurora do Pará, Ipixuna, Nova Esperança do Piriá, Ourém e Ulianópolis.

Estes municípios, apesar de não terem sido programados nos instrumentos de planejamento da Sedop para o ano de 2022, foram atendidos por esta ação governamental com recursos oriundos de Demandas Governamentais ou Emendas Parlamentares para a execução das mais variadas obras.

No segundo semestre de 2022 foi entregue a praça Tobias Soares de Pinho construída em Aurora do Pará, na Vila Fátima. Com mais de 1.700 m², o espaço dispõe de quadra de esportes, brinquedos, bancos, paisagismo e iluminação. O Estado investiu mais de R\$ 400 mil na obra, que proporciona mais qualidade de vida aos moradores.

Para melhor entendimento, as principais informações referentes às obras de esporte e lazer da Região Rio Capim encontram-se consolidadas na tabela abaixo:

Nº	MUNICÍPIO	Nº CONVÊNIO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR GLOBAL
1	AURORA DO PARÁ	33/2022	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO KM 75, NA COMUNIDADE VILA FÁTIMA.	R\$ 413.292,85
	AURORA DO PARÁ	159/2022	REFORMA DA PRAÇA DA COMUNIDADE VILA NOVA.	R\$ 372.579,93
2	IPIXUNA DO PARÁ	256/2022	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CANAÃ.	R\$ 345.043,67
3	NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ	09/2022	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL NO BAIRRO CIDADE NOVA.	R\$ 424.135,28
4	OURÉM	173/2022	CONSTRUÇÃO DE UMA ARENA ESPORTIVA, BAIRRO MACHADÃO.	R\$ 294.433,43
5	ULIANÓPOLIS	19/2022	EXECUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA COBERTA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO IZABEL AMAZONAS,	R\$ 1.195.985,35
TOTAL				R\$ 3.045.470,51

Nestes municípios, foram celebrados convênios de Cooperação Técnica com a Sedop, a qual tem como obrigação principal a transferência dos recursos para as Prefeituras Municipais, enquanto que estas são as responsáveis pela consecução do objeto pactuado no convênio. As

obras foram iniciadas no segundo semestre e encontram-se com a evolução em conformidade com o cronograma físico e financeiro, com conclusão prevista para 2023.

Quanto à execução financeira, como nesta região não estava previsto o desenvolvimento da ação, não houve orçamento programado para o exercício de 2022. No entanto, para o atendimento destas obras a dotação, que até então não existia, precisou ser atualizada para R\$ 2.156.500,06¹, valor necessário para o início das obras.

Diante do exposto, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7659. Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer* na Região Rio Capim, no decorrer do ano de 2022, encerra o atual exercício com o status *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TAPAJÓS

MUNICÍPIOS DEMANDA ESPONTÂNEA: AVEIRO, E NOVO PROGRESSO.

PRODUTO	EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO	UNIDADE	UN	META 2022	AÇÃO NÃO PLANEJADA PARA ESTA REGIÃO.
----------------	-----------------------------------	----------------	-----------	------------------	---

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Embora a Região Tapajós não tenha sido contemplada nos instrumentos de planejamento da Sedop para implementação da *Ação 7659. Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer* em 2022, houve execução de obras nos municípios Aveiro e Novo Progresso.

Estes municípios, apesar de não terem sido programados no planejamento da Sedop para o ano de 2022, foram atendidos por esta ação governamental com recursos oriundos de demandas governamentais ou emendas parlamentares para a execução das mais variadas obras.

As informações referentes a estas obras encontram-se consolidadas na tabela abaixo:

Nº	MUNICÍPIO	Nº CONVÊNIO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR GLOBAL
1	AVEIRO	155/2022	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA.	R\$ 454.715,80
2	NOVO PROGRESSO	204/2022	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SANTA JÚLIA	R\$ 420.348,05
	NOVO PROGRESSO	205/2022	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DA PRAÇA RUI PIRES DE LIMA.	R\$ 365.635,34
	NOVO PROGRESSO	206/2022	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DA PRAÇA JUCELÂNDIA.	R\$ 507.186,01
TOTAL				R\$ 1.747.885,20

Nestes municípios, foram celebrados Convênios de Cooperação Técnica com a Sedop, a qual tem como obrigação a transferência dos recursos para as Prefeituras, e estas são as responsáveis pela consecução do objeto. As obras foram iniciadas e encontram-se com a evolução conforme o cronograma físico e financeiro, com conclusão prevista para 2023.

Quanto à execução financeira, como nesta região não estava previsto o desenvolvimento da ação, não houve orçamento programado para o exercício de 2022. No entanto, para o atendimento destas obras a dotação, que até então não existia, precisou ser atualizada para R\$ 322.150,55¹, valor necessário para o início das obras.

Diante do exposto, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7659. Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer* na Região Tapajós, no decorrer do ano de 2022, encerra o atual exercício com o status *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS					
MUNICÍPIO DE DEMANDA ESPONTÂNEA: BARCARENA.					
PRODUTO	EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO	UNIDADE	UN	META 2022	AÇÃO NÃO PLANEJADA PARA ESTA REGIÃO.

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Embora a Região Tocantins não tenha sido contemplada nos instrumentos de planejamento da Sedop para implementação da *Ação 7659. Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer* em 2022, houve execução de obra no município Barcarena. Trata-se de uma obra referente a “Construção de uma Quadra Poliesportiva”, iniciada no ano de 2021 e concluída no exercício atual.

Quanto à execução financeira, como nesta região não estava previsto o desenvolvimento da ação, não houve orçamento programado para o exercício de 2022. No entanto, para o atendimento desta obra a dotação, que até então não existia, precisou ser atualizada para R\$ 157.450,72¹, valor relacionado ao pagamento da obra.

Finalizando, mesmo com a conclusão da quadra poliesportiva, obtendo-se assim o produto de *Um Equipamento Construído*, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7659. Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer* na Região Tocantins, encerra o exercício de 2022 com o status Abaixo do Esperado.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO XINGU

MUNICÍPIOS DE DEMANDA ESPONTÂNEA: ALTAMIRA, ANAPU, BRASIL NOVO, MEDICILÂNDIA, PACAJÁ, PLACAS, PORTO DE MOZ

PRODUTO	EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO	UNIDADE	UN	META 2022	AÇÃO NÃO PLANEJADA PARA ESTA REGIÃO.
----------------	------------------------	----------------	----	------------------	--------------------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Embora a Região do Xingu não tenha sido contemplada nos instrumentos de planejamento da Sedop para implementação da Ação 7659. *Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer* em 2022, houve execução de obras nos municípios de Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Placas e Porto De Moz.

Estes municípios, apesar de não terem sido programados nos instrumentos de planejamento da Sedop para o ano de 2022, foram atendidos por esta ação governamental com recursos oriundos de demandas governamentais ou emendas parlamentares para a execução das mais variadas obras. Para melhor entendimento, as principais informações referentes a estas obras encontram-se consolidadas na tabela abaixo:

Nº	MUNICÍPIO	Nº CONVÊNIO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR GLOBAL
1	ALTAMIRA	202/2022	REFORMA DA ESCOLA DE DANÇA.	R\$ 282.898,60
2	ANAPU	25/2022	EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA VILA SURUBIM, ZONA RURAL.	R\$ 266.991,01
	ANAPU	38/2022	REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO LUÍS COM EXECUÇÃO DE PLAYGROUND, ACADEMIA AO LIVRE E EXECUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO.	R\$ 460.388,98
	ANAPU	177/2022	ILUMINAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL.	R\$ 341.054,33
3	BRASIL NOVO	69/2022	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA.	R\$ 1.550.855,70
	BRASIL NOVO	44/2022	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA SANTOS DUMONT NA VICINAL.	R\$ 491.506,44
4	MEDICILÂNDIA	238/2022	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA DA AGROVILA JORGE BUENO.	R\$ 439.385,94
	MEDICILÂNDIA	72/2022	EXECUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA.	R\$ 197.260,48
5	PACAJÁ	23/2021	IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO DO ALTO BONITO NO MUNICÍPIO DE PACAJÁ, CONTENDO QUADRA POLIESPORTIVA COM ALAMBRADO, BANHEIRO PÚBLICO, PLAYGROUND E 3 QUIOSQUES	R\$ 1.305.987,70
6	PLACAS	16/2021	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA.	R\$ 919.862,67
7	PORTO DE MOZ	32/2021	CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA.	R\$ 5.314.702,67
TOTAL				R\$ 11.570.894,52

Nestes municípios, foram celebrados Convênios de Cooperação Técnica com a Sedop, a qual tem como obrigação principal a transferência dos recursos para as Prefeituras Municipais, enquanto que estas são as responsáveis pela consecução do objeto pactuado no convênio.

Com exceção das obras relacionadas aos convênios celebrados em 2021, as demais foram iniciadas no segundo semestre de 2022 e encontram-se com a evolução em conformidade com o cronograma físico e financeiro, com conclusão prevista para 2023.

Quanto à execução financeira, como nesta região não estava previsto o desenvolvimento da ação, não houve orçamento programado para o exercício de 2022. No entanto, para o atendimento destas obras a dotação, que até então não existiam, precisou ser atualizada para R\$ 4.295.153,23¹, valor necessário para o início das obras.

Diante do exposto, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7659. Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer na Região Xingu*, no decorrer do ano de 2022, encerra o atual exercício com o status *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

2.3.4. PROGRAMA GOVERNANÇA PÚBLICA

2.3.4.1. CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS ESTADUAIS

REGIÃO DA INTEGRAÇÃO GUAJARÁ					
MUNICÍPIO PLANEJADO: BELÉM					
PRODUTO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2022	1 OBRA REALIZADA

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Em 2022, o desenvolvimento da *Ação 7552. Construção e Conservação de imóveis Públicos Estaduais* na Região Guajará teve como programação a execução da obra *“Reforma, Ampliação e Adequação do Prédio da Seplad”* no município de Belém, a qual segue em execução com conclusão prevista para 2023.

Além desta obra, no decorrer do ano de 2022, a Sedop atendeu várias demandas relacionadas à execução de obras e elaboração de projetos no município de Belém. Para melhor entendimento, a descrição destas obras encontra-se consolidada na tabela abaixo:

Nº	MUNICÍPIO	Nº CONTRATO	DESCRIÇÃO DO OBJETO
1	BELÉM	58/021	CONSTRUÇÃO DE SUBSEÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E CAPTURA (SSIC) DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO GSD- BE NA ALA 9.
	BELÉM	59/2022	CONSTRUÇÃO DE ANEXOS PARA 1º COMANDO AÉREO REGIONAL - CANIL GSD - ALA 9
	BELÉM	81/2021	INSTALAÇÃO DE TANQUES DE COMBUSTÍVEIS MODELOS SKID NO GAP-BE PARA ATENDIMENTO DE TODA A GUARNAER-BE.
	BELÉM	37/2021	CONSTRUÇÃO DE SALAS DOS NOBREKS E PASSARELAS, INCLUINDO DRENAGEM LATERAL NO INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ- ITERPA.
	BELÉM	72/2021	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO NO HOSPITAL OPHIR LOYOLA.
	BELÉM	107/2021	ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO PARÁ.
	BELÉM	58/2022	ELABORAÇÃO DE PROJETO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM.

No que diz respeito à meta física, a conclusão das obras *“Construção e urbanização de espaços de espaços físicos do Instituto de Terras do Pará – ITERPA”* e *“Serviços da Obra de Escoramento Metálico da Fachada de Imóvel, Localizado na Rua 13 de Maio Nº 89”* possibilitaram a obtenção de 02 Obras Realizadas na Região Guajará no ano de 2022.

Com relação à execução financeira, do valor programado de R\$ 14.500.000,00¹ para atender a Região Guajará, foram utilizados R\$ 8.779.076,37², o que corresponde a cerca de 60% do orçamento programado.

Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7552. Construção e Conservação de imóveis Públicos Estaduais* na Região Guajará encerra o exercício de 2022 com status de *Conforme Programado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO RIO CAPIM					
MUNICÍPIO DE DEMANDA ESPONTÂNEA: OURÉM					
PRODUTO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2022	AÇÃO NÃO PLANEJADA PARA ESTA REGIÃO.

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Embora a Região Rio Capim não tenha sido contemplada nos instrumentos de planejamento da Sedop para implementação da *Ação 7552. Construção e Conservação de imóveis Públicos Estaduais* em 2022, houve execução de obra no município de Ourém. Trata-se da obra de “*Construção de Muro de Proteção e Calçada no Entorno do Terreno da Cosanpa*” a qual foi iniciada e concluída em 2022.

Quanto à execução financeira, como nesta região não estava previsto o desenvolvimento da ação, não houve orçamento programado para o exercício de 2022. No entanto, para o atendimento desta obra, a dotação, que até então não existia, precisou ser atualizada em R\$ 313.274,49¹, valor necessário para o desenvolvimento da obra.

Por fim, considerando que, por mais que não tenha sido programada, foi realizado 01 obra na Região Rio Capim, o que corrobora para que o desempenho físico da *Ação 7552. Construção e Conservação de imóveis Públicos Estaduais* encerre o exercício de 2022 com o status *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

2.3.4.2. APOIO À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS DE UTILIZAÇÃO PÚBLICA

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO ARAGUAIA					
MUNICÍPIOS DE DEMANDAS ESPONTÂNEAS: BANNACH, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, XINGUARA.					
PRODUTO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2022	AÇÃO NÃO PLANEJADA PARA ESTA REGIÃO.

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Embora a Região Araguaia não tenha sido contemplada nos instrumentos de planejamento da Sedop para implementação da *Ação 7556. Apoio à construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública* em 2022, houve execução de obras nos municípios de Bannach, Conceição do Araguaia e Xinguara.

Estes municípios, apesar de não terem sido programados nos instrumentos de planejamento da Sedop para o ano de 2022, foram atendidos por esta ação governamental com recursos oriundos de Demandas Governamentais ou Emendas Parlamentares, para a execução das mais variadas obras.

Para melhor entendimento, as principais informações referentes a estas obras encontram-se consolidadas na tabela abaixo:

Nº	MUNICÍPIO	Nº CONVÊNIO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR GLOBAL
1	BANNACH	217/2022	CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO NA VILA DA PISTA BRANCA.	R\$ 236.971,85
2	CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	55/2018	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA COM 1.065,91M ² .	R\$ 1.232.293,60
TOTAL				R\$ 1.469.265,45

Nestes municípios, foram celebrados Convênios de Cooperação Técnica com a Sedop, a qual tem como obrigação principal a transferência dos recursos para as Prefeituras Municipais, enquanto que estas são as responsáveis pela consecução do objeto pactuado no convênio. As obras encontram-se com a evolução em conformidade com o cronograma físico e financeiro, com conclusão prevista para 2023.

Com relação ao município de Xinguara, trata-se da obra de *“Reforma e Ampliação da Câmara”* a qual foi concluída de entregue em 2022. Com a conclusão desta obra, o produto relacionado a esta ação governamental pôde ser obtido, contribuindo desta forma para a obtenção da meta física na Região Araguaia.

Quanto à execução financeira, a dotação inicial que aparece no sistema SigPlan – Monitoramento, orçada em R\$ 600.000,00¹, refere-se à obra de emenda parlamentar, a qual, apesar de não ter sido programada pela Sedop, foi inserida pela Seplad no momento da aprovação do orçamento programado para o ano de 2022. Para atendimento das obras supracitadas, houve necessidade de utilizar cerca de 45% da dotação inicial desta ação, o que corresponde a R\$ 267.091,09².

Por fim, considerando que, por mais que não tenha sido programada, foi realizado 01 obra na Região Araguaia, o que corrobora para que o desempenho físico da *Ação 7556. Apoio à construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública* encerre o atual exercício com o status *Conforme Programado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO BAIXO AMAZONAS

MUNICÍPIOS PLANEJADOS: ALMEIRIM, CURUÁ, JURUTI, MONTE ALEGRE, SANTARÉM.

PRODUTO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2022	05 OBRAS REALIZADAS.
----------------	-----------------------	----------------	-----------	------------------	-----------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Na Região Baixo Amazonas foi programado o desenvolvimento da *Ação 7556. Apoio à construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública* nos municípios de Almeirim, Curuá, Juruti, Monte Alegre e Santarém. No que diz respeito ao município de Santarém, a obra correspondente trata-se de Projeto Prioritário. Sendo assim, as informações sobre a evolução física da obra no decorrer do ano de 2022, encontram-se no Capítulo II deste Relatório de Gestão.

No município de Almeirim, a obra “*Construção de Praça Pública*”, que até então era executada com recursos oriundo da Caixa, após sua retomada no ano de 2021, passou a ser custeada exclusivamente com recursos do Tesouro Estadual. A obra segue em execução com previsão de conclusão para o ano de 2023.

Em Curuá, a obra permanece com o status inalterado desde o ano de 2021, sem expectativa de retomada dos serviços devido inviabilidade do desenvolvimento do projeto na área planejada. No que diz respeito ao município de Juruti, a obra encontra-se em fase de mobilização e previsão de medição até dezembro de 2022.

O município de Monte Alegre teve a obra “*Construção de Praça Pública*” concluída no segundo semestre de 2021, sendo mantida no planejamento orçamentário do ano de 2022 para regularização de pendências financeiras.

Além dos municípios planejados, na Região Baixo Amazonas, o município de Santarém foi atendido através de demanda espontânea com recursos oriundos de Demandas Governamentais. Para melhor entendimento, as principais informações referentes à obra encontram-se consolidada na tabela abaixo:

Nº	MUNICÍPIO	Nº CONVÊNIO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR GLOBAL
1	SANTARÉM	175/2022	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO SANTÍSSIMO.	R\$ 226.827,02
TOTAL				R\$ 226.827,02

Em Santarém, foi celebrado Convênio de Cooperação Técnica com a Sedop, a qual tem como obrigação principal a transferência dos recursos para a Prefeitura Municipal, enquanto que esta é responsável pela consecução do objeto pactuado no convênio. A obra encontra-se com a

evolução em conformidade com o cronograma físico e financeiro, com conclusão prevista para 2023.

No que diz respeito ao desempenho financeiro, do orçamento programado para atender a *Ação 7556. Apoio à construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública*, no valor de R\$ 16.565.850,00¹, foram utilizados cerca de R\$ 210.788,18² para o pagamento das obras executadas. Vale ressaltar que o valor programado para 2022, tinha como referência à execução do Compromisso Regional “*Conclusão do Hospital Materno Infantil de Santarém*”, cuja obra não teve a evolução esperada.

Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7556. Apoio à construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública* na Região Baixo Amazonas encerra o exercício de 2022 com status de *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO - DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO - DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO GUAJARÁ					
MUNICÍPIOS PLANEJADOS: ANANINDEUA E BELÉM.					
PRODUTO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2022	2 OBRAS REALIZADAS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Na Região Guajará foi programado o desenvolvimento da *Ação 7556. Apoio à construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública* nos municípios de Ananindeua com a execução da obra “*Construção do Mercado Icuí-Gujará*” e Belém com obra de “*Reforma e Revitalização de Praças Públicas*”.

Em Ananindeua, não houve avanço da obra em 2022, permanecendo, portanto, as informações prestadas no Relatório de Gestão – 2021, ou seja, o projeto encontra-se em fase de reprogramação para posterior início de processo licitatório pela Prefeitura.

No município de Belém, a obra “*Reforma e Revitalização de Praças Públicas*” segue em execução com previsão de término para o ano de 2023. Além das obras programadas, em 2022, os mesmos municípios foram atendidos com a continuidade de outras obras. São elas:

- No Município de Ananindeua:
 - Reforma e Ampliação da Câmara Municipal;
 - Construção do mercado e Revitalização da Praça das Águas Lindas.
- No Município de Belém:
 - Construção de rede Coletora, ETE e Drenagem do Projeto Terpaz – Usina da Paz Bengui;
 - Contratação de empresa especializada para efetivação de obras de serviços de reforma de Praças - Praça Canal da Antônio Baena - LOTE 03.

No que diz respeito ao objeto “*Implantação de Rede Coletora, ETE e Drenagem Do Projeto Terpaz*”, em 2022, houve apenas movimentação financeira, o mesmo é referente a reequilíbrio e indenização de serviços, pois o contrato foi vencido por decurso de prazo. Quanto à “*Contratação de empresa especializada para efetivação de obras de serviços de reforma de Praças - Praça Canal da Antônio Baena - LOTE 03*”, a obra foi iniciada no primeiro semestre de 2021 e concluída em 2022.

Com relação à execução financeira, o valor programado de R\$ 1.076.111,00¹ para atender a Região Guajará, foi acrescido de R\$ 3.475.917,92, totalizando o valor de R\$ 4.552.028,92². Esta divergência ocorre principalmente devido à limitação do teto orçamentário disponibilizado para a Sedop, o qual não traduz a real necessidade para a execução da obra.

Finalizando, considerando as informações apresentadas e considerando o cumprimento de 50% da meta estabelecida com *01 Obra realizada*, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7556. Apoio à construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública* na Região Guajará encerra o exercício de 2022 com status de *Merece Atenção*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO GUAMÁ					
MUNICÍPIOS DE DEMANDAS ESPONTÂNEAS: CURUÇÁ, MARACANÃ.					
PRODUTO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2022	AÇÃO NÃO PLANEJADA PARA ESTA REGIÃO.

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Embora a Região Guamá não tenha sido contemplada nos instrumentos de planejamento da Sedop para implementação da *Ação 7556. Apoio à construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública* em 2022, houve execução de obras nos municípios de Curuçá e Maracanã.

Com relação ao município de Curuçá, houve execução das seguintes obras: “*Construção de Rampa em Concreto Armado na Comunidade Lauro Sodré*” e “*Construção de Trapiche da Vila Murujá – Lote 02*”. As referidas obras seguem em execução com conclusão prevista para 2023.

No município de Maracanã, no ano de 2022 a movimentação financeira referente à obra de “*Reforma e Ampliação da Câmara Municipal*” refere-se à regularização de saldo de contrato, uma vez que a obra foi concluída em 2021.

Quanto à execução financeira, a dotação inicial que aparece no sistema SigPlan – Monitoramento orçada em R\$ 1.000.000,00¹ refere-se à obra de emenda parlamentar, a qual, apesar de não ter sido programada pela Sedop, foi inserida pela Seplad no momento da aprovação do orçamento programado para o ano de 2022. Para atendimento das obras supracitadas, houve necessidade de utilizar cerca de 60% da dotação inicial desta ação, o que corresponde a R\$ 603.146,55².

Por fim, conforme as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da *Ação 7556. Apoio à construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública* na Região Guamá encerra o exercício de 2022 com status de *Conforme Programado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO LAGO DE TUCURUÍ					
MUNICÍPIO DE DEMANDA ESPONTÂNEA: ITUPIRANGA					
PRODUTO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2022	AÇÃO NÃO PLANEJADA PARA ESTA REGIÃO.

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Embora a Região Lago de Tucuruí não tenha sido contemplada nos instrumentos de planejamento da Sedop para implementação da *Ação 7556. Apoio à construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública* em 2022, houve execução de obra no município de Itupiranga. Trata-se da “Construção do Mercado Municipal”, obra iniciada em 2021 e que segue em execução, com conclusão prevista para 2023.

Quanto à execução financeira, como nesta região não estava previsto o desenvolvimento da ação, não houve orçamento programado para o exercício de 2022. No entanto, para o atendimento da demanda governamental a dotação, que até então não existia, precisou ser atualizada para R\$ 536.096,79¹, valor necessário para o desenvolvimento da obra.

Finalizando, considerando o cenário apresentado, no decorrer do ano de 2022 a *Ação 7659. Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer* na Região Lago de Tucuruí, apresentou o desempenho físico e financeiro *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO MARAJÓ

MUNICÍPIO DE DEMANDA ESPONTÂNEA: CURRALINHO.

PRODUTO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2022	AÇÃO NÃO PLANEJADA PARA ESTA REGIÃO.
---------	----------------	---------	----	-----------	--------------------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Embora a Região Marajó não tenha sido contemplada nos instrumentos de planejamento da Sedop para implementação da *Ação 7556. Apoio à construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública* em 2022, houve execução de obra no município de Curralinho.

Sendo assim, foi celebrado Convênio de Cooperação Técnica entre a Prefeitura Municipal e a Sedop no valor de R\$ 1.007.070,94, cujo objeto refere-se à “*Construção da Praça da Bíblia*”. Cabe à Sedop garantir a transferência do recurso e à prefeitura, a consecução do objeto pactuado no convênio. A obra foi iniciada no segundo semestre e encontra-se com a evolução em conformidade com o cronograma físico e financeiro, com conclusão prevista para 2023.

Quanto à execução financeira, como nesta região não estava previsto o desenvolvimento da ação, não houve orçamento programado para o exercício de 2022. No entanto, para o atendimento da demanda governamental a dotação, que até então não existia, precisou ser atualizada para R\$ 135.000,00¹, valor necessário para o início da obra.

Finalizando, considerando o cenário apresentado, no decorrer do ano de 2022 a *Ação 7556. Apoio à construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública* na Região Marajó, apresentou o desempenho físico e financeiro *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO RIO CAPIM

MUNICÍPIOS DE DEMANDAS ESPONTÂNEAS: CONCÓRDIA DO PARÁ, NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, OURÉM, RONDON DO PARÁ, TOMÉ-AÇU.

PRODUTO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2022	AÇÃO NÃO PLANEJADA PARA ESTA REGIÃO.
---------	----------------	---------	----	-----------	--------------------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Embora a Região Rio Capim não tenha sido contemplada nos instrumentos de planejamento da Sedop para implementação da *Ação 7556. Apoio à construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública* em 2022, houve execução de obras nos municípios de Concórdia do Pará, Nova Esperança do Piriá, Ourém, Rondon do Pará e Tomé-Açu.

Estes municípios, apesar de não terem sido programados nos instrumentos de planejamento da Sedop para o ano de 2022, foram atendidos por esta ação governamental com recursos oriundos de Demandas Governamentais ou Emendas Parlamentares, para a execução das mais variadas obras.

Para melhor entendimento, as principais informações referentes a estas obras encontram-se consolidadas na tabela abaixo:

Nº	MUNICÍPIO	Nº CONVÊNIO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR GLOBAL
1	NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ	271/2022	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA VILA DO NOVO HORIZONTE.	R\$ 581.194,96
2	OURÉM	110/2022	CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA.	R\$ 1.312.420,87
	OURÉM	186/2022	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA MOCAMBO.	R\$ 171.470,53
3	RONDON DO PARÁ	124/2022	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA PAZ.	R\$ 754.823,93
TOTAL				R\$ 2.819.910,29

Nestes municípios, foram celebrados Convênios de Cooperação Técnica com a Sedop, a qual tem como obrigação principal a transferência dos recursos para as Prefeituras Municipais, enquanto que estas são as responsáveis pela consecução do objeto pactuado no convênio. As obras encontram-se com a evolução em conformidade com o cronograma físico e financeiro, com conclusão prevista para 2023.

No município de Concórdia do Pará, no ano de 2022 a movimentação financeira referente à obra de *“Revitalização do Mercado Municipal”* refere-se à regularização de saldo de contrato, uma vez que a obra foi concluída em 2021.

Com relação ao município de Tomé-Açu, trata-se da obra de “*Revitalização da Praça Forquilha*” a qual foi concluída de entregue em 2022. Com a conclusão desta obra, o produto relacionado a esta ação governamental pôde ser obtido, contribuindo desta forma para a obtenção da meta física na Região Rio Capim.

Quanto à execução financeira, como nesta região não estava previsto o desenvolvimento da ação, não houve orçamento programado para o exercício de 2022. No entanto, para o atendimento da demanda governamental a dotação, que até então não existia, precisou ser atualizada para R\$ 2.236.093,44¹, valor necessário para o desenvolvimento da obra.

Finalizando, considerando o cenário apresentado, no decorrer do ano de 2022 a *Ação 7556. Apoio à construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública* na Região Rio Capim, apresentou o desempenho físico e financeiro *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO TOCANTINS					
MUNICÍPIO DE DEMANDA ESPONTÂNEA: ACARÁ					
PRODUTO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2022	AÇÃO NÃO PLANEJADA PARA ESTA REGIÃO.

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Embora a Região Tocantins não tenha sido contemplada nos instrumentos de planejamento da Sedop para implementação da *Ação 7556. Apoio à construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública* em 2022, houve execução de obra no município de Acará. Trata-se da *“Revitalização da Praça Matriz”*, obra iniciada em 2021 e que foi concluída no ano de 2022.

Quanto à execução financeira, a dotação inicial que aparece no sistema SigPlan – Monitoramento orçada em R\$ 200.000,00¹ refere-se à obra de emenda parlamentar, a qual, apesar de não ter sido programada pela Sedop, foi inserida pela Seplad no momento da aprovação do orçamento programado para o ano de 2022. Para atendimento da obra supracitada, houve necessidade de atualizar a dotação inicial para R\$ 524.494,09².

Por fim, apesar desta região não ter sido planejada, a conclusão da obra no município de Tomé-Açu possibilitou que o desempenho da *Ação 7556. Apoio à construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública* durante o ano 2022 encerrasse o exercício com o status *Conforme Programado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO XINGU

MUNICÍPIOS DE DEMANDAS ESPONTÂNEAS: SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, URUARÁ.

PRODUTO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	UN	META 2022	AÇÃO NÃO PLANEJADA PARA ESTA REGIÃO.
---------	----------------	---------	----	-----------	--------------------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Embora a Região Xingu não tenha sido contemplada nos instrumentos de planejamento da Sedop para implementação da *Ação 7556. Apoio à construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública* em 2022, houve execução de obras nos municípios de Senador José Porfírio e Uruará.

Estes municípios, apesar de não terem sido programados nos instrumentos de planejamento da Sedop para o ano de 2022, foram atendidos por esta ação governamental com recursos oriundos de Demandas Governamentais ou Emendas Parlamentares, para a execução das mais variadas obras.

No município de Senador José Porfírio, foi celebrado Convênio de Cooperação Técnica entre a Prefeitura Municipal e a Sedop no valor de R\$ 1.095.270,04, cujo objeto refere-se a “Construção da Câmara Municipal”. Cabe à Sedop garantir a transferência do recurso e às prefeituras, a consecução do objeto pactuado no convênio. A obra foi iniciada no segundo semestre e encontra-se com a evolução em conformidade com o cronograma físico e financeiro, com conclusão prevista para 2023.

Já no município de Uruará, das duas obras executadas durante o ano de 2022, “*Construção de Praça Pública*” e “*Construção da Feira do Produtor Rural*”, as duas foram concluídas no primeiro semestre de 2022.

Quanto à execução financeira, como nesta região não estava previsto o desenvolvimento da ação, não houve orçamento programado para o exercício de 2022. No entanto, para o atendimento da demanda governamental a dotação, que até então não existia, precisou ser atualizada em R\$ 2.193.819,08¹, valor necessário para o desenvolvimento das obras.

Por fim, apesar desta região não ter sido planejada, o desempenho da *Ação 7556. Apoio à Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública*, durante o ano 2022, encerrou o exercício com o status *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

2.3.4.3. FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO ARAGUAIA					
MUNICÍPIO PLANEJADO: ÁGUA AZUL DO NORTE					
PRODUTO	MUNICÍPIO ATENDIDO	UNIDADE	UN	META 2022	1 MUNICÍPIO ATENDIDO

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Na Região Araguaia, foi programado o atendimento de um único município, para o desenvolvimento da *Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal*, que foi o município de Água Azul do Norte, com a execução da obra “*Construção de uma Estação Rodoviária de Médio Porte*”, a qual, no entanto, não foi executada.

Além deste, há outros municípios que, apesar de não terem sido programados nos instrumentos de planejamento da Sedop para o ano de 2022, foram atendidos por esta ação governamental na Região Araguaia. Estes municípios foram beneficiados com recursos oriundos de Demandas Governamentais ou Emendas Parlamentares para a execução das mais variadas obras.

No município de Rio Maria, a Sedop possui uma obra em execução para Iluminação em Led da Avenida Rio Maria, executada através de convênio com o Município no ano de 2022. Foi realizado um repasse para o mesmo e de acordo com o relatório de acompanhamento realizado pelo fiscal em 31/05/2022 foi possível aferir o percentual físico executado de 25% de avanço.

Ainda se tratando de convênios, o município de Bannach foi contemplado para a realização da obra de “*Reforma do Hospital Municipal*” (Convênio 166/2022). Ainda neste município, houve repasse através de um convênio firmado em 2022 para uma ação de “*Iluminação da Sede Do Município*”. O município de Sapucaia, por sua vez, foi contemplado com a obra “*Execução de Iluminação Pública na BR-155*” (Convênio 144/2022). O município de Xingura também foi contemplado com a obra de “*Revitalização da Feira Municipal*” (Convênio 23/2022). Da mesma forma, o município de Cumaru do Norte foi igualmente atendido através de convênio para a “*Reforma do Hospital Municipal João Vieira da Cunha*”. O município de Santana do Araguaia também foi atendido através de convênio (Convênio 137/2022), para a execução da obra “*Construção do Terminal Rodoviário*”.

Para melhor entendimento, as principais informações referentes a estas obras encontram-se consolidadas na tabela abaixo:

Nº	MUNICÍPIO	Nº CONVÊNIO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR GLOBAL
1	BANNACH	166/2022	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL.	R\$ 92.231,92
	BANNACH	017/2022	ILUMINAÇÃO DA SEDE DO MUNICÍPIO (CONCLUÍDA).	R\$ 207.334,18
2	CUMARU DO NORTE	147/2022	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO VIEIRA DA CUNHA.	R\$ 831.619,96
3	RIO MARIA	30/2022	ILUMINAÇÃO EM LED DA AVENIDA RIO MARIA.	R\$ 543.615,40
4	SANTANA DO ARAGUAIA	137/2022	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO.	R\$ 2.812.759,12
5	SAPUCAIA	144/2022	EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA BR-155.	R\$ 347.635,94
6	XINGUARA	23/2022	REVITALIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL.	R\$ 4.088.180,38
TOTAL				R\$ 8.923.376,90

Nestes municípios, foram celebrados Convênios de Cooperação Técnica com a Sedop, a qual tem como obrigação principal a transferência dos recursos para as Prefeituras Municipais, enquanto que estas são as responsáveis pela consecução do objeto pactuado no convênio. As obras foram iniciadas no segundo semestre e encontram-se com a evolução em conformidade com o cronograma físico e financeiro, com conclusão prevista para 2023.

No que diz respeito à execução financeira, foi programado o valor de R\$ 240.000,00¹ para atender a Região Araguaia. No entanto, houve a necessidade de majorar este valor em cerca de R\$ 5.087.422,51, atualizando a dotação inicial desta ação para 5.327.422,51².

Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal* na Região Araguaia encerra o exercício de 2022 com status de *Conforme o Programado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO BAIXO AMAZONAS

MUNICÍPIO DE DEMANDA ESPONTÂNEA: ALMEIRIM

PRODUTO	MUNICÍPIO ATENDIDO	UNIDADE	UN	META 2022	AÇÃO NÃO PLANEJADA PARA ESTA REGIÃO
---------	--------------------	---------	----	-----------	-------------------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Embora a Região Baixo Amazonas não tenha sido contemplada nos instrumentos de planejamento da Sedop para implementação da *Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal em 2022*, foram celebrados convênios com alguns municípios da região.

Sendo assim, foram celebrados Convênios de Cooperação Técnica entre a Sedop e as Prefeituras de Almeirim, Óbidos, Santarém e Terra Santa.

Para melhor entendimento, as principais informações referentes a esta obra encontram-se consolidadas na tabela abaixo:

Nº	MUNICÍPIO	Nº CONVÊNIO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR GLOBAL
1	ALMEIRIM	213/2022	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TERMINAL DE PASSAGEIROS PARA ESPAÇO GASTRONÔMICO E CENTRO CULTURAL.	R\$ 2.729.586,98
2	ÓBIDOS	139/2022	REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	R\$ 1.412.231,10
3	SANTARÉM	203/2022	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO DISTRITO ARAPIXUNA	R\$ 1.621.267,42
4	SANTARÉM	162/2022	CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO RIP-RAP, CANALETA, DISSIPADORES, CALÇADA, GRAMA E ESCADARIA, NA VILA DE BOIM, NA REGIÃO DO LAGO GRANDE	R\$ 491.732,06
5	TERRA SANTA	79/2022	RECONSTRUÇÃO DE 75 M DA CONTENÇÃO DA ORLA DE TERRA SANTA	R\$ 1.921.614,05
TOTAL				R\$ 8.176.431,61

Nestes municípios, foram celebrados Convênios de Cooperação Técnica com a Sedop, a qual tem como obrigação principal a transferência dos recursos para as Prefeituras Municipais, enquanto que estas são as responsáveis pela consecução do objeto pactuado no convênio. As obras encontram-se com a evolução em conformidade com seus cronogramas físico-financeiros, com conclusão prevista para 2023.

Quanto à execução financeira, como nesta região não estava previsto o desenvolvimento da ação, não houve orçamento programado para o exercício de 2022. No entanto, para o atendimento da ação, a dotação, que até então não existia, precisou ser atualizada para R\$ 2.267.037,31¹.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

É necessário esclarecer que esta divergência *Orçamento Planejado X Orçamento Executado*, deve-se ao atendimento de demandas que não constavam na programação orçamentária referente à execução de obras para o ano de 2022, elaborada pela área técnica.

Diante do exposto e considerando que a meta física estabelecida não foi alcançada, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal* na Região Baixo Amazonas, no decorrer do ano de 2022, encerra o atual exercício com o status *Abaixo do Esperado*.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO CARAJÁS

MUNICÍPIO PLANEJADO: PARAUPEBAS.

PRODUTO	MUNICÍPIO ATENDIDO	UNIDADE	UN	META 2022	1 MUNICÍPIO ATENDIDO
---------	--------------------	---------	----	-----------	----------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Para o desenvolvimento da *Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal* na Região Carajás, foi programado o atendimento de Parauapebas, mas não houve obra executada no mesmo. Por outro lado, houve o atendimento do município de Piçarra, através de convênio (Convênio 157/2022) para a “*Construção de Duas Casas de Farinha*”.

Este município se enquadra na mesma situação de diversos outros municípios do Estado que, apesar de não terem sido programados nos instrumentos de planejamento da Sedop para o ano de 2022, foram atendidos por esta ação governamental com recursos oriundos de Demandas Governamentais ou Emendas Parlamentares.

Para melhor entendimento, as principais informações referentes a esta obra encontram-se consolidadas na tabela abaixo:

Nº	MUNICÍPIO	Nº CONVÊNIO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR GLOBAL
1	PIÇARRA	157/2022	CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) CASAS DE FARINHA	R\$ 828.204,32
TOTAL				R\$ 828.204,32

Neste município, foi celebrado Convênio de Cooperação Técnica com a Sedop, a qual tem como obrigação principal a transferência dos recursos para a Prefeitura Municipal, enquanto que esta é a responsável pela consecução do objeto pactuado no convênio. As obras foram iniciadas no segundo semestre e encontram-se com a evolução em conformidade com o cronograma físico e financeiro, com conclusão prevista para 2023.

No que diz respeito à execução financeira, foi programado o valor de R\$ 80.000,00¹ para atender a Região Carajás. No entanto, houve a necessidade de majorar este valor em cerca de R\$ 188.645,42, atualizando a dotação inicial desta ação para R\$ 268.645,42².

Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal* na Região Carajás encerra o exercício de 2022 com status de *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO GUAJARÁ

MUNICÍPIO PLANEJADO: BELÉM

PRODUTO	MUNICÍPIO ATENDIDO	UNIDADE	UN	META 2022	1 MUNICÍPIO ATENDIDO
---------	--------------------	---------	----	-----------	----------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Na Região Guajará, foi programado apenas o desenvolvimento da Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal no município de Belém. Entretanto, os municípios de Ananindeua e Benevides também receberam obras no âmbito desta ação.

O município de Belém foi beneficiado com 06 (seis) convênios; Benevides foi beneficiado com 02 (dois) convênios e Ananindeua foi beneficiado com 01 (um) convênio desta ação. Entre os convênios celebrados com o município de Belém consta o de n. 30/2018, que refere-se à atividade de "Limpeza de Vias e Logradouros", visando mitigar os efeitos das fortes chuvas que atingem a região metropolitana. Para melhor entendimento, as principais informações referentes a estas obras encontram-se consolidadas na tabela abaixo:

Nº	MUNICÍPIO	Nº CONVÊNIO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR GLOBAL
1	ANANINDEUA	03/2021	LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS.	R\$ 6.601.489,47
2	BELÉM	05/2022	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO E FEIRA DA PEDREIRA, NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA.	R\$ 8.358.868,15
	BELÉM	181/2022	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DA TERRA FIRME.	R\$ 3.273.615,99
	BELÉM	182/2022	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO DA PEDREIRA	R\$ 8.444.325,54
	BELÉM	193/2022	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO DO GUAMÁ.	R\$ 8.244.590,48
	BELÉM	07/2022	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DA FARINHA, NO BAIRRO DO GUAMÁ.	R\$ 5.126.875,16
	BELÉM	02/2022	REFORMA DO MERCADO DE ICOARACI.	R\$ 14.443.735,65
3	BENEVIDES	58/2022	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE BENEVIDES.	R\$ 5.117.014,14
	BENEVIDES	92/2022	REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO NOVO COMPLEXO COMERCIAL DE BENEVIDES.	R\$ 6.227.628,89
TOTAL				R\$ 65.838.143,47

Nestes municípios, foram celebrados Convênios de Cooperação Técnica com a Sedop, a qual tem como obrigação principal a transferência dos recursos para as Prefeituras Municipais, enquanto que estas são as responsáveis pela consecução do objeto pactuado no convênio.

No que diz respeito à execução financeira, o valor de R\$ 150.000,00¹ programado para atender a Região Guajará, foi acrescido de R\$ 38.002.530,29, totalizando o valor de R\$ 38.152.530,29².

É necessário esclarecer que parte desta divergência *Orçamento Planejado X Orçamento Executado*, deve-se à limitação do Teto Orçamentário disponibilizado para a Sedop, o qual é insuficiente para a real necessidade de execução das obras programadas e, parte, ao atendimento de demandas que não constavam na programação orçamentária referente à execução de obras para o ano de 2022, elaborada pela área técnica.

Diante do exposto e considerando que a meta física estabelecida foi alcançada, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal*, encerra o atual exercício de 2022 com o status *Conforme o Programado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO GUAMÁ					
MUNICÍPIOS DE DEMANDAS ESPONTÂNEAS: CASTANHAL, COLARES, CURUÇÁ, IGARAPÉ-AÇU, MAGALHÃES BARATA, SANTA IZABEL DO PARÁ, SÃO MIGUEL DO GUAMÁ E TERRA ALTA					
PRODUTO	MUNICÍPIO ATENDIDO	UNIDADE	UN	META 2022	AÇÃO NÃO PLANEJADA PARA ESTA REGIÃO.

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Embora a Região Guamá não tenha sido contemplada nos instrumentos de planejamento da Sedop para implementação da *Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal* em 2022, foram beneficiados 08 (oito) municípios através de Convênios.

Com o município de Castanhal foi celebrado um convênio para a Reforma e Ampliação do Mercado Central (Convênio 118/2022).

Com o município de Colares foram celebrados 02 (dois) convênios, sendo um para a Reforma e Ampliação da Câmara Municipal (Convênio 31/2022) e outro para a Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Educação (Convênio 54/2022).

Com o município de Curuçá, foi celebrado um convênio para a Reforma e Ampliação da Escola EMEF Professora Áurea Moraes (Convênio 176/2022).

Com o município de Igarapé-Açu também foram celebrados 02 (dois) convênios, sendo um para a Reforma, Ampliação e Reestruturação do Terminal Rodoviário/Espaço para microempreendedores (Convênio 71/2022) e outro para a Reforma e Ampliação da Feira do Pequeno Agricultor Antônio Alves de Lima (Convênio 178/2022).

Com o município de Magalhães Barata foi celebrado um convênio para a Construção de uma Feira Coberta (Convênio 161/2022).

Com o município de Santa Izabel do Pará também houve a celebração de 03 (três) convênios, sendo o primeiro para a Reforma do Mercado Municipal de Americano (Convênio 190/2022), o segundo para a Reforma e Ampliação do Centro de Convivência de Idosos (Convênio 191/2022), e o terceiro para a Reforma e Ampliação do CRAS (Convênio 130/2022).

Com o município de São Miguel do Guamá foi celebrado um convênio para a Construção do Novo Prédio da Câmara Municipal (Convênio 60/2022).

E com o município de Terra Alta foi celebrado um convênio para a Reforma da Escola Municipal Rosilda Viana (Convênio 76/2022).

Para melhor entendimento, as principais informações referentes a estas obras encontram-se consolidadas na tabela abaixo:

Nº	MUNICÍPIO	Nº CONVÊNIO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR GLOBAL
1	CASTANHAL	118/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO CENTRAL	1.395.355,34
2	COLARES	31/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	398.883,95
	COLARES	54/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	440.007,42
3	CURUÇÁ	176/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EMEF PROFESSORA AUREA DE MORAES NA COMUNIDADE DO ARAQUAIM	612.267,49
4	IGARAPÉ-AÇU	178/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO PEQUENO AGRICULTOR - ANTÔNIO ALVES DE LIMA	207.703,38
	IGARAPÉ-AÇU	71/2022	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE IGARAPÉ- AÇU/ ESPAÇO PARA MICRO EMPREENDEDORES	9.300.458,30
5	MAGALHÃES BARATA	161/2022	CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA COBERTA	1.772.000,00
6	SANTA IZABEL DO PARÁ	190/2022	REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE AMERICANO	635.563,13
	SANTA IZABEL DO PARÁ	191/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	1.109.468,33
	SANTA IZABEL DO PARÁ	130/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS, NA VILA DE AMERICANO	501.202,92
7	SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	60/2022	CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.013.771,31
8	TERRA ALTA	76/2022	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ROSILDA VIANA, NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE	361.675,48
TOTAL				18.748.357,05

Nestes municípios, foram celebrados Convênios de Cooperação Técnica com a Sedop, a qual tem como obrigação principal a transferência dos recursos para as Prefeituras Municipais, enquanto que estas são as responsáveis pela consecução do objeto pactuado no convênio. A obra encontra-se com a evolução em conformidade com o cronograma físico e financeiro, com conclusão prevista para 2023.

Quanto à execução financeira, como nesta região não estava previsto o desenvolvimento da ação, não houve orçamento programado para o exercício de 2022. No entanto, para o atendimento da ação, a dotação, que até então não existia, precisou ser atualizada em R\$ 5.830.426,22¹. Diante do exposto e considerando que a meta física estabelecida não foi alcançada, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal* na Região Guamá, no decorrer do ano de 2022, encerra o atual exercício com o status *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO LAGO DE TUCURUÍ

MUNICÍPIOS DE DEMANDAS ESPONTÂNEAS: BREU BRANCO, GOIANÉSIA DO PARÁ, JACUNDÁ, NOVO REPARTIMENTO, TUCURUÍ

PRODUTO	MUNICÍPIO ATENDIDO	UNIDADE	UN	META 2022	AÇÃO NÃO PLANEJADA PARA ESTA REGIÃO
---------	--------------------	---------	----	-----------	-------------------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Na Região Lago Tucuruí, não foi programado o desenvolvimento da *Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal*. Entretanto, vários municípios da região que não foram planejados para atendimento, foram atendidos através de convênios.

O município de Breu Branco foi contemplado para a realização da obra de “*Revitalização do Terminal Rodoviário*” (Convênio 235/2022). O município de Novo Repartimento foi contemplado para a realização da obra de “*Construção do Mercado Municipal*” (Convênio 34/2022). O município de Tucuruí foi contemplado com 02 (dois) convênios, sendo um para a realização da obra de “*Execução dos Serviços de Revitalização e Urbanização do Cais Municipal*”, (Convênio 31/2021), e o outro para a “*Reforma, Ampliação e Revitalização da Feira Municipal*” (Convênio 61/2022). O município de Goianésia do Pará foi contemplado com um convênio para a “*Reforma da Câmara Municipal*” (Convênio 163/2022). O município de Jacundá foi contemplado com a obra de “*Reconstrução do Mercado Municipal*” (Convênio 55/2022).

No segundo semestre de 2022 foi concluído o segundo trecho da obra do cais de Tucuruí, com a revitalização da orla do rio Tocantins. O equipamento público já se tornou uma das principais atrações turísticas da cidade. A área é atrativa para as atividades de lazer, turismo e cultura no município. Esta revitalização da Orla proporciona qualidade de vida para os moradores e conforto e beleza para turistas que visitam a Região Lago de Tucuruí.

O projeto é dividido em três trechos, com um recurso de mais e 25 milhões de Reais. A população já está usufruindo dos benefícios do novo trecho concluído, no qual foram feitas obras de drenagem, pavimentação asfáltica, colocação de guarda-corpo de perfil metálico, bancos de concreto, instalação de iluminação em postes de estrutura metálica e luminárias de LED, além de melhorias no Farol, área de lazer com quiosques, calçadão, estacionamento, acessibilidade e o novo mirante.

Para melhor entendimento, as principais informações referentes a estas obras encontram-se consolidadas na tabela abaixo:

Nº	MUNICÍPIO	Nº CONVÊNIO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR GLOBAL
1	BREU BRANCO	235/2022	REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO.	R\$ 331.193,50
2	GOIANÉSIA DO PARÁ	163/2022	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL.	R\$ 208.420,56
3	JACUNDÁ	55/2022	RECONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL.	R\$ 5.620.922,22
4	NOVO REPARTIMENTO	34/2022	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL.	R\$ 4.999.522,73
5	TUCURUÍ	31/2021	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CAIS MUNICIPAL.	R\$ 25.185.052,56
	TUCURUÍ	61/2022	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL.	R\$ 19.697.850,44
TOTAL				R\$ 56.042.962,01

Nestes municípios, foram celebrados Convênios de Cooperação Técnica com a Sedop, a qual tem como obrigação principal a transferência dos recursos para as Prefeituras Municipais, enquanto que estas são as responsáveis pela consecução do objeto pactuado no convênio.

No que diz respeito à execução financeira, o valor de R\$ 80.000¹ programado para atender a região, foi acrescido de R\$ 19.183.096,74, totalizando o valor de R\$ 19.263.096,74².

É necessário esclarecer que parte desta divergência *Orçamento Planejado X Orçamento Executado*, deve-se à limitação do Teto Orçamentário disponibilizado para a Sedop, o qual é insuficiente para a real necessidade de execução das obras programadas e, parte, ao atendimento de demandas que não constavam na programação orçamentária referente à execução de obras para o ano de 2022, elaborada pela área técnica.

Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal* na Região Lago de Tucuruí, encerra o exercício de 2022 com status de *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO MARAJÓ

MUNICÍPIO PLANEJADO: **SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA**

PRODUTO	MUNICÍPIO ATENDIDO	UNIDADE	UN	META 2022	1 MUNICÍPIO ATENDIDO
---------	--------------------	---------	----	-----------	----------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Na Região Marajó, foi programado o desenvolvimento da *Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal* apenas no município de São Sebastião da Boa Vista. Entretanto, este município não recebeu execução de obras. Por outro lado, vários municípios da região que não foram planejados para atendimento foram atendidos através de contratos e convênios.

O município de Curalinho foi contemplado para a realização da obra de *“Revitalização e Ampliação do Complexo de Abastecimento Municipal”* (Convênio 51/2022). O município de Chaves foi contemplado para a realização da obra de *“Construção de Estivas de Madeira”* (Contrato 66/2022). O município de Breves foi contemplado com 02 (dois) convênios, sendo um para a *“Aquisição de 05 (cinco) caminhões basculantes, 02 (dois) caminhões coletores Compactor e 01 (uma) pá carregadeira”* (Convênio 142/2022), e o outro para a *“Reforma da EMEF Estevão Gomes”* (Convênio 28/2022). O município de Ponta de Pedras foi contemplado com 03 (três) contratos, sendo o primeiro para a *“Construção de Pontes de Concreto Armado em Vias Urbanas”* (Contrato 11/2022); o segundo para a *“Construção de Passarelas de Concreto Armado para Pedestres”* (Contrato 64/2022); e o terceiro para a *“Construção de Passarelas de Madeira”* (Contrato 12/2022). Para melhor entendimento, as principais informações referentes a estas obras encontram-se consolidadas na tabela abaixo:

Nº	MUNICÍPIO	Nº CONVÊNIO/ CONTRATO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR GLOBAL
1	BREVES	CV 142/2022	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAMINHÕES BASCULANTES, 02 (DOIS) CAMINHÕES COLETORES COMPACTOR E 01 (UMA) PÁ CARREGADEIRA (AÇÃO CONCLUÍDA)	R\$ 5.587.600,00
	BREVES	CV 28/2022	REFORMA DA EMEF ESTEVÃO GOMES	R\$ 531.797,30
2	CHAVES	CT 66/2022	CONSTRUÇÃO DE ESTIVAS DE MADEIRA	R\$ 138.746,94
3	CURRALINHO	CV 51/2022	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL	R\$ 3.289.597,52
4	PONTA DE PEDRAS	CT 11/2022	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO EM VIAS URBANAS	R\$ 816.644,12
	PONTA DE PEDRAS	CT 64/2022	CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS DE CONCRETO ARMADO PARA PEDESTRES	R\$ 3.370.743,71
	PONTA DE PEDRAS	CT 12/2022	CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS DE MADEIRA	R\$ 1.668.298,76
TOTAL				15.403.428,35

Nestes municípios, além de Contratos de execução direta, foram celebrados Convênios de Cooperação Técnica com a Sedop, a qual tem como obrigação principal, neste último caso, a transferência dos recursos para as Prefeituras Municipais, enquanto que estas são as responsáveis pela consecução do objeto pactuado no convênio.

No que diz respeito à execução financeira, o valor de R\$ 2.560.000,00¹ programado para atender a região, foi acrescido de R\$ 7.430.437,18, totalizando o valor de R\$ 9.990.437,18².

É necessário esclarecer que parte desta divergência *Orçamento Planejado X Orçamento Executado*, deve-se à limitação do Teto Orçamentário disponibilizado para a Sedop, o qual é insuficiente para a real necessidade de execução das obras programadas e, parte, ao atendimento de demandas que não constavam na programação orçamentária referente à execução de obras para o ano de 2022, elaborada pela área técnica.

Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal* na Região Marajó, encerra o exercício de 2022 com status de *Merece Atenção*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO RIO CAETÉ					
MUNICÍPIOS DE DEMANDAS ESPONTÂNEAS: BRAGANÇA, CAPANEMA, NOVA TIMBOTEUA, QUATIPURU.					
PRODUTO	MUNICÍPIO ATENDIDO	UNIDADE	UN	META 2022	AÇÃO NÃO PLANEJADA PARA ESTA REGIÃO

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Na Região Rio Caeté, não foi programado o desenvolvimento da Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal. Entretanto, vários municípios da região que não foram planejados para atendimento, foram atendidos através de convênios.

Com o município de Bragança foi celebrado um convênio para a “*Reforma do Mercado de Peixe de Caratateua*” (Convênio 129/2022). Com o município Capanema, foi celebrado um convênio para a “*Reforma do Prédio, Instalação da Guarda Municipal e Secretaria Municipal de Trânsito*” (Convênio 41/2022). Ainda com Capanema foi celebrado o convênio para a “*Reforma da Central de Abastecimento*” (Convênio 106/2022). Com o município de Nova Timboteua, foi celebrado um convênio para a “*Construção do Mercado Municipal*” (Convênio 08/2021). E com o município de Quatipuru foi celebrado o convênio para a “*Construção do Trapiche de Boa Vista*” (Convênio 188/2022).

Para melhor entendimento, as principais informações referentes a estas obras encontram-se consolidadas na tabela abaixo:

Nº	MUNICÍPIO	Nº CONVÊNIO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR GLOBAL
1	BRAGANÇA	129/2022	REFORMA DO MERCADO DE PEIXE DE CARATATEUA.	R\$ 369.662,92
2	CAPANEMA	41/2022	REFORMA DO PRÉDIO INSTALAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO.	R\$ 655.050,88
	CAPANEMA	106/2022	REFORMA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO.	R\$ 2.972.257,38
3	NOVA TIMBOTEUA	08/2021	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL.	R\$ 2.026.472,33
4	QUATIPURU	188/2022	CONSTRUÇÃO DO TRAPICHE DE BOA VISTA.	R\$ 378.509,09
TOTAL				R\$ 6.401.952,60

Nestes municípios, foram celebrados Convênios de Cooperação Técnica com a Sedop, a qual tem como obrigação principal a transferência dos recursos para as Prefeituras Municipais, enquanto que estas são as responsáveis pela consecução do objeto pactuado no convênio.

No que diz respeito à execução financeira, a dotação inicial de R\$ 1.500.000,00¹ programado para atender a região, foi acrescida de R\$ 314.286,72, totalizando o valor de R\$ 1.814.286,72².

É necessário esclarecer que, parte desta divergência *Orçamento Planejado X Orçamento Executado*, deve-se à limitação do Teto Orçamentário disponibilizado para a Sedop, o qual é insuficiente para a real necessidade de execução das obras programadas e, parte, ao atendimento de demandas que não constavam na programação orçamentária referente à execução de obras para o ano de 2022, elaborada pela área técnica.

Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal* na Região Rio Caeté, encerra o exercício de 2022 com status de *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO RIO CAPIM

MUNICÍPIO PLANEJADO: ABEL FIGUEIREDO

PRODUTO	MUNICÍPIO ATENDIDO	UNIDADE	UN	META 2022	1 MUNICÍPIO ATENDIDO
---------	--------------------	---------	----	-----------	----------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Na Região Rio Capim, foi programado o desenvolvimento da *Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal* apenas no município de Abel Figueiredo. Porém, além deste, diversos municípios da região que não foram planejados para atendimento foram atendidos através de convênios.

Para o município de Abel Figueiredo houve a contemplação de 02 (dois) convênios, sendo que o primeiro se refere à *“Reforma da Câmara Municipal”* (Convênio 125/2022), e o segundo se refere à *“Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal”* (Convênio 128/2022).

Foi celebrado com o município de Dom Eliseu, um convênio para a *“Construção do Terminal Rodoviário”* (Convênio 94/2022). Com o município de Rondon do Pará, foi celebrado um convênio para a *“Reforma e Ampliação da Câmara de Vereadores”* (Convênio 123/2022). Com o município de Bujaru (Convênio 01/2022), o mesmo refere-se à *“Iluminação Pública em Led”*. Com o município de Mãe do Rio foi celebrado um convênio para a *“Construção de 03 (três) pontes no município”* (Convênio 52/2022). Com o município de Ulianópolis foi celebrado o convênio para a *“Construção do Centro Especializado de Reabilitação”* (Convênio 216/2022)

Para melhor entendimento, as principais informações referentes a estas obras encontram-se consolidadas na tabela abaixo:

Nº	MUNICÍPIO	Nº CONVÊNIO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR GLOBAL
1	ABEL FIGUEIREDO	125/2022	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL.	R\$ 311.899,45
	ABEL FIGUEIREDO	128/2022	REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	R\$ 353.408,85
2	BUJARU	01/2022	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED.	R\$ 979.143,64
3	DOM ELISEU	94/2022	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO.	R\$ 6.374.858,48
4	MÃE DO RIO	52/2022	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES.	R\$ 1.174.173,14
5	RONDON DO PARÁ	123/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES.	R\$ 786.281,36
6	ULIANÓPOLIS	216/2022	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO.	R\$ 2.320.294,51
TOTAL				R\$ 12.300.059,43

Nestes municípios, foram celebrados Convênios de Cooperação Técnica com a Sedop, a qual tem como obrigação principal, neste último caso, a transferência dos recursos para as Prefeituras Municipais, enquanto que estas são as responsáveis pela consecução do objeto pactuado no convênio.

No que diz respeito à execução financeira, o valor de R\$ 400.000,00¹ programado para atender a região, foi acrescido de R\$ 3.430.089,49, totalizando o valor de R\$ 3.830.089,49².

É necessário esclarecer que parte desta divergência *Orçamento Planejado X Orçamento Executado*, deve-se à limitação do Teto Orçamentário disponibilizado para a Sedop, o qual é insuficiente para a real necessidade de execução das obras programadas e, parte, ao atendimento de demandas que não constavam na programação orçamentária referente à execução de obras para o ano de 2022, elaborada pela área técnica.

Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal* na Região Rio Capim, encerra o exercício de 2022 com status de *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO TOCANTINS

MUNICÍPIO DE DEMANDA ESPONTÂNEA: ABAETETUBA

PRODUTO	MUNICÍPIO ATENDIDO	UNIDADE	UN	META 2022	AÇÃO NÃO PLANEJADA PARA ESTA REGIÃO
---------	--------------------	---------	----	-----------	-------------------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Embora a Região Tocantins não tenha sido contemplada nos instrumentos de planejamento da Sedop para implementação da *Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal* em 2022, o município de Abaetetuba foi beneficiado.

Sendo assim, foi celebrado um Convênio de Cooperação Técnica entre a Prefeitura Municipal e a Sedop (Convênio 90/2022), cujo objeto refere-se à “*Reforma da Feira e Revitalização da Área Comercial Popular*”.

Para melhor entendimento, as principais informações referentes a esta obra encontram-se consolidadas na tabela abaixo:

Nº	MUNICÍPIO	Nº CONVÊNIO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR GLOBAL
1	ABAETETUBA	90/2022	REFORMA DA FEIRA E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR.	R\$ 11.015.932,58
2	IGARAPÉ-MIRI	15/2022	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO RODOVIÁRIO	R\$ 2.632.650,06
TOTAL				R\$ 13.648.582,64

Neste município, foi celebrado Convênio de Cooperação Técnica com a Sedop, a qual tem como obrigação principal a transferência dos recursos para a Prefeitura Municipal, enquanto que esta é a responsável pela consecução do objeto pactuado no convênio. A obra encontra-se com a evolução em conformidade com o cronograma físico e financeiro, com conclusão prevista para 2023.

No que diz respeito à execução financeira, do valor de R\$ 1.600.000,00¹ programado para atender a região, houve, até o momento, desembolso de R\$ 1.136.624,53² para atender o município supracitado, o que representa um percentual de 71%.

Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal* na Região Tocantins, encerra o exercício de 2022 com status de *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO XINGU					
MUNICÍPIOS DE DEMANDAS ESPONTÂNEAS: ANAPU, MEDICILÂNCIA, PLACAS					
PRODUTO	MUNICÍPIO ATENDIDO	UNIDADE	UN	META 2022	AÇÃO NÃO PLANEJADA PARA ESTA REGIÃO

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Embora a Região Xingu não tenha sido contemplada nos instrumentos de planejamento da Sedop para implementação da *Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal em 2022*, os municípios de Anapu, Medicilândia e Placas foram beneficiados.

Para o município de Anapu, houve a contemplação de um convênio para a *“Obra de Conclusão da Sede da Associação dos Agentes Comunitários de Saúde”* (Convênio 160/2022). Com o município de Medicilândia foi celebrado um convênio para a obra de *“Construção do Mercado Municipal”* (Convênio 70/2022). Com o município de Placas foi celebrado um convênio para a obra de *“Construção da Casa dos Conselhos”* (Convênio 112/2022).

Para melhor entendimento, as principais informações referentes a estas obras encontram-se consolidadas na tabela abaixo:

Nº	MUNICÍPIO	Nº CONVÊNIO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR GLOBAL
1	ANAPU	160/2022	OBRA DE CONCLUSÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	R\$ 120.518,89
2	MEDICILÂNCIA	70/2022	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL.	R\$ 1.956.559,66
3	PLACAS	112/2022	CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS.	R\$ 267.440,71
TOTAL				R\$ 2.344.519,26

Nestes municípios, foram celebrados Convênios de Cooperação Técnica com a Sedop, a qual tem como obrigação principal a transferência dos recursos para a Prefeitura Municipal, enquanto que esta é a responsável pela consecução do objeto pactuado no convênio. A obra encontra-se com a evolução em conformidade com o cronograma físico e financeiro, com conclusão prevista para 2023.

Quanto à execução financeira, como nesta região não estava previsto o desenvolvimento da ação, não houve orçamento programado para o exercício de 2022. No entanto, para o

atendimento da ação, a dotação, que até então não existia, precisou ser atualizada em R\$ 594.360,96¹.

É necessário esclarecer que parte desta divergência *Orçamento Planejado X Orçamento Executado*, deve-se ao atendimento de demandas que não constavam na programação orçamentária referente à execução de obras para o ano de 2022, elaborada pela área técnica.

Finalizando, considerando as informações apresentadas, o desempenho físico e financeiro da *Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal na Região Xingu*, encerra o exercício de 2022 com status de *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

2.3.4.4. CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO BAIXO AMAZONAS					
MUNICÍPIO PLANEJADO: SANTARÉM					
PRODUTO	AGENTE CAPACITADO	UNIDADE	UN	META 2022	2 AGENTES CAPACITADOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Reconhecendo a importância de capacitação dos servidores lotados nos núcleos regionais da Sedop, a *Ação 8887. Capacitação de Agentes Públicos* visa oportunizar o acesso ao aperfeiçoamento e, por conseguinte, maior eficiência no desenvolvimento das ações institucionais.

Tendo como meta a capacitação de 02 agentes públicos lotados na Região Baixo Amazonas, em 2022, não houve o desenvolvimento desta ação considerando a redução orçamentária e financeira para esta demanda.

Entretanto, ressaltamos o compromisso em reverter este cenário, uma vez que a atual gestão reconhece a relevância de promover ações de capacitação para que os servidores possam atender com qualidade os diferentes setores da sociedade.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO CARAJÁS

MUNICÍPIO PLANEJADO: MARABÁ

PRODUTO	AGENTE CAPACITADO	UNIDADE	UN	META 2022	3 AGENTES CAPACITADOS
----------------	--------------------------	----------------	-----------	------------------	------------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Reconhecendo a importância de capacitação dos servidores lotados nos núcleos regionais da Sedop, a *Ação 8887. Capacitação de Agentes Públicos* visa oportunizar o acesso ao aperfeiçoamento e, por conseguinte, maior eficiência no desenvolvimento das ações institucionais.

Tendo como meta a capacitação de 03 agentes públicos lotados na Região Carajás, em 2022, não houve o desenvolvimento desta ação considerando a redução orçamentária e financeira para esta demanda.

Entretanto, ressaltamos o compromisso em reverter este cenário, uma vez que a atual gestão reconhece a relevância de promover ações de capacitação para que os servidores possam atender com qualidade os diferentes setores da sociedade.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO GUAJARÁ					
MUNICÍPIO PLANEJADO: BELÉM					
PRODUTO	AGENTE CAPACITADO	UNIDADE	UN	META 2022	62 AGENTES CAPACITADOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Em 2022, a SEDOP realizou Palestras referentes à prevenção de saúde e qualidade de vida dos servidores, como por exemplo prevenção ao câncer de mama e próstata, e contamos com a presença de, aproximadamente, 150 servidores.

Foram capacitados aproximadamente 100 (cem) servidores, com evidência para 01 (uma) conclusão em Pós Graduação Latu Sensu em Gestão Pública e Governança. Desta forma, tivemos uma representação de 161,30% dentro da ação de Capacitação de Agentes Públicos, relacionado ao que foi programado. Portanto, alcançamos a meta física estabelecida para a referida ação.

Em relação ao desempenho financeiro, para o ano de 2022, foi programado R\$ 1.500,00¹ para o desenvolvimento da *Ação 8887. Capacitação de Agentes Públicos* na Região Guajará, entretanto, houve necessidade de majorar a dotação inicial em cerca de R\$2.800,00, passando o valor atualizado para R\$ 4.310,00². Ressalta-se que a maioria das capacitações foi a custo zero devido parcerias firmadas com outros órgãos e instituições.

Diante do exposto, sabemos que a capacitação visa oportunizar o acesso ao aperfeiçoamento e, conseqüentemente, maior eficiência no desenvolvimento das ações institucionais e à sociedade, por isso, ressaltamos o compromisso dessa manutenção em investimentos nas capacitações dos servidores para melhoria dos resultados dos serviços públicos.

Finalizando, o desenvolvimento da *Ação 8887. Capacitação de Agentes Públicos* na Região Guajará encerra o exercício de 2022 com status *Conforme Programado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

2.3.4.5. EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO GUAJARÁ					
MUNICÍPIO PLANEJADO: BELÉM.					
PRODUTO	ATO PUBLICADO	UNIDADE	UN	META 2022	1.100 ATOS PUBLICADOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Na ação Edição e Publicação de atos Administrativos, esta secretaria editou e publicou, aproximadamente, 2.266 atos no Diário Oficial do Estado, com média/mês de, aproximadamente, 188 atos, gerando um custo, até o momento, de R\$ 151.050,86¹, conforme limites orçamentários e financeiros programados, respeitando ao Princípio da Publicidade na Administração Pública, assim como a transparência à sociedade.

Em relação ao desempenho financeiro, para o ano de 2022, foi programado R\$ 96.000,00² para o desenvolvimento da *Ação 8233. Edição e Publicação de Atos da Administração Pública* na Região Guajará, entretanto, houve necessidade de majorar a dotação inicial em cerca de R\$55.050,86, passando o valor atualizado para R\$ 151.050,86³. Ressaltamos que o reajuste no valor da centimetragem por matéria passou para R\$ 7,00 em março de 2022, gerando impacto financeiro consideravelmente.

Por fim, a Sedop informa que o desempenho físico e financeiro da *Ação 8233. Edição e Publicação de Atos da Administração Pública* na Região Guajará, encerra do exercício de 2022 com status *Conforme o Programado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

³ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

2.3.4.6. GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO GUAJARÁ					
MUNICÍPIO PLANEJADO: BELÉM					
PRODUTO	SERVIÇO REALIZADO	UNIDADE	UN	META 2022	1 SERVIÇO REALIZADO
DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022					
<p>A ação Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação tem em sua essência a função principal de prover a Sedop infraestrutura computacional de alta disponibilidade e soluções de tecnologia de informação e comunicação para a implementação e a gestão dos programas finalísticos.</p> <p>No que diz respeito a meta física, no ano de 2022, a manutenção do contrato de transmissão de dados com a Prodepa possibilitou a obtenção da meta física estabelecida de <i>01 Serviço Realizado</i>.</p> <p>Com relação à execução financeira, do valor programado de R\$ 700.000,00¹, foram utilizados R\$ 244.647,92², correspondendo a 35% do orçamento programado.</p> <p>Por fim, ressaltamos que o desempenho físico e financeiro da Ação 8238. Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação na Região Guajará durante o ano de 2022, encerra o exercício <i>Conforme o Programado</i>.</p>					

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

2.3.5. PROGRAMA MANUTENÇÃO DA GESTÃO

2.3.5.1. ABASTECIMENTO DE UNIDADES MÓVEIS

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO BAIXO AMAZONAS					
MUNICÍPIO PLANEJADO: SANTARÉM.					
PRODUTO	UNIDADE ABASTECIDA	UNIDADE	UN	META 2022	02 UNIDADES ABASTECIDAS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Com objetivo de reduzir os gastos das unidades de abastecimentos móveis e, ao mesmo tempo, atender com qualidade, conforto e segurança os servidores, a SEDOP desenvolve a *Ação 4668. Abastecimento de Unidades Móveis*. A execução eficiente desta ação contribui diretamente para o alcance do objetivo estabelecido pelo Governo do Estado que é de *Viabilizar a Gestão Administrativa do Estado*.

Quanto ao desempenho desta ação durante o ano de 2022 na Região do Baixo Amazonas, a SEDOP apresenta as seguintes considerações:

- Com relação à meta física: Foi planejado atender o Município de Santarém com a meta física de 02 (duas) Unidades Abastecidas. Meta esta que foi devidamente cumprida pela SEDOP no ano de 2022.
- Com relação à meta financeira: Para o ano de 2022, foi planejado atender esta ação com o valor de R\$ 126.500,00 para atender a região. No entanto, faz-se necessário esclarecer que os Sistemas de Gestão de Orçamento do Estado não estão parametrizados por Região de Integração, motivando que a execução financeira dessa ação se concentre na Região do Guajará, apesar da SEDOP possuir em sua estrutura organizacional 06 Núcleos Regionais. Em função disso, a execução financeira desta região não aparece no SigPlan.

Feitas as considerações acima, por mais que esta ação não tenha tido execução financeira durante o ano de 2022 na Região do Baixo Amazonas, a obtenção da meta física estabelecida, confere a ação o status de *Conforme Programado*.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO CARAJÁS

MUNICÍPIO PLANEJADO: MARABÁ.

PRODUTO	UNIDADE ABASTECIDA	UNIDADE	UN	META 2022	01 UNIDADE ABASTECIDA
---------	--------------------	---------	----	-----------	-----------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Com objetivo de reduzir os gastos das unidades de abastecimento móveis, atender com qualidade, conforto e segurança os servidores, a SEDOP desenvolve a *Ação 4668. Abastecimento de Unidades Móveis*. A execução eficiente desta ação contribui diretamente para o alcance do objetivo estabelecido pelo Governo do Estado que é de *Viabilizar a Gestão Administrativa do Estado*.

Quanto ao desempenho desta ação durante o ano de 2022 na Região do Carajás, a SEDOP apresenta as seguintes considerações:

- Com relação a meta física: Foi planejado atender o Município de Marabá com a meta física de 01 Unidade Abastecida. Meta esta que foi devidamente cumprida pela SEDOP no ano de 2022.
- Com relação a meta financeira: Para o ano de 2022, foi planejado atender esta ação com o valor de R\$ 126.500,00, para atender a região. No entanto, faz-se necessário esclarecer que os Sistemas de Gestão de Orçamento do Estado não estão parametrizados por Região de Integração, motivando que a execução financeira dessa ação se concentre na Região do Guajará, apesar da SEDOP possuir em sua estrutura organizacional 06 Núcleos Regionais. Em função disso, a execução financeira desta região não aparece no SigPlan.

Feitas as considerações acima, por mais que esta ação não tenha tido execução financeira durante o ano de 2022 na Região do Carajás, a obtenção da meta física estabelecida, confere a ação o status de *Conforme Programado*

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO GUAJARÁ

MUNICÍPIO PLANEJADO: BELÉM.

PRODUTO	UNIDADE ABASTECIDA	UNIDADE	UN	META 2022	13 UNIDADES ABASTECIDAS
---------	--------------------	---------	----	-----------	-------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Com objetivo de reduzir os gastos das unidades de abastecimento móveis, atender com qualidade, conforto e segurança os servidores, a SEDOP desenvolve a ação 4668. *Abastecimento de Unidades Móveis*. A execução eficiente desta ação contribui diretamente para o alcance do objetivo estabelecido pelo Governo do Estado que é de *Viabilizar a Gestão Administrativa do Estado*.

Quanto ao desempenho desta ação durante o ano de 2022 na Região do Guajará, a SEDOP apresenta as seguintes considerações:

- Com relação a meta física: Foi planejado atender o Município de Belém com a meta física de 13 Unidades Abastecidas, quantitativo estabelecido no contrato da SEDOP para manutenção da frota, no entanto 15 veículos atendem as necessidades da SEDOP na Região do Guajará.
- Com relação a meta financeira: Para o ano de 2022, foi planejado atender esta ação com o valor de R\$ 495.017,00. Entretanto, por mais que na execução financeira da Região do Guajará esteja concentrada a execução financeira das Regiões do Baixo Amazonas e do Carajás, foram utilizados até 31/12/2022, o valor de R\$ 329.752,03, representando uma economia de R\$ 165.264,97. Sendo assim, a utilização dos recursos representou um percentual de 66% da dotação inicial prevista.

Feitas as considerações acima, a SEDOP informa que, no decorrer do ano de 2022 o desenvolvimento da Ação 4668. *Abastecimento de Unidades Móveis* na Região do Guajará, teve o desempenho físico excedendo 02(duas) unidades abastecidas, porém financeiro Conforme Programado.

2.3.5.2. CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO BAIXO AMAZONAS					
MUNICÍPIO PLANEJADO: SANTARÉM.					
PRODUTO	SERVIDOR BENEFICIADO	UNIDADE	UN	META 2022	02 SERVIDORES BENEFICIADOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Pertencente ao Programa Manutenção da Gestão, cujo objetivo é *Viabilizar a Gestão Administrativa do Estado*, a Ação 8311. *Concessão de Auxílio Alimentação*, propicia ao servidor público estadual receber este benefício para subsidiar suas despesas com refeição durante sua jornada de trabalho.

Quanto ao desempenho físico, em 2022 esta Ação Governamental contemplou em média 02 servidores/mês no Núcleo Regional de Santarém, garantindo desta forma o cumprimento da meta estabelecida para a Região Baixo Amazonas.

No que diz respeito ao desempenho financeiro, para o ano de 2022 foi programado o orçamento de R\$ 16.000,00¹ para atender a Região Baixo Amazonas. Entretanto, faz-se necessário esclarecer que o Sistema de Gestão Integrada de Recursos Humanos – SIGIRH não está parametrizado por Regiões de Integração, não sendo possível desta forma, realizar movimentações financeiras fora da Região de Integração do Guajará. Por este motivo, não houve movimentação financeira na Região Baixo Amazonas durante o ano de 2022.

Sendo assim, por mais que esta ação não tenha tido execução financeira durante o ano de 2022 na Região Baixo Amazonas, a obtenção da meta física estabelecida, confere a ação o status de *Conforme Programado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO CARAJÁS

MUNICÍPIO PLANEJADO: MARABÁ.

PRODUTO	SERVIDOR BENEFICIADO	UNIDADE	UN	META 2022	03 SERVIDORES BENEFICIADOS
---------	----------------------	---------	----	-----------	----------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Pertencente ao Programa Manutenção da Gestão, cujo objetivo é *Viabilizar a Gestão Administrativa do Estado, a Ação 8311. Concessão de Auxílio Alimentação*, propicia ao servidor público estadual receber este benefício para subsidiar suas despesas com refeição durante sua jornada de trabalho.

Quanto ao desempenho físico, em 2022 esta Ação Governamental contemplou em média 03 servidores/mês no Núcleo Regional de Marabá, garantindo desta forma o cumprimento da meta estabelecida para a Região Carajás.

No que diz respeito ao desempenho financeiro, para o ano de 2022 foi programado o orçamento de R\$ 19.211,00¹ para atender a Região Carajás. Entretanto, faz-se necessário esclarecer que o Sistema de Gestão Integrada de Recursos Humanos – SIGIRH não está parametrizado por Regiões de Integração, não sendo possível desta forma, realizar movimentações financeiras fora da Região de Integração do Guajará. Por este motivo, não houve movimentação financeira na Região Carajás durante o ano de 2022.

Sendo assim, por mais que esta ação não tenha tido execução financeira durante o ano de 2022 na Região Carajás, a obtenção da meta física estabelecida, confere a ação o status de *Conforme Programado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO GUAJARÁ

MUNICÍPIO PLANEJADO: BELÉM.

PRODUTO	SERVIDOR BENEFICIADO	UNIDADE	UN	META 2022	224 SERVIDORES BENEFICIADOS
---------	----------------------	---------	----	-----------	-----------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Com o objetivo de viabilizar a gestão administrativa do Estado, especificamente a Gestão de Pessoas desta Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP, a ação referente à *Ação 8311. Concessão de Auxílio Alimentação* contemplou em média 173 servidores/mês no Município de Belém.

A meta física estabelecida para essa região não foi alcançada devido a não realização de Concurso Público previsto para o ano de 2022, o qual ocorrerá no ano de 2023. Desta forma, foi mantido o quantitativo de servidores sem incluir o número de servidores que derivariam do Concurso Público.

Em relação ao desempenho financeiro, foi executado o valor anual de, aproximadamente, R\$ 1.859.323,22¹, equivalente à média mensal de, aproximadamente, R\$ 154.943,60, ultrapassando os parâmetros orçados para esta ação devido aos reajustes ocorridos no mês de abril deste ano.

Finalizando, feitas as devidas considerações, a *Ação 8311. Concessão de Auxílio Alimentação* encerra o exercício de 2022 com o desempenho físico e financeiro com o status de *Merece Atenção*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

2.3.5.3. CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO BAIXO AMAZONAS					
MUNICÍPIO PLANEJADO: SANTARÉM.					
PRODUTO	SERVIDOR BENEFICIADO	UNIDADE	UN	META 2022	02 SERVIDORES BENEFICIADOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Pertencente ao Programa Manutenção da Gestão, cujo objetivo é *Viabilizar a Gestão Administrativa do Estado, a Ação 8312. Concessão de Auxílio Transporte*, propicia ao servidor público estadual receber este benefício para custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual nos deslocamentos realizados pelo servidor de sua residência para o local de trabalho e vice-versa.

Quanto ao desempenho físico, em 2022, o desenvolvimento desta ação governamental na Região Baixo Amazonas estava condicionada a realização do concurso público da Sedop, o qual previa a lotação de servidores efetivos no Núcleo Regional de Santarém ainda no ano de 2022.

Com realização do certame adiada para o ano de 2023, esta ação governamental não teve desempenho físico e nem financeiro na Região Baixo Amazonas, conferindo a mesma o status de *Abaixo do Esperado* para o exercício de 2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO CARAJÁS

MUNICÍPIO PLANEJADO: MARABÁ.

PRODUTO	SERVIDOR BENEFICIADO	UNIDADE	UN	META 2022	03 SERVIDORES BENEFICIADOS
---------	----------------------	---------	----	-----------	----------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Pertencente ao Programa Manutenção da Gestão, cujo objetivo é *Viabilizar a Gestão Administrativa do Estado, a Ação 8312. Concessão de Auxílio Transporte*, propicia ao servidor público estadual receber este benefício para custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual nos deslocamentos realizados pelo servidor de sua residência para o local de trabalho e vice-versa.

Quanto ao desempenho físico, em 2022 esta Ação Governamental contemplou em média 03 servidores/mês no Núcleo Regional de Marabá, garantindo desta forma o cumprimento da meta estabelecida para a Região Carajás.

No que diz respeito ao desempenho financeiro, para o ano de 2021 foi programado o orçamento de R\$ 600,00¹ para atender a Região Carajás. Entretanto, faz-se necessário esclarecer que o Sistema de Gestão Integrada de Recursos Humanos – SIGIRH não está parametrizado por Regiões de Integração, não sendo possível desta forma, realizar movimentações financeiras fora da Região de Integração do Guajará. Por este motivo, não houve movimentação financeira na Região Carajás durante o ano de 2022.

Por fim, por mais que esta ação não tenha tido execução financeira durante o ano de 2022 na Região Carajás, a obtenção da meta física, confere a ação o status de *Abaixo do Esperado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO GUAJARÁ

MUNICÍPIO PLANEJADO: BELÉM.

PRODUTO	SERVIDOR BENEFICIADO	UNIDADE	UN	META 2022	224 SERVIDORES BENEFICIADOS
---------	----------------------	---------	----	-----------	-----------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Pertencente ao Programa Manutenção da Gestão, cujo objetivo é *Viabilizar a Gestão Administrativa do Estado, a Ação 8312. Concessão de Auxílio Transporte*, propicia ao servidor público estadual receber este benefício para custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual nos deslocamentos realizados pelo servidor de sua residência para o local de trabalho e vice-versa.

Quanto à meta física estabelecida, o quantitativo de 224 servidores levava em consideração novas contratações através de Concurso público, o que não foi possível acontecer no exercício de 2022. Sendo assim, a média 147 servidores/mês no município de Belém, garante o cumprimento da meta estabelecida para a Região Guajará.

No que diz respeito ao desempenho financeiro, do orçamento de R\$ 231.753,00¹ programado para atender a Região Guajará, foram utilizados R\$ 240.697,99², ultrapassando em R\$ 8.944,99 o orçamento planejado. É necessário esclarecer que o Sistema de Gestão Integrada de Recursos Humanos – SIGIRH não está parametrizado por Regiões de Integração, não sendo possível desta forma, realizar movimentações financeiras fora da Região de Integração do Guajará. Por este motivo, as movimentações financeiras relacionadas as Regiões de Integração Baixo Amazonas e do Carajás estão concentradas na Região do Guajará.

Finalizando, levando em consideração a justificativa referente a meta física, a Sedop considera que o desempenho físico e financeiro da *Ação 8312. Concessão de Auxílio Transporte* na Região Guajará, encerra o exercício de 2022 com o status *Merece Atenção*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

2.3.5.4. OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO BAIXO AMAZONAS					
MUNICÍPIO PLANEJADO: SANTARÉM.					
PRODUTO	CONTRATO MANTIDO	UNIDADE	UN	META 2022	02 CONTRATOS MANTIDOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Representando a SEDOP na Região do Baixo Amazonas, é mantido o Núcleo Regional no Município de Santarém com o objetivo de coordenar e executar ações setoriais no âmbito de obras públicas e do Desenvolvimento Urbano. A presença do Núcleo Regional da SEDOP no Município de Santarém, tem como finalidade principal garantir maior eficiência e eficácia no desenvolvimento, acompanhamento e avaliação das ações governamentais que estão sob a responsabilidade da SEDOP.

Através da ação Operacionalização das Ações Administrativas, a SEDOP contribui com o Governo do Estado na viabilização da gestão administrativa, com a manutenção de contratos administrativos, os quais tem como função principal, prover os meios administrativos para implementação e a gestão dos programas finalísticos.

Com relação à meta financeira para o ano de 2022, foi planejado atender esta ação com o valor de R\$ 13.500,00¹, no entanto, foi necessário atualizar a dotação inicial para R\$ 17.099,93² de modo a garantir o atendimento de todas as despesas relacionadas ao desenvolvimento desta ação na Região Baixo Amazonas.

Feitas as considerações acima, a *Ação 8338. Operacionalização das Ações Administrativas* na Região Baixo Amazonas, encerra o exercício de 2022 com o desempenho físico e financeiro *Conforme Programado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO CARAJÁS

MUNICÍPIO PLANEJADO: MARABÁ

PRODUTO	CONTRATO MANTIDO	UNIDADE	UN	META 2022	03 CONTRATOS MANTIDOS
---------	------------------	---------	----	-----------	-----------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Representando a SEDOP na Região do Carajás, é mantido o Núcleo Regional no Município de Marabá com o objetivo de coordenar e executar ações setoriais no âmbito de obras públicas e do Desenvolvimento Urbano. A presença do Núcleo Regional da SEDOP no Município de Santarém, tem como finalidade principal garantir maior eficiência e eficácia no desenvolvimento, acompanhamento e avaliação das ações governamentais que estão sob a responsabilidade da SEDOP.

Através da ação Operacionalização das Ações Administrativas, a SEDOP contribui com o Governo do Estado na viabilização da gestão administrativa, com a manutenção de contratos administrativos, os quais tem como função principal, prover os meios administrativos para implementação e a gestão dos programas finalísticos.

Quanto à execução da meta física, no exercício de 2022, os contratos mantidos com as empresas prestadora dos serviços telefonia móvel e locação de veículo, passaram a ser executada no centro de custo da Região do Carajás, perfazendo um total de 3 contratos mantidos.

Com relação à meta financeira para o ano de 2022, do orçamento planejado atender esta ação no valor de R\$ 13.000,00¹, houve execução financeira de cerca de 81%, o que equivale ao valor de R\$ 10.519,94².

Feitas as considerações acima, a *Ação 8338. Operacionalização das Ações Administrativas* na Região Carajás, encerra o exercício de 2022 com o desempenho físico e financeiro *Conforme Programado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO GUAJARÁ

MUNICÍPIO PLANEJADO: BELÉM.

PRODUTO	CONTRATO MANTIDO	UNIDADE	UN	META 2022	19 CONTRATOS MANTIDOS
---------	------------------	---------	----	-----------	-----------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

É através da Ação 8338. Operacionalização das Ações Administrativas, que a SEDOP contribui com o Governo do Estado na viabilização da gestão administrativa, com a manutenção de contratos administrativos, os quais tem como função principal, prover os meios administrativos para implementação e a gestão dos programas finalísticos.

Quanto à execução da meta física, no exercício de 2022, foram mantidos 21 Contratos Administrativos necessários para garantir o pleno funcionamento da Sedop e ultrapassando a meta física estabelecida em 2 contratos administrativos.

Com relação ao desempenho financeiro, foram investidos cerca de R\$ 8.067.679,38¹ no custeio dos contratos administrativos até 31/12/2022. O valor ultrapassa em cerca de R\$ 2.109.354,38 o orçamento programado para o desenvolvimento desta ação, que era de R\$ 5.958.325,00. Neste sentido, faz-se necessário apresentar as seguintes considerações:

- 1) Devido à limitação do teto orçamentário no momento da elaboração do orçamento do ano de 2022;
- 2) Os serviços contratados e a conjuntura econômica de aumentos de preços e salários, assim como o aumento de 02(dois) contratos para atender à necessidade da secretaria, contribuíram para que o desempenho financeiro desta ação excedesse o valor programado.

Finalizando, por mais que a execução financeira desta ação tenha excedido o programado, a *Ação 8338. Operacionalização das Ações Administrativas* na Região Guajará, encerra o exercício de 2022 com o desempenho físico e financeiro *Conforme Programado*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

2.3.5.5. OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE RECURSOS HUMANOS

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO BAIXO AMAZONAS					
MUNICÍPIO PLANEJADO: SANTARÉM.					
PRODUTO	SERVIDOR REMUNERADO	UNIDADE	UN	META 2022	02 SERVIDORES REMUNERADOS

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Pertencente ao Programa Manutenção da Gestão, cujo objetivo é *Viabilizar a Gestão Administrativa do Estado*, a *Ação 8339. Operacionalização das Ações de Recursos Humanos* tem como objetivo desenvolver ações voltadas à gestão de recursos humanos.

No que diz respeito à execução da meta física, no exercício de 2022, permanece o quantitativo de 2 servidores lotados no Núcleo de Santarém, cumprindo desta forma em 100% a meta física estabelecida para a Região Baixo Amazonas.

Quanto à execução financeira, informamos que o Sistema de Gestão Integrada de Recursos Humanos – SIGIRH não está parametrizado por Regiões de Integração e a referida ação concentra-se na Região do Guajará, por isso, a execução financeira referente à remuneração dos servidores é efetivada na Região de Integração Guajará, sendo este o motivo de não haver movimentação financeira na região do Baixo Amazonas durante o ano de 2022. Ressaltamos que a regularização desta situação está além da governabilidade da Sedop.

Feitas as considerações acima, o desenvolvimento da *Ação 8339. Operacionalização das Ações de Recursos Humanos* na Região Baixo Amazonas, encerra o exercício de 2022 com o desempenho físico *Conforme Programado*.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO CARAJÁS

MUNICÍPIO PLANEJADO: MARABÁ.

PRODUTO	SERVIDOR REMUNERADO	UNIDADE	UN	META 2022	03 SERVIDORES REMUNERADOS
---------	------------------------	---------	----	-----------	------------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Pertencente ao Programa Manutenção da Gestão, cujo objetivo é *Viabilizar a Gestão Administrativa do Estado, a Ação 8339. Operacionalização das Ações de Recursos Humanos* tem como objetivo desenvolver ações voltadas à gestão de recursos humanos.

No que diz respeito a execução da meta física, no exercício de 2021, permanece o quantitativo de 3 servidores lotados no Núcleo de Marabá, cumprindo desta forma em 100% a meta física estabelecida para a Região Carajás.

Quanto à execução financeira, informamos que o Sistema de Gestão Integrada de Recursos Humanos – SIGIRH não está parametrizado por Regiões de Integração e a referida ação concentra-se na Região Guajará, por isso, a execução financeira referente à remuneração dos servidores é efetivada na Região de Integração Guajará, sendo este o motivo de não haver movimentação financeira na Região Carajás durante o ano de 2022. Ressaltamos que a regularização desta situação está além da governabilidade da Sedop.

Feitas as considerações acima, o desenvolvimento da *Ação 8339. Operacionalização das Ações de Recursos Humanos* na Região Carajás, no ano de 2022, teve o desempenho físico *Conforme Programado*.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO GUAJARÁ

MUNICÍPIO PLANEJADO: BELÉM.

PRODUTO	SERVIDOR REMUNERADO	UNIDADE	UN	META 2022	251 SERVIDORES REMUNERADOS
---------	---------------------	---------	----	-----------	----------------------------

DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Pertencente ao Programa Manutenção da Gestão, cujo objetivo é *Viabilizar a Gestão Administrativa do Estado, a Ação 8339. Operacionalização das Ações de Recursos Humanos* tem como objetivo desenvolver ações voltadas à gestão de recursos humanos. Nessa ação, a Secretaria monitorou o alcance das metas institucionais, indicando possíveis ajustes e garantindo a mais eficiente locação dos recursos financeiros e humanos para alcançar o melhor desempenho da gestão de governança do órgão, em cumprimento à missão institucional.

Quanto à meta física estabelecida, o quantitativo de 251 servidores leva em consideração novas contratações através de Concurso público, o que não foi possível acontecer no exercício de 2022. Sendo assim, a média 188 servidores/mês no município de Belém, garante o cumprimento da meta estabelecida para a Região Guajará.

No que diz respeito ao desempenho financeiro, do orçamento programado de R\$ 11.139.593,00¹ para atender a Região Guajará, foram utilizados cerca de R\$ 11.293.560,65² para o desenvolvimento desta ação. Destacamos que houve reajustes financeiros em decorrência da equiparação salarial dos servidores, pagamentos retroativos referentes à abono de permanência e a liberação de folhas de desligados do ano de 2022, o que impactou no equilíbrio orçamentário e financeiro.

Feitas as considerações acima, o desenvolvimento da *Ação 8339. Operacionalização das Ações de Recursos Humanos* na Região Guajará, encerra o exercício de 2022 com o desempenho físico e financeiro *Merece Atenção*.

¹ FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

² FONTE: SIGPLAN MONITORAMENTO – DEZEMBRO/2022.

CAPÍTULO III

O QUE IREMOS FAZER EM 2023?



3.1. PERSPECTIVAS DE AÇÕES E PROJETOS

Contribuindo com Governo do Estado no compromisso de transformar a vida de todos os paraenses, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Pública – Sedop, apresenta a seguir os principais projetos programados para o ano de 2023. Trata-se da seleção de projetos de infraestrutura urbana com grande impacto no cenário estadual, os quais, além de melhorar a qualidade de vida da população beneficiária pelo empreendimento, contribuem para geração de empregos, aquecendo desta forma a economia local.

Ao todo, são **12 Projetos** distribuídos em **03 municípios** que integram **03 Regiões de Integração** do Estado do Pará. Com investimento em torno de **R\$ 1.499.569.500,60**, estes projetos poderão ser conferidos na tabela abaixo, além do custo estimado para cada projeto.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	INVESTIMENTO ESTIMADO
GUAJARÁ	BELÉM	01	DRENAGEM, URBANIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DOS CANAIS MURUTUCU E MARTIN – TRECHO RIO GUAMÁ ATÉ AVENIDA JOÃO PAULO II	R\$ 296.870.690,60
		02	REQUALIFICAÇÃO DO CANAL LAGO VERDE COM URBANIZAÇÃO E DRENAGEM (TERRA FIRME) 1.276 KM	R\$ 130.508.152,64
		03	REQUALIFICAÇÃO DO CANAL SAPUCAJUBA COM URBANIZAÇÃO E DRENAGEM (TERRA FIRME) 741M – TRECHO AVENIDA PERIMETRAL ATÉ O CANAL TUCUNDUBA	R\$ 104.231.755,85
		04	REQUALIFICAÇÃO DO CANAL DA VILETA COM URBANIZAÇÃO E DRENAGEM (MARCO) 480M – TRECHO CANAL DO TUCUNDUBA ATÉ PASSAGEM SÃO PEDRO	R\$ 67.096.555,39
		05	REQUALIFICAÇÃO DO CANAL UNIÃO COM URBANIZAÇÃO E DRENAGEM (MARCO) 360M – TRECHO TRAVESSA TIMBÓ ATÉ TRAVESSA MAURITI	R\$ 50.638.909,72
		06	REQUALIFICAÇÃO DO CANAL DA TIMBÓ COM URBANIZAÇÃO E DRENAGEM (MARCO) 260M – TRECHO PASSAGEM VALDIR ACATAUASSU E PASSAGEM JOSÉ LEAL MARTINS	R\$ 36.572.545,91
		07	REQUALIFICAÇÃO DO CANAL DA GENTIL BITTENCOURT COM URBANIZAÇÃO E DRENAGEM (SÃO BRÁS) 1.450M – TRECHO RUA DEODORO DE MENDONÇA ATÉ O CANAL DO TUCUNDUBA	R\$ 141.864.138,20
		08	REQUALIFICAÇÃO DO CANAL DA CIPRIANO COM URBANIZAÇÃO E DRENAGEM (CANUDOS) 1.100M – TRECHO AVENIDA PERIMETRAL ATÉ ALAMEDA JOSÉ ALVES	R\$ 114.868.593,79
		09	REQUALIFICAÇÃO DO CANAL DA CARAPARU COM URBANIZAÇÃO E DRENAGEM (GUAMÁ) 980M – TRECHO CANAL DO TUCUNDUBA ATÉ A TRAVESSA LIBERATO DE CASTRO	R\$ 137.850.365,36
		10	REQUALIFICAÇÃO, DRENAGEM, URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO – RODOVIA DO CEASA – TRECHO AVENIDA PERIMENTAL AO PÓRTICO DA ENTRADA DA CEASA – 3,2KM (COM 40M DE PONTE)	R\$ 47.032.478,00
10 PROJETOS GUAJARÁ				R\$ 1.127.534.185,46

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	INVESTIMENTO ESTIMADO
RIO CAETÉ	SALINÓPOLIS	01	CONSTRUÇÃO DE BARRACAS NA ORLA DA PRAIA DO ATALAIA.	R\$ 155.454.435,97
01 PROJETO RIO CAETÉ				R\$ 155.454.435,97

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	INVESTIMENTO ESTIMADO
RIO CAPIM	PARAGOMINAS	01	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL DE PARAGOMINAS (158 LEITOS)	R\$ 216.580.879,17
01 PROJETO RIO CAPIM				R\$ 216.580.879,17

PROJETOS SEDOP 2023 - TABELA SÍNTESE			
REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	QUANTIDADE DE PROJETOS	INVESTIMENTO ESTIMADO
GUAJARÁ	BELÉM	10	R\$ 1.127.534.185,46
RIO CAETÉ	SALINÓPOLIS	01	R\$ 155.454.435,97
RIO CAPIM	PARAGOMINAS	01	R\$ 216.580.879,17
TOTAL GERAL		12	R\$ 1.499.569.500,60

CAPÍTULO IV

MENSAGEM DE GOVERNO 2023



A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Obras Públicas (SEDOP) tem como missão propor e implementar a política de organização territorial urbana e regional, bem como gerenciar a execução de programas e projetos decorrentes da Política Estadual de Desenvolvimento Urbano, além de planejar e executar obras e serviços de interesse do Estado.

Em 2022, a Secretaria pautou seu trabalho nas metas estabelecidas no Plano Plurianual (PPA) 2020-2023, as quais estão fundamentadas nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU), tendo em vista, o compromisso assumido pela atual gestão de alinhar o PPA com os ODS.

A atual gestão do Estado estabeleceu os conceitos de Compromissos Regionais e Projetos Prioritários na elaboração dos instrumentos estaduais de planejamento, a fim de balizar o trabalho das secretarias. Para a Sedop, foram definidos oito Compromissos Regionais/Projetos Prioritários, que são:

1. Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba, com investimento de 250 milhões;
2. Estádio Olímpico do Mangueirão, com investimento de 244 milhões;
3. Conclusão da Arena de Santarém com o Sistema de Refrigeração e Segurança, com investimento de 17 milhões;
4. Centro de Convenções de Santarém, com investimento de 74 milhões;
5. Hospital Materno-Infantil de Santarém, com investimento de 25 milhões;
6. Estádio Colosso do Tapajós em Santarém, com investimento na ordem de 103 milhões;
7. Urbanização da Orla da Avenida Beira Mar – Praia do Maçarico em Salinópolis, com investimento de 45 milhões;
8. Reurbanização da Orla do Atalaia em Salinópolis, com investimento de 98 milhões.

Todos os Projetos Prioritários tiveram avanços expressivos, destacando-se, entre estes, o Projeto Tucunduba, o qual concluiu o 3º trecho, compreendido entre a Rua 2 de Junho e a Travessa Vileta. Outros projetos que merecem destaque por estarem com percentual de conclusão acima de 90% são a reforma do Mangueirão e a urbanização da Orla do Maçarico.

Vale ressaltar que a Sedop não atua apenas nas grandes obras, mas atende também as 12 Regiões de Integração, alcançando os 144 municípios, executando obras de infraestrutura, tais como pavimentação - especialmente através do Programa “Asfalto por Todo o Pará” – e obras de saneamento, como abastecimento de água e redes de esgoto. Atua, ainda, na construção de equipamentos urbanos diversos, tais como orlas, praças, quadras poliesportivas, terminais rodoviários, feiras e mercados, entre outras.

Além de executar as obras que estão sob sua responsabilidade orçamentária, a Secretaria também atua na execução de obras de outras Secretarias do Estado, contribuindo, assim para o alcance dos objetivos do Estado. Desta forma, além de melhorar a qualidade de vida da população, beneficiada pelas obras, a atuação da Sedop fortalece a economia estadual, tendo em vista o grande volume de empregos diretos e indiretos gerados pelo ramo de construção civil, considerado um setor econômico estratégico para alavancar o desenvolvimento econômico e dar suporte ao desenvolvimento social.

No âmbito do Saneamento Básico, sempre atenta ao marco regulatório do saneamento, a Sedop atua na elaboração e revisão dos Planos de Saneamento, e no desenvolvimento de ações que contribuem com o objetivo do governo do Estado de “Promover e Disponibilizar aos Usuários o Acesso a Serviço Público de Saneamento Básico”.

Além das ações de infraestrutura e de saneamento, a Sedop também atua na construção de unidades habitacionais. Em 2022, foi iniciada a construção de 400 unidades habitacionais na área do antigo Curtume Santo Antônio, em Belém, que irão beneficiar cerca de 2.000 pessoas.

No que se refere à Mobilidade Urbana, a Secretaria presta o apoio técnico-institucional aos municípios interessados em elaborar ou revisar seus Planos de Mobilidade. Esta atividade é desenvolvida através da ação de Apoio Técnico–institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano, a qual apoia também a elaboração e revisão de Planos Diretores e outros instrumentos de planejamento urbano.

A Sedop obteve um grande avanço em suas obras e ações por todo o Estado, em alguns casos superando as metas previstas, como no caso do Programa ‘Asfalto Por Todo o Pará’. No entanto, enfrentou dificuldades para alcançar os resultados esperados em algumas obras e ações, em função, tanto do contexto de pandemia de Covid-19, quanto da interdependência entre a Secretaria e as demais instituições envolvidas no cumprimento das metas. Para superar,

parcialmente, estes obstáculos a Secretaria se empenhou em celebrar parcerias com os demais entes federativos a nível federal e municipal, bem como junto às instituições financiadoras e demais atores sociais envolvidos.

Além de todos estes avanços alcançados em 2022, para 2023, estão previstas cerca de 10 (dez) grandes obras ligadas à Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba, o que vai demandar do Estado um investimento estimado em 1 Bilhão de Reais (R\$1.127.534.185,00). Além do Projeto Tucunduba, a SEDOP continuará sua missão de construir obras em todas as Regiões de Integração. Na Região Rio Caeté, por exemplo, visando o apoio às políticas de incremento ao turismo, desenvolvidas pelo Estado, a Sedop dará continuidade às ações de Reurbanização da Orla do Atalaia, no município de Salinópolis, com um investimento previsto da ordem de 150 milhões de Reais (R\$155.454.436,00).

Na Região do Rio Capim, em Paragominas, está prevista a obra de ampliação e reforma do Hospital Regional, ampliando a capacidade de atendimento para 158 leitos, com investimento previsto de R\$ 216 milhões de reais (R\$216.580.880,00). Assim, a Secretaria pretende manter, em 2023, um ritmo acelerado de execução de obras e ações de desenvolvimento urbano que possam contribuir para o alcance das metas do PPA 2020/2023 e dos ODS, contribuindo para gerar um impacto positivo da atual gestão na qualidade de vida da população.
